


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación de la elaboración del diseño (expediente técnico) y construcción con estudios básicos de ingeniería con metodología fast track de la obra, equipamiento y mobiliario del proyecto: Mejoramiento del servicio de educación superior tecnológica en iest victor andres belaunde distrito de santiago de chuco de la provincia de santiago de chuco del departamento de la libertad, con CUI 2667663

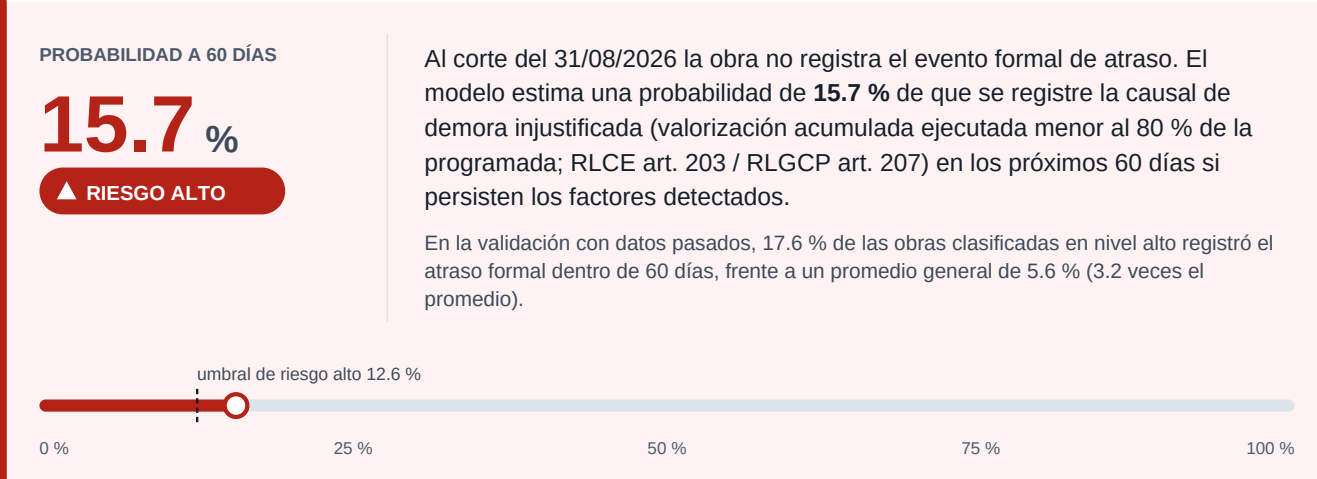

MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	337 desde 08/01/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA CON METODOLOGÍA FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN IEST VICTOR ANDRES BELAUNDE DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CON CUI 2667663
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central
Contratista	CONSORCIO EJECUTOR NORTE
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	SANTIAGO DE CHUCO / SANTIAGO DE CHUCO / LA LIBERTAD
Código Único de Inversión (CUI)	2667663
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN IEST VICTOR ANDRES BELAUNDE DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Función	EDUCACIÓN
Identificador del contrato (SEACE)	2336037
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 40,218,009.04


Cuaderno de obra digital

337 asientos entre 08/01/2026 y 31/08/2026

02

Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

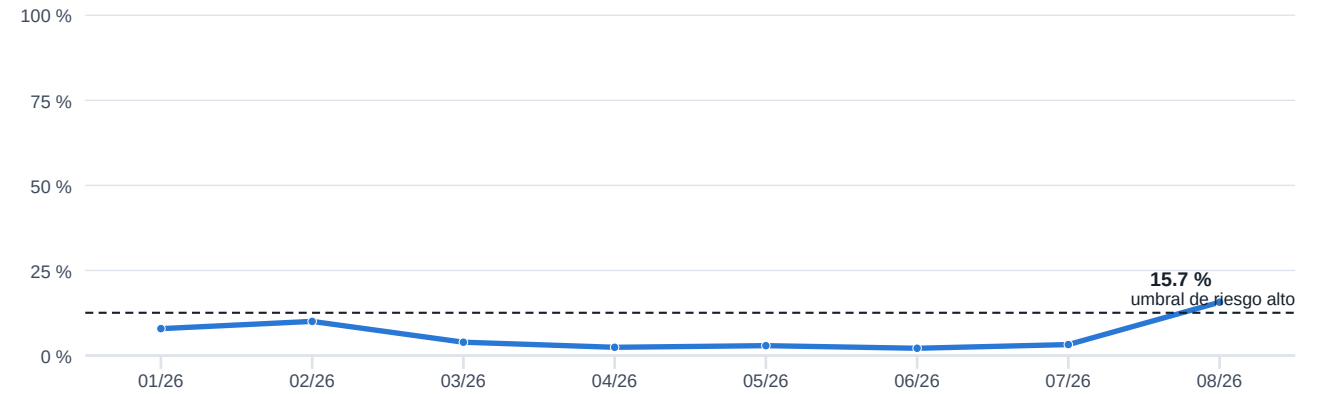

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (8 cortes, del 31/01/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03

Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
El 10 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.284
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.47 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.210
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.175
El 58 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.168
El 8 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.152
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.127
Hubo registros en el cuaderno 24 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.123
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.64 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.115

04

Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	15.7 %	15.7 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 331 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 26/08/2026

precision sobre la suspension del plazo de ejecucion por causal imputable a la entidad derivada del incumplimiento de pago de valorizaciones y afectacion a los cronogramas contractuales (pag 3 de 3) . 3)se deja constancia adicionalmente que los terminos de referencia establecen que la contratacion corre...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 329 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 26/08/2026

precision sobre la suspension del plazo de ejecucion por causal imputable a la entidad derivada del incumplimiento de pago de valorizaciones y afectacion a los cronogramas contractuales (pag 1 de 3) . se deja constancia que la suspension del plazo de ejecucion contractual vigente no constituye un acuerdo...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 330 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 26/08/2026

precision sobre la suspension del plazo de ejecucion por causal imputable a la entidad derivada del incumplimiento de pago de valorizaciones y afectacion a los cronogramas contractuales (pag 2 de 3) . en relacion con la obligacion de pago, se deja constancia que la falta de atencion de valorizaciones con...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 329 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 26/08/2026

...30225, ley de contrataciones del estado, y su reglamento, establece expresamente la obligacion de la entidad de efectuar los pagos derivados de la ejecucion contractual, reconociendo ademas que, ante retrasos imputables a la entidad, corresponde el reconocimiento de los intereses legales efectivos conforme al articulo 39 de la ley y las disposiciones del codigo civil aplicables.asimismo, conforme al reg...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 328 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

...n de sus calendarios actualizados, ya que segun los metrados ejecutados de la valorizacion no 11 seria del 1% comparado con su acumulado programado al 15 de agosto del 9.67 % se determino que cayo en atraso de 8.67% ,ejecutado programado 10.34% por lo tanto es menor al 80% del monto de la valorizacion acumulada. por lo tanto ante esta falta de atencion se tomara las acciones pertinentes.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 324 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 21/08/2026

ocurrencias . del jefe de supervisionse comunica que el dia de hoy por la manana se verifico la falta de actividades en obra por parte del contratista. la supervision verifica la falta de personal tecnico y obrero.,por la tarde se estuvo presente en la reunion presencial con la entidad en la cual se habia notificado a la supervision,en dicha reunion estuvimos presentes representantes del contr...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 323 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/08/2026

ocurrencias . del jefe de supervisionel dia de hoy se verifica la falta de actividades en obra por parte del contrastista. la supervision verifica la falta de personal tecnico y obrero.,asimismo se hizo un recorrido por la parte exterior ya que en las instalaciones donde se encuentra el area de trabajo estaba cerrado. se informa que mientras no haya una notificacio...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 322 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/08/2026

respuesta a residente respecto carta notarial ingresado a entidad . en atencion a lo anotado por el residente de obra, mediante lo cual se deja constancia de la carta n. 133-2026/cva-grll, de fecha 18.08.2026, mediante la cual el contratista ha ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 314 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/08/2026**

OCURRENCIAS: DEL JEFE DE SUPERVISIONEl día de hoy estoy en obra verificando el avance de las actividades Se cuenta con la presencia del Ing.Residente y Personal tecnico de la supervision asi como del contratista. Se continua con los trabajos de limpieza, los trabajadores cuentan con sus EPPS e implementos de seguridad, Ademas se continua con el replanteo en el area delimitada muro 2,segun planos del Expediente Técnico...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 314 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/08/2026**

...ualizados alcanzados a la supervision, ya que segun los metrados ejecutados de esta valorizacion seria del 1% comparado con su acumulado programado al 15 de agosto del 9.67 % se determina que cayo en atraso de 8.67% ,ejecutado programado 10.34% por lo tanto siendo menor al 80% del monto de la valorizacion acumulada en la presente fecha.se solicita al contratista alcanzar un nuevo calendario acelerado d...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 312 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 15/08/2026**

...muro 2,segun planos del expediente tecnico. se solicita al contratista poner mas frentes de trabajo con mas cuadrillas en diferentes puntos ya que las partidas ejecutadas son minimas pudiendo caer en atraso y verificando que para la presente valorizacion quincenal que corresponde a esta quincena no han tenido mayor avance tal como se visualizo en el recorrido junto con el ing.residente al verificar los...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
