


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación de la ejecucion de obra: Ampliacion del servicio de movilidad urbana en las vias locales del A.H. Vista azul y la junta vecinal villa costa verde en el promuvi vii, distrito de ilo - provincia de ilo - departamento de moquegua

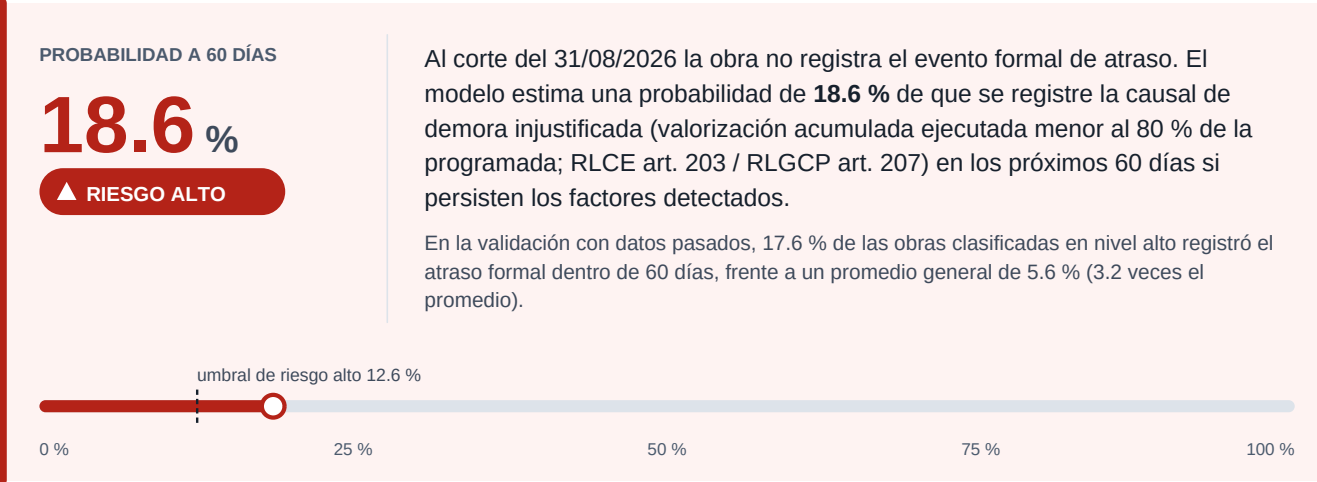


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	188 desde 23/03/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA: AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL A.H. VISTA AZUL Y LA JUNTA VECINAL VILLA COSTA VERDE EN EL PROMUVI VII, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
Contratista	CONSORCIO VILLA 5
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	ILO / ILO / MOQUEGUA
Código Único de Inversión (CUI)	2587914
Inversión asociada	AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL A.H. VISTA AZUL Y JUNTA VECINAL VILLA COSTA VERDE DEL PROMUVI VII, DISTRITO DE ILO DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2382219
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 7,613,370.98
Cuaderno de obra digital	188 asientos entre 23/03/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

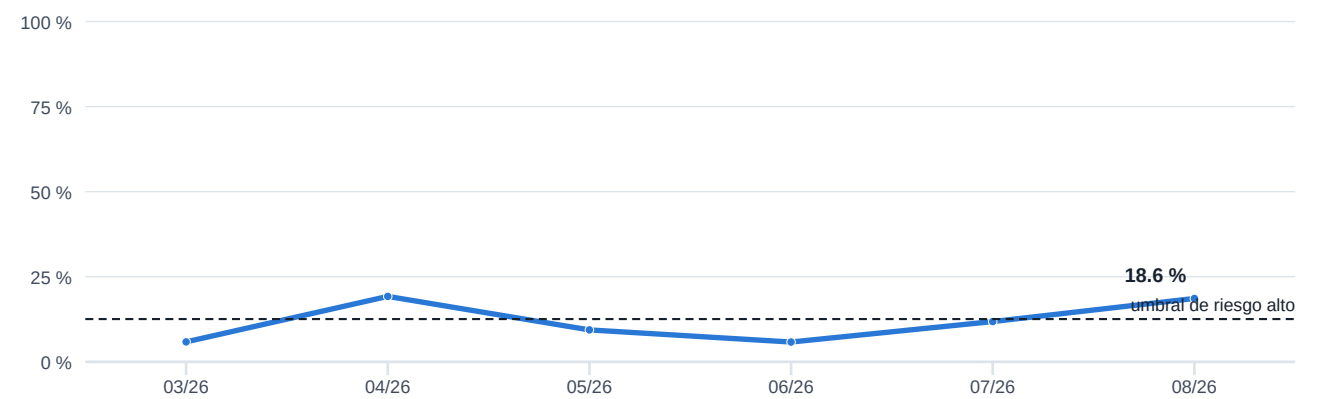

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (6 cortes, del 31/03/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.56 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.557
El 7 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.194
10 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.117
Departamento: Moquegua	Características de la obra		+0.113
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.110
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.106
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.62 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.086
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.082

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	18.6 %	18.6 %	+0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	18.6 %	18.6 %	+0.0 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	18.6 %	18.6 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 184 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 27/08/2026

...ica que los replanteos y ajustes de niveles deben de ser aprobados por la supervison de obra, segun las especificaciones tecnicas del proyecto, a fin de poder buscar el exito del proyecto sin generar atrasos en obra que afecten la ruta critica del proyecto, por causas no atribuibles a mi representada. 3)adicional de obra n03:3.1) se solicita la autorizacion para le ejecucion de las partidas que forman ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 182 · Adicionales · SOEC_RESI · 27/08/2026

...ica al inspector de obra en referencia a la gestion de adicionales que:1) a la actualidad continuamos en espera del pronunciamiento de la carta n112-2026-cv5/rc, presentada a la eps ilo s.a. causando atrasos en la culminacion de la elaboracion de la prestacion adicional de obra y deductivo vinculante n03 consolidada, por lo que las causas de atraso en la presentacion de dicha documentacion no son atrib...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 181 · Programa de ejecución de obra - CPM · SOEC_INSP · 26/08/2026

...consulta n 11, asi como el deductivo vinculado al retiro de jardineras de concreto derivado de la consulta n 12, ello a fin de permitir su evaluacion oportuna por la inspeccion y la entidad, evitando retrasos en la aprobacion de las prestaciones necesarias para la continuidad de la obra, la liberacion de frentes intervenidos, la proteccion de la ruta critica y el cumplimiento de la finalidad publica del...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 175 · Adicionales · SOEC_INSP · 24/08/2026

...te al levantamiento de observaciones del expediente adicional, no constituyendo ampliacion de plazo contractual ni autorizacion para ejecutar partidas no aprobadas por la entidad, asimismo, cualquier demora adicional no justificada podria afectar el tramite de aprobacion de las prestaciones adicionales necesarias para la continuidad de la obra, el plan de trabajo aprobado, la ruta critica y la finalidad...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 166 · Calendario de avance de obra valorizado · SOEC_INSP · 19/08/2026

CONTROL DE OBRA: En atención al Asiento N°165 de la Residencia de Obra, mediante el cual informa la ejecución de actividades correspondientes al expediente contractual, Adicional de Obra N° 01 y Adicional de Obra N° 02. Se indica a la Residencia que la ejecución de partidas correspondientes a los adicionales aprobados deberá realizarse conforme a los expedientes técnicos aprobados, metrados, especificaciones técnicas,...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 160 · Órdenes · SOEC_INSP · 14/08/2026

INDICACIONES PREVENTIVAS POR CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y PROTECCIÓN DE FRENTES INTERVENIDOS: En atención al Asiento 158 registrado por la Residencia de Obra, mediante el cual informa la ejecución de actividades durante la jornada, entre ellas el vaciado de concreto f'c=175 kg/cm² en veredas y uñas de veredas en la Calle 95, la conformación de subrasante y mejoramiento en veredas y bermas de la Calle 101, así como el...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 161 · Órdenes · SOEC_INSP · 14/08/2026

INDICACIONES PREVENTIVAS POR CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y PROTECCIÓN DE FRENTES INTERVENIDOS: La Residencia deberá implementar el drenaje superficial provisional que resulte necesario, mantener la señalización preventiva, controlar el tránsito peatonal y vehicular, proteger los accesos a viviendas y evitar la exposición del personal a condiciones inseguras. En caso se adviertan zonas saturadas o inestables, no deberá...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 147 · Participación del personal clave · SOEC_RESI · 05/08/2026

cambio de personal clave - residente de obra . se comunica al inspector de obra que mediante la carta n362-2026-dga-mpi, se recibo la comunicacion por parte de la entidad publica(mpi), donde se aprueba el cambio del p...

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 145 · Órdenes · SOEC_INSP · 03/08/2026**

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - CONTINUIDAD Y APLICACIÓN Estricta: Asimismo, se dispone que los reportes ambientales diarios sean incorporados al expediente de obra y puestos a disposición de esta Inspección para su verificación, debidamente suscritos por el Especialista Ambiental y el Residente de Obra, según corresponda. Se deja constancia que la continuidad de los trabajos deberá desarrollarse garantizando la prevención...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 144 · Órdenes · SOEC_INSP · 03/08/2026**

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - CONTINUIDAD Y APLICACIÓN Estricta: En atención a las actividades ejecutadas a la fecha en los diferentes frentes de trabajo de la obra, esta Inspección recomienda a la Residencia de Obra continuar con la implementación permanente del PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, de acuerdo con las actividades programadas y ejecutadas, manteniendo el cumplimiento estricto de las medidas ambientales previstas en...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 118 · Órdenes · SOEC_INSP · 09/07/2026**

RESPUESTA A CONSULTA N.º 12: 4. Verificación de la existencia o ausencia de sistema de drenaje, impermeabilización o barrera de protección en la jardinera. 5. Análisis de la continuidad del geotextil en la zona de interferencia con la cimentación o estructura de la jardinera. 6. Evaluación de la afectación al confinamiento lateral del pavimento y bermas. 7. Evaluación de las presiones generadas por el relleno húmedo y c...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 111 · Órdenes · SOEC_INSP · 06/07/2026**

REITERACIÓN DE INFORME TÉCNICO PARA ATENCIÓN DE CONSULTA N.º 11: En atención al Asiento N.º 105 que registra el residente de obra, se deja constancia que mediante Asiento N.º 101 de fecha 04.07.2026 se requirió a la Residencia la presentación del Informe Técnico sustentatorio correspondiente a la consulta sobre insuficiente cobertura de redes existentes de agua potable y alcantarillado. Dicho informe resulta necesario p...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
