


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación para la ejecución de la obra: Mejoramiento del servicio operativo o misional institucional en la sub gerencia de gestión de riesgos de desastres de la municipalidad provincial de arequipa. Urbanización santiago felipe salaverry del distrito de miraflores ¿ provincia de arequipa ¿ departamento de arequipa. CUI: 2564437

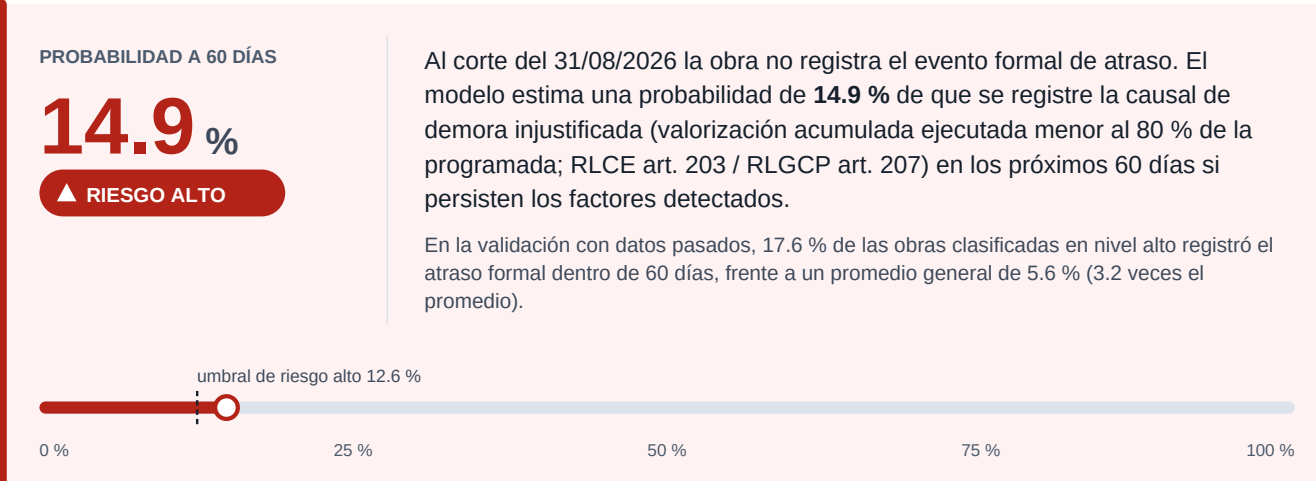

MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 13,285,640.43	300 días	279 desde 18/12/2025	28/08/2026


01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OPERATIVO O MISIONAL INSTITUCIONAL EN LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA. URBANIZACIÓN SANTIAGO FELIPE SALAVERRY DEL DISTRITO DE MIRAFLORES ¿ PROVINCIA DE AREQUIPA ¿ DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. CUI: 2564437
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
Contratista	Y&T CONSORCIADOS
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	MIRAFLORES / AREQUIPA / AREQUIPA
Código Único de Inversión (CUI)	2564437
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OPERATIVO O MISIONAL INSTITUCIONAL EN LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGOS DE DESASTRES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA. URBANIZACION SANTIAGO FELIPE SALAVERRY DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Función	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Identificador del contrato (SEACE)	2361485
Monto del contrato	S/ 13,285,640.43

Monto aprobado de la inversión	S/ 4,856,247.18
Cuaderno de obra digital	279 asientos entre 18/12/2025 y 28/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

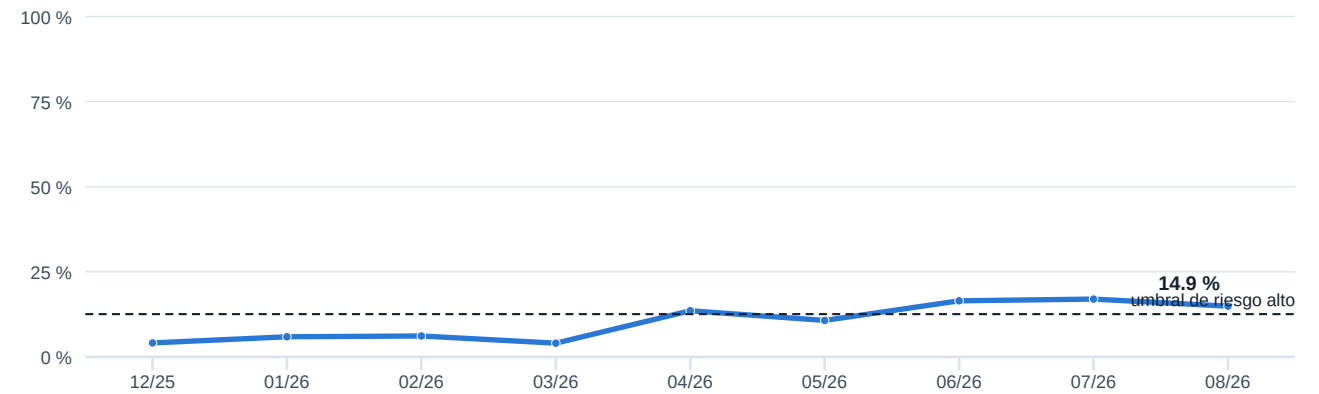

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (9 cortes, del 31/12/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.63 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.689
El 7 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.194
Departamento: Arequipa	Características de la obra		+0.163
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 2,016,061	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.154
Faltan 44 días para el fin del plazo original	Datos del contrato		+0.152
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.144
El 56 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.102
Registros del último mes: 0.60 veces el promedio mensual del trimestre	Actividad del cuaderno de obra		-0.102

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	14.9 %	14.9 %	-0.0 pp
Absolver todas las consultas pendientes	14.9 %	14.9 %	+0.0 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	14.9 %	14.9 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 264 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 05/08/2026

...lorización de obra correspondiente al mes de julio. al respecto, se ha verificado que el avance acumulado ejecutado se encuentra por debajo del 80 % del avance acumulado programado, evidenciándose un retraso en la ejecución de la obra respecto al cronograma contractual vigente. - en ese sentido, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 207.1, del artículo 207 del reglamento ley de contrataciones p...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 255 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 22/07/2026

....2026. se evidencia una demora de (01 día calendario) para la presentación de los cronogramas actualizados y calendarios. así mismo, se indica que la omisión o presentación extemporánea constituye un incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista, el cual impide el adecuado control y seguimiento de la programación de la obra por parte de la supervisión.

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 255 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 22/07/2026

...a que el contratista remite a esta consultoría de supervisión la carta n 307-2026-mcm/spb con asunto: remision de actualizacion de programa de ejecucion de obra con fecha 21.07.2026. se evidencia una demora de (01 día calendario) para la presentación de los cronogramas actualizados y calendarios. así mismo, se indica que la omisión o presentación extemporánea constituye un incumplimiento de las obligaci...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 255 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 22/07/2026

DEL ASPECTO ADMINISTRATIVO:: 1.SE DEJA CONSTANCIA QUE, CON FECHA 13.07.2026 ESTA SUPERVISIÓN DE OBRA REMITIÓ A LA RESIDENCIA DE OBRA LA CARTA N° 138-2026-SUP-OEPC Y CARTA N°139-2026-SUP-OEPC, SE DEBE PRECISAR QUE, A TRANSCURRIDO UN PLAZO DE (08 DIAS CALENDARIOS) DE LA PRESENTACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE APROBACIONES DE AMPLIACIONES PLAZO N°01 Y 02, Y QUE EN LA FECHA CORRESPONDIENTE NO SE REALIZO LA PRESENTACIÓN DE LA...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 240 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 13/07/2026

...(normalizados). se deja constancia que con fecha 01.07/2026 el ejecutor debio de dar fin a la causal de afectacion por la aprobacion de las bombas normalizadas propuestas. así mismo, se indica que la demora en la instalacion del sistema contraincendios posterior a la presente aprobacion sera imputable a la empresa contratista.

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 236 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 12/07/2026

OCURRENCIAS DE OBRA: 1. CON FECHA 08.07.2026 SE REMITIÓ A LA ENTIDAD LA CARTA N°128-2026-SUP-OEPC CON ASUNTO: INFORMACIÓN DE PARALIZACIÓN DE OBRA POR CAUSALES NO ATRIBUIBLES, EN ATENCIÓN A LOS ASIENTO DE OBRA N°223,224 Y 225.2. CON FECHA 08.07.2026 SE REMITIÓ A LA ENTIDAD LA CARTA N°129-2026-SUP-OEPC CON ASUNTO: PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTA TÉCNICA DE OBRA N°19 DE PROYECTISTA, REMITIDO POR LA ENTI...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 239 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 12/07/2026

DEL ASPECTO ADMINISTRATIVO:AHORA BIEN, DE LO PRECISADO ANTERIORMENTE, SE DEBE SEÑALAR QUE ESTA SUPERVISIÓN DE OBRA EVIDENCIO QUE, LA SOLICITUD SE EFECTUÓ PRODUCTO DE QUE SU APROBACIÓN Y CORRESPONDIENTE CUANTIFICACIÓN IMPLICARÍAN UNA AFECTACIÓN AL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. ES EN ESE SENTIDO QUE, ESTA SUPERVISIÓN DE OBRA EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCONES SEGÚN EL ARTICULO 187 DEL REGLAMENTO DE LA LG...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 224 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 06/07/2026

...me a la circular difundida para tal efecto oficio circular, no se vienen desarrollando labores de construccion en obra, situacion que imposibilita la ejecucion de las actividades programadas y genera retrasos no atribuibles a la contratista.en tal sentido, se deja constancia del inicio de causal de ampliacion de plazo, conforme a lo establecido en el articulo 200 del reglamento de la ley general de cont...

Fuente: cod-asientos202607.csv

INFOBRAS · -

Días para el fin programado original: 44

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
