


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado para el grupo de gestion empresarial innovadores veladora putaca - distrito de vinchos - provincia huamanga - region ayacuch

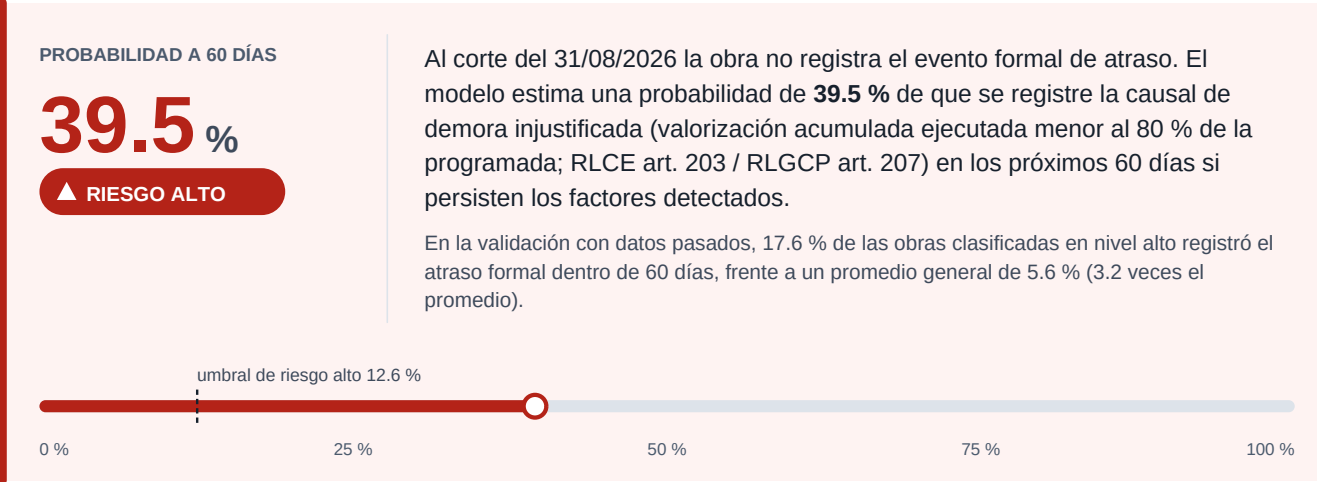


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	234 desde 23/04/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL INNOVADORES VELADORA PUTACA - DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA HUAMANGA - REGION AYACUCH
Entidad contratante	PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
Contratista	CONSORCIO YURAMAYO
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	VINCHOS / HUAMANGA / AYACUCHO
Código Único de Inversión (CUI)	2406452
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO, CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTIÓN EMPRESARIAL INNOVADORES VELADORA PUTACCA, DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Función	AGROPECUARIA
Identificador del contrato (SEACE)	2377017
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 2,399,618.57
Cuaderno de obra digital	234 asientos entre 23/04/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

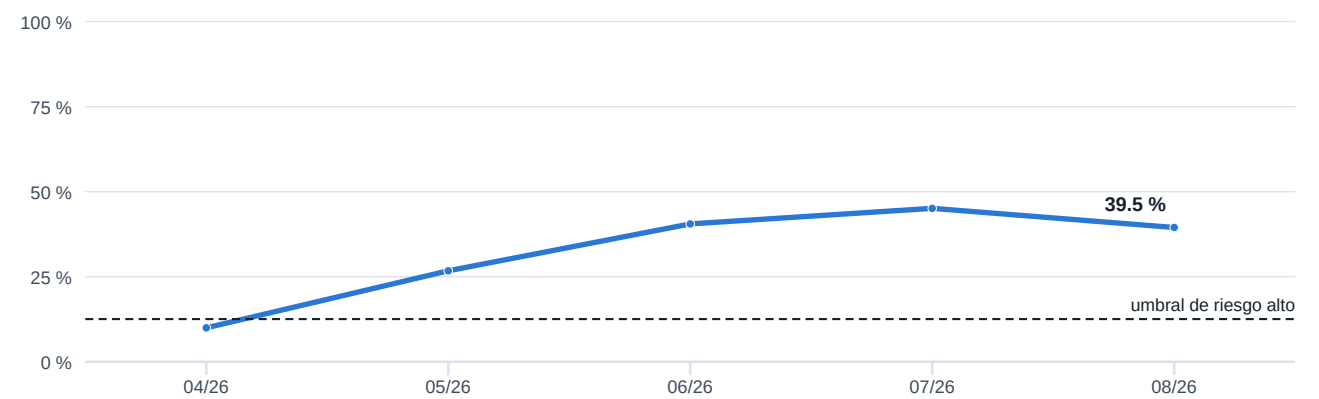

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (5 cortes, del 30/04/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.65 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.766
El 19 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.290
El 12 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.273
El 59 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.172
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.135
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.60 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.122
13 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.119
Según el último avance declarado en el cuaderno, se ejecutó el 117 % de lo programado	Avance declarado en el cuaderno		-0.093

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	39.5 %	37.7 %	-1.7 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	39.5 %	39.1 %	-0.4 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	39.5 %	39.5 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 224 · Participación del personal clave · SOEC_SPV · 25/08/2026

...tista debera disponer oportunamente sus recursos humanos, equipos y materiales necesarios para garantizar su ejecucion dentro de los plazos establecidos y de acuerdo con las ee.tt. cualquier retraso, incumplimiento o falta de ejecucion de las pruebas hidraulicas que no se encuentre debidamente sustentado por una causa no atribuible al contratista sera de su responsabilidad, dejandose expresa constancia p...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 224 · Participación del personal clave · SOEC_SPV · 25/08/2026

...el contratista debera disponer oportunamente sus recursos humanos, equipos y materiales necesarios para garantizar su ejecucion dentro de los plazos establecidos y de acuerdo con las ee.tt. cualquier retraso, incumplimiento o falta de ejecucion de las pruebas hidraulicas que no se encuentre debidamente sustentado por una causa no atribuible al contratista sera de su responsabilidad, dejandose expresa co...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 225 · Órdenes · SOEC_SPV · 25/08/2026

...tando el orden y las fechas de presentacion de la documentacion, el requerimiento de presentacion del sustento tecnico fue efectuado oportunamente mediante los asientos antes senalados, por lo que la demora incurrida por el contratista en la presentacion del informe requerido le resulta atribuible, en consecuencia, el tiempo adicional que resulte necesario para complementar la informacion, ejecutar los ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 212 · Valorizaciones y metrados · SOEC_SPV · 19/08/2026

...ificado de pago de la valorizacion de obra n 08, mediante las cartas n 065 y n 066-2026/go-so/icc. no obstante, del analisis de la programacion se advierte que la partida pruebas hidraulicas presenta atraso respecto de lo previsto en el programa de ejecucion de obra, debido a que el adelanto se encuentra sustentado en el mayor avance de otras partidas, en consecuencia, se requiere al contratista adopta...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 203 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 14/08/2026

...cesidad de solicitar ampliacion de plazo por mayores metrados n 01, dando como inicio del evento a la fecha de hoy 14 de agosto del 2026, hasta culminar con la ejecucion de la partida y esta a su vez retrasa la ejecucion de partidas consecutivas como refine y nivelacion de terreno normal (06.03.02.05) , cama de apoyo con material zarandeado (06.03.02.06) y relleno con material propio (06.03.02.07), toda...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 193 · Programa de ejecución de obra - CPM · SOEC_SPV · 12/08/2026

APROBACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA (PEO) Y DEL CAO V ACTUALIZADOS: En la fecha, se deja constancia que, mediante CARTA N° 063-2026/GO-SO/ICC e INFORME TÉCNICO N° 039-2026/GO-SO/ICC, la Supervisión de Obra comunicó al Contratista la aprobación de la actualización del Programa de Ejecución de Obra (PEO) y del Calendario de Avance de Obra Valorizado (CAOV), presentada mediante Carta N° 53-2026-CP...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 180 · Ampliaciones de plazo · SOEC_SPV · 04/08/2026

...nico, toda vez que no demuestra el impacto real sobre el plazo contractual.en consecuencia, esta supervision de obra ratifica la improcedencia de la solicitud de ampliacion de plazo, por persistir el incumplimiento de los requisitos tecnicos, formales y procedimentales establecidos en los articulos 197 y 198, disponiendo que el contratista se abstenga de efectuar estimaciones teoricas de ampliacion de pl...

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 179 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 04/08/2026**

...tecnico de la supervision, concluyendo que la solicitud no acredita tecnica ni normativamente la existencia de una deficiencia del expediente tecnico.asimismo, se verifica que el contratista continua incumpliendo la ejecucion de las pruebas hidraulicas del sistema, pese a los requerimientos efectuados por esta supervision mediante los asientos n 111 y n 153, habiendose reiterado por tercera vez consecuti...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 173 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 03/08/2026**

...sta que el contratista cumpla con levantar integralmente las observaciones contenidas en el informe tecnico n 030-2026/go-so/icc. asimismo, se deja constancia de que cualquier demora derivada de dicho incumplimiento sera de exclusiva responsabilidad del contratista y no constituirá causal de ampliacion de plazo.

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 120 · Participación del personal clave · SOEC_SPV · 08/07/2026**

REQUERIMIENTO DE PLANOS DE REPLANTEO DEL SECTOR 05 PARA EL CONTROL DE PARTIDAS Y EVALUACIÓN DE METRADOS DE EXCAVACIÓN: Mediante el presente asiento, se requiere y conmina al Contratista a presentar a la brevedad el Plano de Replanteo del Sector 05, documento técnico indispensable para verificar la geometría de las secciones de las zanjas, determinar con precisión la existencia de mayores o menores metrados en las par...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
