


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación para la ejecución de la obra ¿mejoramiento del servicio de educacion primaria en i.e N° 54603 de centro poblado de padre rumi distrito de ranracancha de la provincia de chincheros del departamento de apurimac¿ con CUI N° 2576084

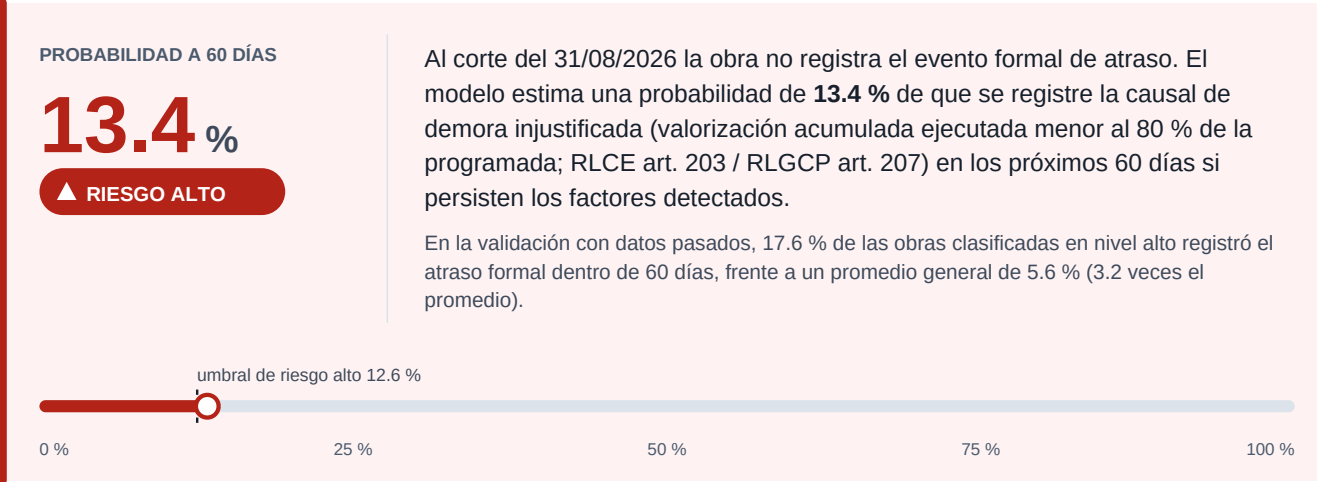


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	302 desde 15/07/2025	28/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E N° 54603 DE CENTRO POBLADO DE PADRE RUMI DISTRITO DE RANRACANCHA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC¿ CON CUI N° 2576084
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRACANCHA
Contratista	CONSORCIO WAQKRAPUCARA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	RANRACANCHA / CHINCHEROS / APURIMAC
Código Único de Inversión (CUI)	2576084
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 54603 DE CENTRO POBLADO PADRE RUMI DISTRITO DE RANRACANCHA DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Función	EDUCACIÓN
Identificador del contrato (SEACE)	2332885
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 7,251,047.41
Cuaderno de obra digital	302 asientos entre 15/07/2025 y 28/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

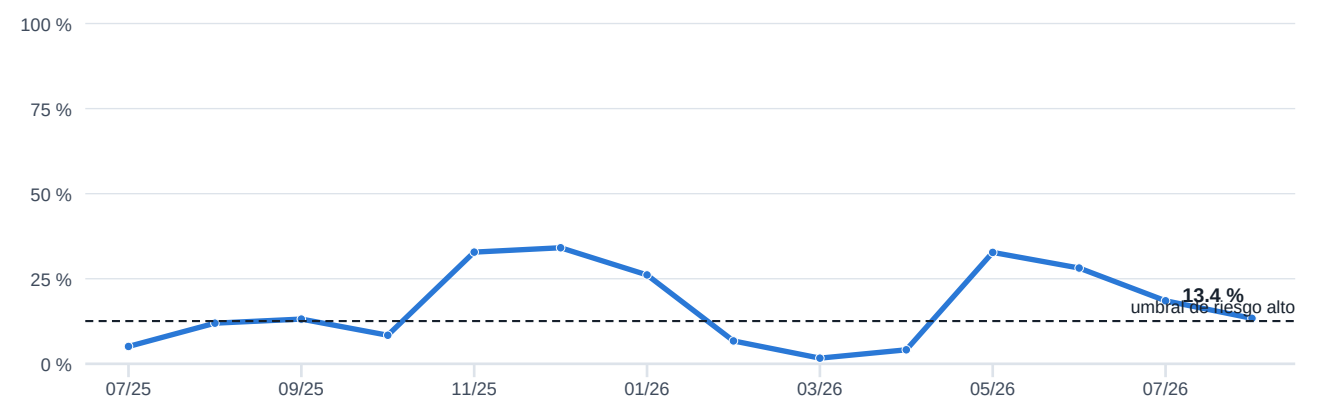

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (14 cortes, del 31/07/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
El 9 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.223
El 9 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.172
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.46 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.161
El último asiento se registró hace 3 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.143
El 57 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.135
18 asientos de aplicación de penalidades desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.121
5 asientos de aplicación de penalidades en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.079
Hubo registros en el cuaderno 14 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.073

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días	13.4 %	12.0 %	-1.3 pp
Absolver todas las consultas pendientes	13.4 %	13.2 %	-0.2 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	13.4 %	13.4 %	+0.0 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	13.4 %	13.4 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 297 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 22/08/2026

CONTINUANDO CON EL ASIENTO ANTERIOR: CUARTO. Lo ejecutado es íntegramente verificable por tratarse de elementos instalados a la vista y no de trabajos ocultos. Se REQUIERE al Supervisor constituirse en obra, verificar y dejar constancia escrita. Su ausencia no puede generar observación, penalidad ni retención al Contratista, siendo hecho ajeno a este y no imputable al Residente. QUINTO. Se formula CONSULTA al Supervis...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 297 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 22/08/2026

...r tratarse de elementos instalados a la vista y no de trabajos ocultos. se requiere al supervisor constituirse en obra, verificar y dejar constancia escrita. su ausencia no puede generar observacion, penalidad ni retencion al contratista, siendo hecho ajeno a este y no imputable al residente. quinto. se formula consulta al supervisor (art. 193 del reglamento) para que, con opinion del proyectista practiobra...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 296 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 22/08/2026

...se encontraba en obra situacion registrada reiteradamente en este cuaderno, no siendo posible efectuar coordinacion previa, absolver consultas ni obtener su verificacion in situ. esta ausencia genera demoras y perjuicio en la ejecucion. las visitas de funcionarios de la entidad no sustituyen la funcion del supervisor (art. 187 del reglamento), y solo el residente y el supervisor pueden anotar en el cuad...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 295 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 22/08/2026

...atarse de elementos a la vista y no de trabajos ocultos. se requiere al supervisor constituirse en obra, verificar y dejar constancia escrita. la ausencia del supervisor no puede generar observacion, penalidad ni retencion al contratista. quinto. se formula consulta al supervisor (art. 193 del reglamento) para que, con opinion del proyectista practiobras e.i.r.l. de ser necesaria, se pronuncie sobre la espe...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 292 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 20/08/2026

CONTINUANDO CON ASIENTO N° 291: TERCERO. Se deja constancia de que las recomendaciones genéricas de "acelerar la ejecución de los trabajos contratados" consignadas en dichos asientos no se encuentran acompañadas de la absolución de las consultas formuladas por la Residencia, ni del pronunciamiento de la Supervisión sobre las deficiencias del Expediente Técnico ni sobre la solicitud de calificación del retraso como ju...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 292 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 20/08/2026

...anadas de la absolucion de las consultas formuladas por la residencia, ni del pronunciamiento de la supervision sobre las deficiencias del expediente tecnico ni sobre la solicitud de calificacion del retraso como justificado contenida en la carta n 019-2026-consorcio ayavi/rc. en consecuencia, dichas recomendaciones no pueden ser interpretadas ni utilizadas como evidencia de un retraso imputable al cont...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 287 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 18/08/2026

...ad la carta n019-2026-consorcio ayavi/rc, mediante la cual formulo de manera expresa y formal la solicitud de calificacion como justificado del retraso en la culminacion de la obra y no aplicacion de penalidades por mora, invocando el articulo 162, numeral 162.5, del rlce. la referida carta contiene el fundamento tecnico y legal de la pretension, identificando causales, periodos y sustento, determinandose ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 288 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 18/08/2026

FALTA DE EVALUACIÓN DE CARTA N°019-2026-CONSORCIO AYAVI/RC Y SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO SOBRE RETRASO JUSTIFICADO: .///.....VIENE DEL ASIENTO ANTERIORcomunicación fue presentada con anterioridad y contiene expresamente el pedido de calificación del retraso como justificado y la no aplicación de penalidades por mora. Por tanto, NO RESULTA CORRECTO AFIRMAR LA AUSENCIA DE SOLICITUD EXPRESA DE CALIFICACIÓN DEL RE...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
