


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución de la obra del pi - ampliación de la capacidad del servicio de transporte fluvial, logístico y operativo de las unidades de frontera de la v de ¿ infraestructura terrestre - ii etapa- CUI 2233769

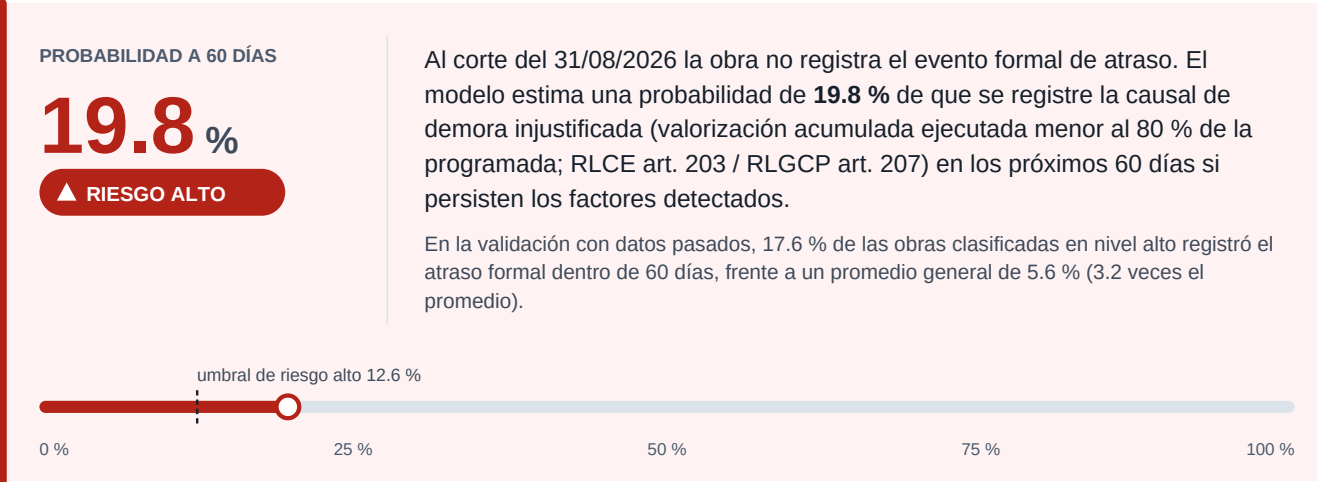


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	948 desde 03/04/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PI - AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL, LOGÍSTICO Y OPERATIVO DE LAS UNIDADES DE FRONTERA DE LA V DE ¿ INFRAESTRUCTURA TERRESTRE - II ETAPA- CUI 2233769
Entidad contratante	EJERCITO PERUANO
Contratista	CONSORCIO EJECUTOR CI
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	BELEN / MAYNAS / LORETO
Código Único de Inversión (CUI)	no enlazado
Inversión asociada	-
Función	-
Identificador del contrato (SEACE)	2316093
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	-
Cuaderno de obra digital	948 asientos entre 03/04/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

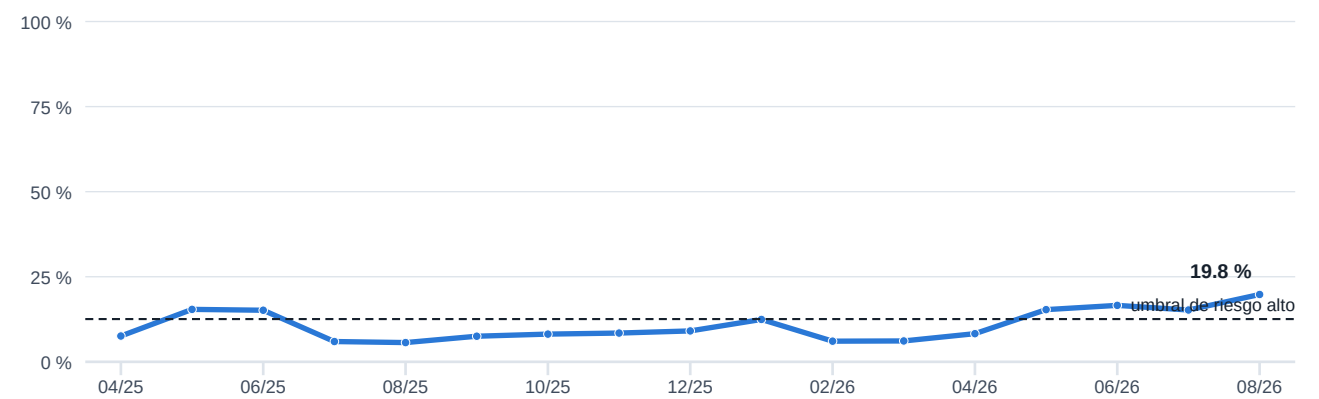

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (17 cortes, del 30/04/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.54 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.562
El 63 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.183
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.163
Hubo registros en el cuaderno 24 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.126
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.113
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.090
Departamento: Loreto	Características de la obra		+0.084
66 asientos registrados en los últimos 30 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.073

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	19.8 %	19.5 %	-0.3 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	19.8 %	19.5 %	-0.3 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 929 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 26/08/2026

...os activos de la obra, sin registrarse incidentes de violencia en el perímetro. se reitera que estos dos días de paralización (25 y 26 de agosto) constituyen causales eximentes de responsabilidad por retrasos debido a eventos de fuerza mayor. se solicita al supervisor de obra la verificación física y la validación correspondiente de esta ocurrencia en su asiento respectivo.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 927 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 25/08/2026

...inarias, equipos, herramientas y almacenes, quedando las instalaciones cerradas bajo estricta seguridad. se deja constancia de este hecho en salvaguarda de la responsabilidad de la contratista por los atrasos generados, reservándose el derecho de peticionar la correspondiente ampliación de plazo o la medida contractual que corresponda de acuerdo con la ley de contrataciones del estado. se adjunta al pre...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 886 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 05/08/2026

...nsulta no resulta imputable al contratista y que, conforme a lo dispuesto en el artículo 193 del ríce, , corresponde el reconocimiento del derecho a la ampliación de plazo por el periodo en que dicha demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 877 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/07/2026

RESPUESTA AL ASIENTO N°871 – DOCUMENTACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS: En atención al Asiento N°871, del Residente de Obra, de fecha 27 de julio del 2026, esta supervisión, mediante la CARTA N°048-2026-CPA-FRONTERA.SUP, indica que el Contratista deberá presentar el informe de su Especialista en Instalaciones Eléctricas, pronunciándose de manera expresa sobre la CARTA N°138/T-9.11.c/DPTO.INFRAEST/SINGE de fecha 13 de...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 871 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 27/07/2026

...ulo luminotecnico).la ausencia de dichos documentos limita la verificación de la conformidad del expediente con los requisitos mínimos de seguridad y operatividad, generando observaciones que podrían retrasar la ejecución de partidas y afectar los plazos de ejecución de obra.en tal sentido, se solicita a la supervisión se sirva remitir a la entidad sobre la documentación antes señalada, a fin de complem...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 866 · Programa de ejecución de obra - CPM · SOEC_SPV · 24/07/2026

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE CONFORMIDAD AL CRONOGRAMA CPM Y CALENDARIOS ACTUALIZADOS POR AMPLIACIÓN DE PLAZO N°03: El día de hoy se presenta a la Entidad, mediante la CARTA N°070-2026-CCF/JLPG-RC, del Representante Común de la Supervisión, el Informe Técnico de CONFORMIDAD, al programa de ejecución de obra (cronograma CPM) y calendario de avance de obra valorizado actualizado, por aprobación de ampliación de obra N°0...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
