


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecucion de obra: "mejoramiento y ampliacion del servicio de atención de salud básicos en sarabamba distrito de chota de la provincia de chota del departamento de cajamarca"

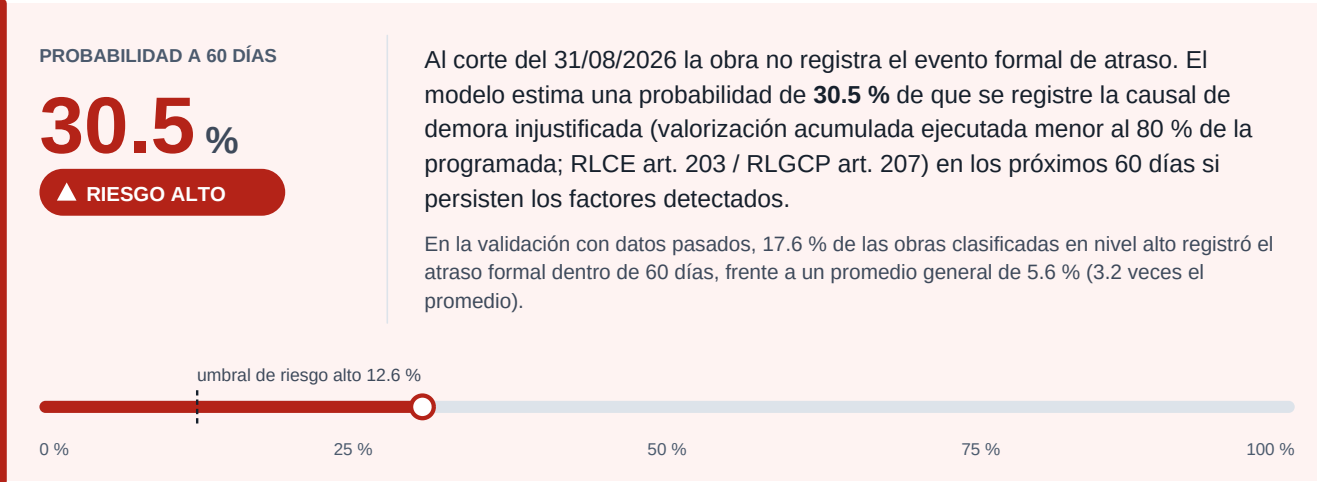


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	245 desde 20/01/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN SARABAMBA DISTRITO DE CHOTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA
Contratista	CONSORCIO GRUOP OWEN II
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CHOTA / CHOTA / CAJAMARCA
Código Único de Inversión (CUI)	2668405
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN SARABAMBA DISTRITO DE CHOTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Función	SALUD
Identificador del contrato (SEACE)	2371786
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 8,713,284.04
Cuaderno de obra digital	245 asientos entre 20/01/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

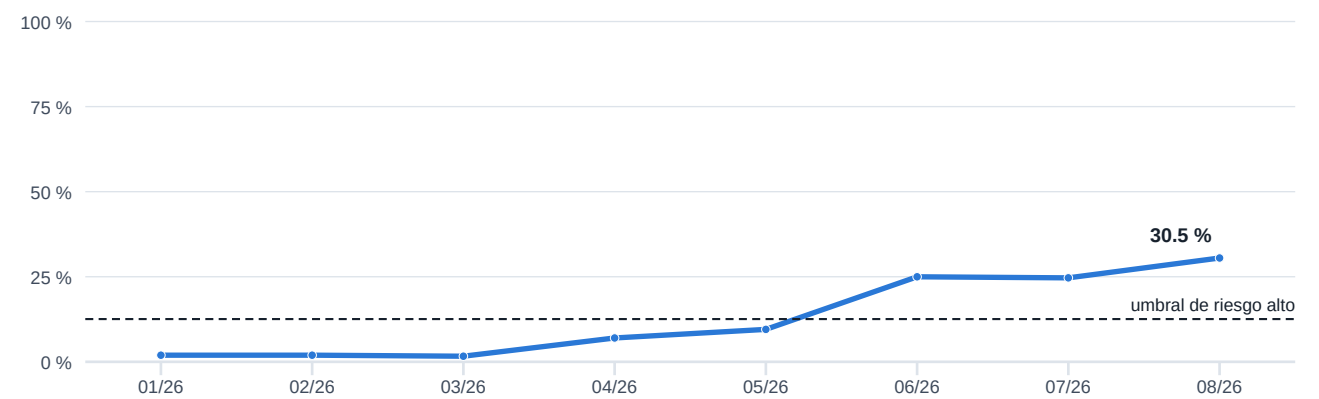

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (8 cortes, del 31/01/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.70 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.787
El 12 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.283
El 8 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.253
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.125
15 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.123
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.106
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona la regla del 80 % o un calendario acelerado	Contenido de los asientos		+0.093
Hubo registros en el cuaderno 22 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.088

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	30.5 %	30.2 %	-0.3 pp
Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días	30.5 %	30.2 %	-0.3 pp
Absolver todas las consultas pendientes	30.5 %	30.5 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 237 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 28/08/2026

retraso justificado . 1.el residente de obra, mediante la presente anotacion deja constancia de remitir adjunto la carta no 051 _ 2026 consorcio group owen ii/ rmcu/ rc, por medio del cual remito el informe ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 235 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 27/08/2026

retraso justificado . viene del asiento n 234, se deja constancia de la presentacion de la solicitud del retraso justificado mediante carta n 051-2026-consorcio group owen ii/rmcu/rc la mismo que contiene e...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 234 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 27/08/2026

retraso justificado . el residente de obra deja constancia que en amparo del articulo 120. penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion. numeral 120.4. el retraso se justifica a traves de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobada. adicionalmente, se considera justificado el ret...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 234 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 27/08/2026

retraso justificado . el residente de obra deja constancia que en amparo del articulo 120. penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion. numeral 120.4. el retraso se justifica a traves de la sollicitu...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 232 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 25/08/2026

...a, por lo que se solicita al residente la presentacion del calendario de obra acelerado, donde se establezca el plan de trabajo a implementar, esto con la finalidad de evitar el riesgo de una posible intervencion economica o de ser el caso la resolucio de contrato.se indica que este plan de ejecucion acelerado debe contemplar el aumento de turnos de trabajo, el aumento de cuadrillas para atacar varios frentes de traba...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 232 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 25/08/2026

administracion de riesgos bajo avance (aumento de cuadrillas) . - se indica al residente que debido al avance alcanzado a la fecha, lo cual evidencia un franco retraso en el avance de la obra, que pone en riesgo la culminacion de la obra en el triempo previsto dentro del plazo del contrato, es que esta supervision en cumplimiento de lo dispuesto en la clausula dec...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 226 · Órdenes · SOEC_SPV · 21/08/2026

CUMPLIR CON LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PLANTEADAS EN INFORME: - SE SOLICITA AL RESIDENTE, EN CALIDAD DE ORDEN, EL CUMPLIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS VIA INFORME TÉCNICO NO 003-2026 - ATIKUX SAC JGPN/SUPERVISION, ALCANZADO VIA CARTA N° 020 SUPERV. OBRA SAC. IGG DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2026 (ADJUNTO AL ASIENTO N° 180 – DEL SUPERVISOR DE FECHA 05/AGO/2026), YA QUE A LA FECHA SE A VERIFI...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 219 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 20/08/2026

...o lo dispuesto en la clausula decimotercera: gestion de riesgos, apartado r-011 (bajo rendimiento de la mano de obra monto valorizado por debajo del 80% del programado) y con el riesgo de una posible intervencion economica o resolucio de contrato, es que se solicita al contratista, el incremento del ritmo de trabajo, aumento de cuadrilla en todos los frentes disponibles, aumento de turnos de trabajo o algun mecanismo ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 219 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 20/08/2026

SE SOLICITA EN CALIDAD DE URGENTE AUMENTAR EL RITMO DE TRABAJO DEBIDO AL BAJO AVANCE COMPROBADO A LA FECHA: - VISTO LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA DECIMOTERCERA: GESTIÓN DE RIESGOS, APARTADO R-011 (BAJO RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA – MONTO VALORIZADO POR DEBAJO DEL 80% DEL PROGRAMADO) Y CON EL RIESGO DE UNA POSIBLE INTERVENCION ECONOMICA O RESOLUCION DE CONTRATO, ES QUE SE SOLICITA AL CONTRATISTA, EL INCREMENTO DEL R...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 218 · Órdenes · SOEC_SPV · 20/08/2026

...dias habiles, caso contrario se considera aprobado. 207.3. la falta de presentacion de este programa de ejecucion dentro del plazo senalado en el numeral precedente puede ser causal para que opere la intervencion economica de la obra o la resolucion del contrato. el nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el calculo y control de reajustes ni para s...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
