


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion de ejecucion de obra denominado: "mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en la urbanización san antonio, del distrito de ica - provincia de ica - departamento de ica", con CUI N° 2561130.

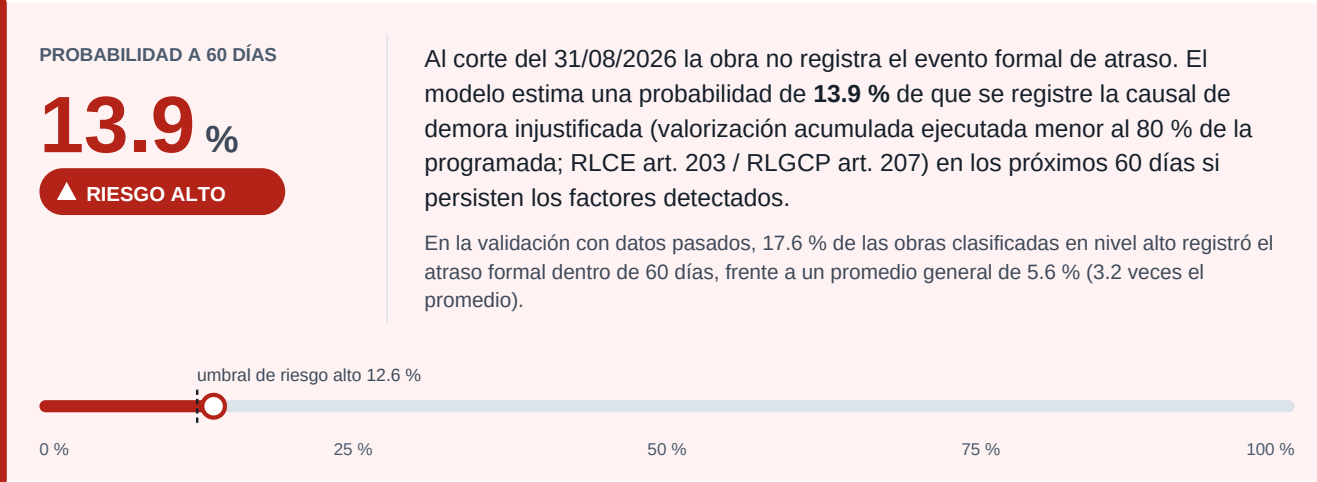


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	87 desde 08/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN SAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA", con CUI N° 2561130.
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Contratista	CONSORCIO SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	ICA / ICA / ICA
Código Único de Inversión (CUI)	2561130
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN SAN ANTONIO, DEL DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2395048
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 734,969.16
Cuaderno de obra digital	87 asientos entre 08/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

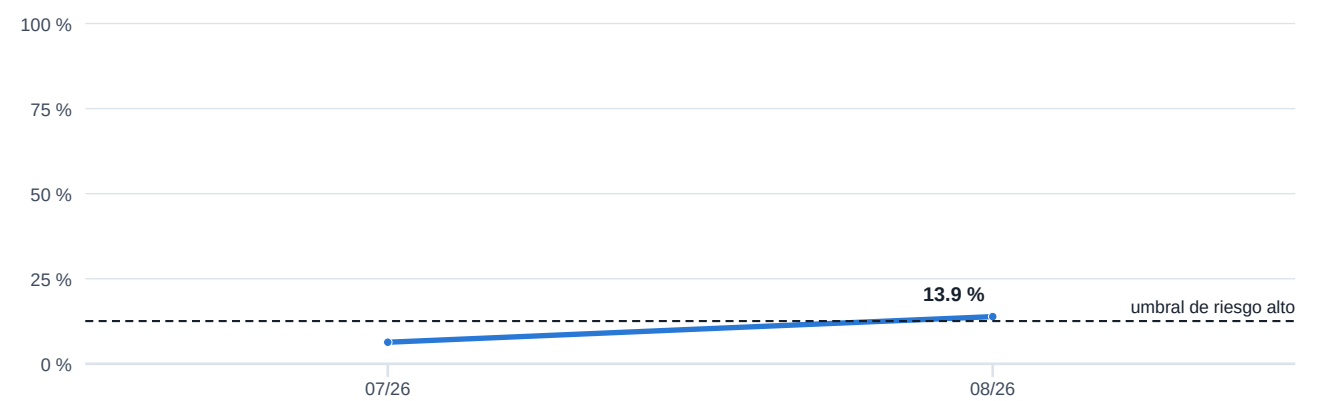

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.50 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.543
El 8 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.184
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.166
El 54 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.131
Hubo registros en el cuaderno 25 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.118
Departamento: Ica	Características de la obra		-0.117
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.092
Extensión media de los asientos recientes: 522 caracteres	Contenido de los asientos		+0.092

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	13.9 %	13.9 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 84 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 28/08/2026

...gua y se puede verificar la colocacion de material se indica al contratista avanzar con la comora de los medidores autorizados por la empresa municipal de agua ya que ello podria hacerlos incurrir en retraso

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 76 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

...as de alcantarillado, se solicita a la empresa contratista realizar el relleno lo mas pronto posible y la eliminacion del material excedente, se solicita la celeridad de los trabajos para mitigar los retrasos de obra que puedan causar.se realiza tambien la excavacion para conexiones domiciliarias de agua para lo que se solicita celeridad pues segun cronograma ya el agua deberia estar en mas frentes de l...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 63 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 14/08/2026

... arena así como de su recubrimiento. se recomienda hacer la excavacion de todos los frwntes de agua para llegar a fin de mes con el cronograma cumplido ya que hasta el día de hoy la obra se encuentra atrasada

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 62 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 13/08/2026

...e cajas en los lotes mencionados menos en los lotes 16, 17 y 18 debido a que esta pendiente el pronunciamiento de la municipalidad ya que es nuestro deber informar sobre lo encontrado en obra esto no retrasaria el trabajo ya que ya se puede comenzar el frente de agua.se verifica que en la semana se han mitigado los riesgos como los son atrasos en obra debido a la demora de prision de materiales e insu...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 57 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

ASIENTO N 57 DEL SUPERVISOR DE OBRA: EL DÍA DE HOY SE REALIZÓ LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE ADEMÁS SE ABRÍ EL FRENTE DE DESAGÜE EN LA AVENIDA NICOLAS DE RIVERA DE SOLICITA ABRIR EL FENTE DE AGUA LO MÁS RÁPIDO PARA EVITAR RETRASO ADEMÁS SE SOLICITA LA MITIGACIÓN DEL ÁREA Y SE INDICA QUE HASTA EL DÍA DE HOY NO HAN PRESENTADO NINGUNA RIESGO SI ACCIDENTE.SE LE COMUNICA AL RESIDENTE QUE EL DÍA DE HOY SE PRESENTÓ A ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 44 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 04/08/2026

ASIENTO N 44 DEL SUPERVISOR DE OBRA: EL DÍA DE HOY SE FUE A LA MUNICIPALIDAD PARA PODER INFORMAR DE LOS LOTES CUYA DELIMITACIÓN ESTÁN DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO DEBIDO A QUE HAN INVADIDO PARTE DE LA VÍA PEATONAL, ADEMÁS SE CONTINÚAN CON LAS LABORES DE RELLENO Y SE SOLICITA AL CONTRATISTA CON SUMA URGENCIA Y REITERATIVO LA ELIMINACIÓN DE DE MATERIAL EXCEDENTE DE MANERA INMEDIATA

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 30 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 25/07/2026

...cavacion de zanjas, corte y eliminacion de cajas de desagüe, colocacion de cajas de desagüe , instalacion de tuberias para conexiones domiciliarias con su respectiva cachimba.se adjunta informe sobre cambio de personal clave, ingeniero residente, de gerente de desarrollo urbano y acondicionamiento territorial.

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 29 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/07/2026

...to y niveles correspondientes, ademas se continua con la excavacion de zanja para desagüe y se solicita la eliminacion del material y la media cana del bz1 el día de hoy tambien nos fue comunicada el cambio de residente de obra por el ing juan garcia cardenas.

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
