


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion de ejecucion de obra: Creacion de los servicios de protección en la ribera de las quebradas vulnerables ante el peligro en los márgenes de la quebrada mediante muros de contencion en el caserio de ninacocha de centro poblado pichiu san pedro distrito de san marcos de la provincia de huari del departamento de ancash, con CUI N° 2662803

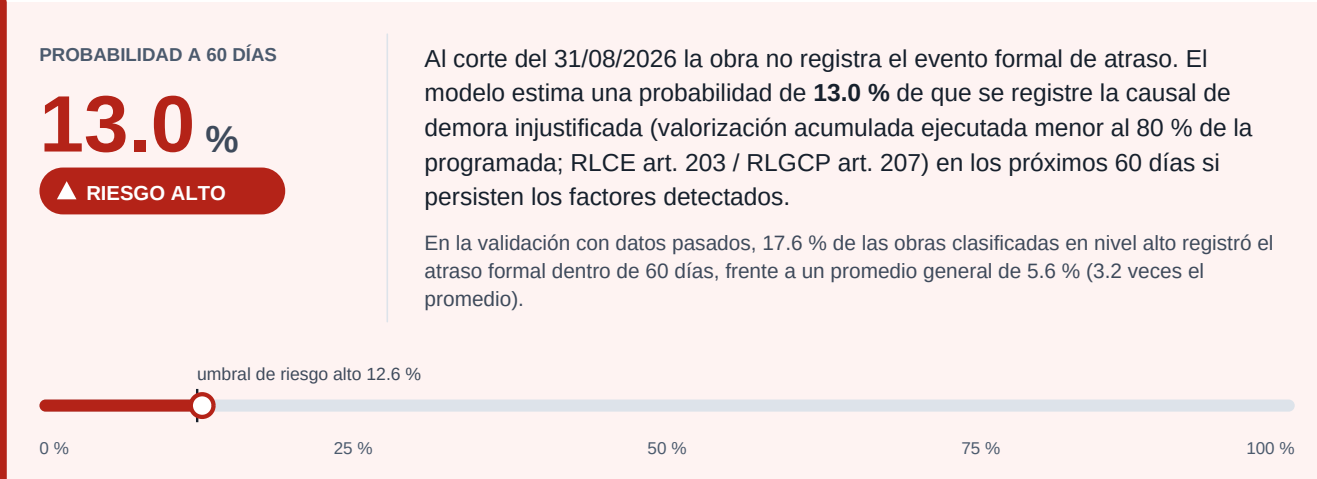

MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	103 desde 06/07/2026	31/08/2026


01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN LOS MARGENES DE LA QUEBRADA MEDIANTE MUROS DE CONTENCION EN EL CASERIO DE NINACOCOA DE CENTRO POBLADO PICHUI SAN PEDRO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N° 2662803
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
Contratista	CONSORCIO SAN ANTONIO
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	SAN MARCOS / HUARI / ANCASH
Código Único de Inversión (CUI)	2662803
Inversión asociada	CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN LOS MARGENES DE LA QUEBRADA MEDIANTE MUROS DE CONTENCION EN EL CASERIO DE NINACOCOA DE CENTRO POBLADO PICHUI SAN PEDRO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
Función	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
Identificador del contrato (SEACE)	2400207
Monto del contrato	-

Monto aprobado de la inversión	S/ 2,952,803.60
Cuaderno de obra digital	103 asientos entre 06/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

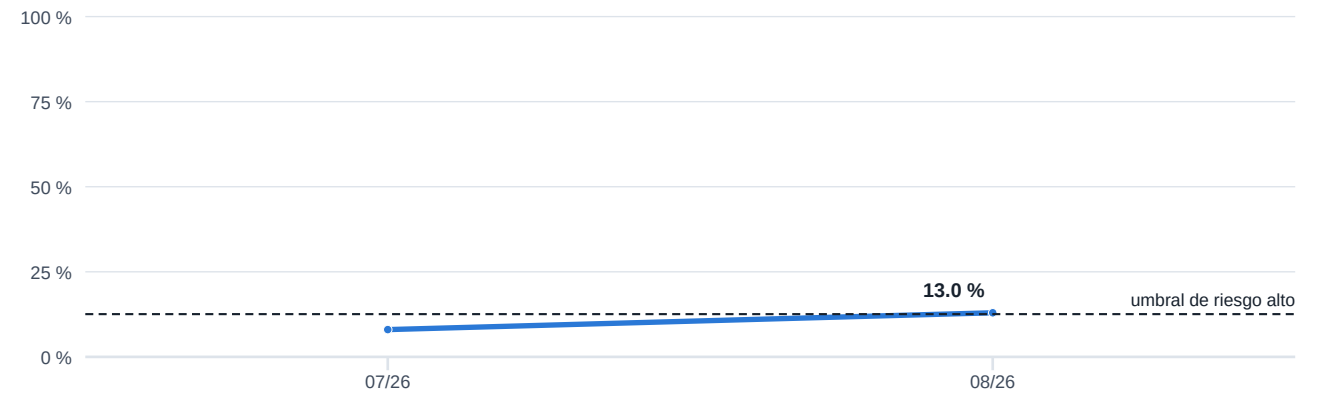

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
El 19 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.268
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.177
Hubo registros en el cuaderno 26 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.151
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.151
2 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.143
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.122
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.56 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.096
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.41 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.078

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	13.0 %	12.8 %	-0.2 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 91 · Órdenes · SOEC_SPV · 27/08/2026

AUTORIZACIÓN CONDICIONADA PARA VACIADO DE CONCRETO EN PANTALLA Y CONTRAFUERTE Y CONTROL DE CALIDAD: Descripción: En atención a la solicitud formulada por la Residencia de Obra, la Supervisión autoriza de manera condicionada el vaciado de concreto $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$ en la pantalla y contrafuertes, siempre que se mantengan las condiciones verificadas respecto a alineamientos, perpendicularidad, estabilidad y resistencia ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 92 · Órdenes · SOEC_SPV · 27/08/2026

AUTORIZACIÓN CONDICIONADA PARA VACIADO DE CONCRETO EN PANTALLA Y CONTRAFUERTE Y CONTROL DE CALIDAD: 7. Verificar el uso de aditivos desmoldantes en los encofrados y el uso de aditivos en el concreto, como Mega Rapid y Sikaplast-1000, únicamente conforme a las recomendaciones técnicas del fabricante, considerando la baja temperatura ambiental de la zona. 8. Mantener las medidas de seguridad y salud ocupacional durante...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 80 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

respuesta a los asientos n. 71 y 72 evaluación de la procedencia de suspensión del plazo de ejecución, sustitución del residente y posibles penalidades contractuales . (.....) continuación del asiento 798.3. penalidad por mora asimismo, la ausencia del residente o la demora del contratista en gestionar su reemplazo no suspende automática...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 79 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

respuesta a los asientos n. 71 y 72 evaluación de la procedencia de suspensión del plazo de ejecución, sustitución del residente y posibles penalidades contractuales . (.....) continuación del asiento 788. evaluación de posibles penalidades revisada la tabla de otras penalidades del contrato n. 147-2026-mdsm/gm, esta supervisión identifica co...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 80 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

...la procedencia de suspensión del plazo de ejecución, sustitución del residente y posibles penalidades contractuales . (.....) continuación del asiento 798.3. penalidad por mora asimismo, la ausencia del residente o la demora del contratista en gestionar su reemplazo no suspende automáticamente el plazo de ejecución. en consecuencia, si dicha situación afecta el cumplimiento del plazo contractual y resulta impu...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 79 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

...el personal técnico el contrato establece una penalidad equivalente a 0.30 UIT por cada día de inasistencia injustificada, por cada profesional. en el presente caso deberá determinarse previamente si la ausencia del residente tiene carácter justificado o injustificado. considerando la existencia de certificado médico y la comunicación formal de renuncia por una circunstancia sobreviniente, no corresponde aplicar automática...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 85 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

...resencia efectiva, permanencia y cumplimiento de funciones conforme a las condiciones establecidas en el contrato y demás documentos contractuales. asimismo, cualquier ausencia, reemplazo, variación o incumplimiento relacionado con el personal clave deberá ser comunicado oportunamente y será registrado por esta supervisión para los efectos contractuales que correspondan. se deja constancia para los fines p...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 81 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

respuesta a los asientos n. 71 y 72 evaluación de la procedencia de suspensión del plazo de ejecución, sustitución del residente y posibles penalidades contractuales . (.....) continuación del asiento 8010. determinación de la supervisión por las consideraciones expuestas, esta supervisión determina: primero.- se toma conocimiento de ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 80 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026 RESPUESTA A LOS ASIENTOS N.º 71 Y 72 – EVALUACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, SUSTITUCIÓN DEL RESIDENTE Y POSIBLES PENALIDADES CONTRACTUALES: (.....) CONTINUACION DEL ASIENTO 798.3. PENALIDAD POR MORAAsimismo, la ausencia del Residente o la demora del CONTRATISTA en gestionar su reemplazo no suspende automáticamente el plazo de ejecución.En consecuencia, si dicha situación afect... Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 79 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026 RESPUESTA A LOS ASIENTOS N.º 71 Y 72 – EVALUACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, SUSTITUCIÓN DEL RESIDENTE Y POSIBLES PENALIDADES CONTRACTUALES: (.....) CONTINUACION DEL ASIENTO 788. EVALUACIÓN DE POSIBLES PENALIDADESRevisada la Tabla de Otras Penalidades del Contrato N.º 147-2026-MDSM/GM, esta SUPERVISIÓN identifica como directamente vinculados a la situación comunicada los siguientes ... Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 81 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026 ...ncia del residente, se recomendará la aplicación del ítem n. 31 1.00 uit por cada día ejecutado, conforme a los medios probatorios correspondientes.decimo.- si la falta de sustitucion oportuna genera retrasos imputables al contratista, correspondera evaluar adicionalmente la aplicación de la penalidad por mora. (.....) Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 80 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026 ... del plazo de ejecucion, sustitucion del residente y posibles penalidades contractuales . (.....) continuacion del asiento 798.3. penalidad por moraasimismo, la ausencia del residente o la demora del contratista en gestionar su reemplazo no suspende automaticamente el plazo de ejecucion.en consecuencia, si dicha situacion afecta el cumplimiento del plazo contractual y resulta imputable al con... Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
