


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecucion de obra: Ampliacion del servicio de suministro electrico domiciliario en zonas urbanas en 6 unidades productoras 5 distritos de 4 provincias del departamento de arequipa

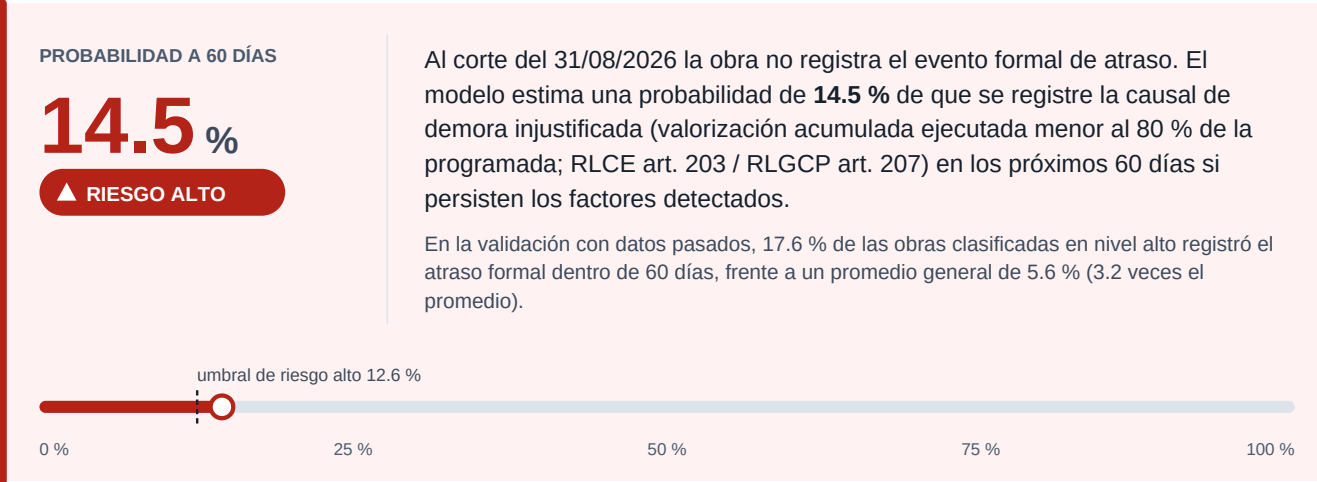


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	39 desde 09/06/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCION DE OBRA: AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN 6 UNIDADES PRODUCTORAS 5 DISTRITOS DE 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Entidad contratante	SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.
Contratista	HERRERA ORE PALERMO
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA
Código Único de Inversión (CUI)	2641826
Inversión asociada	AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN 6 UNIDADES PRODUCTORAS 5 DISTRITOS DE 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Función	ENERGÍA
Identificador del contrato (SEACE)	2390813
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 10,588,352.65
Cuaderno de obra digital	39 asientos entre 09/06/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

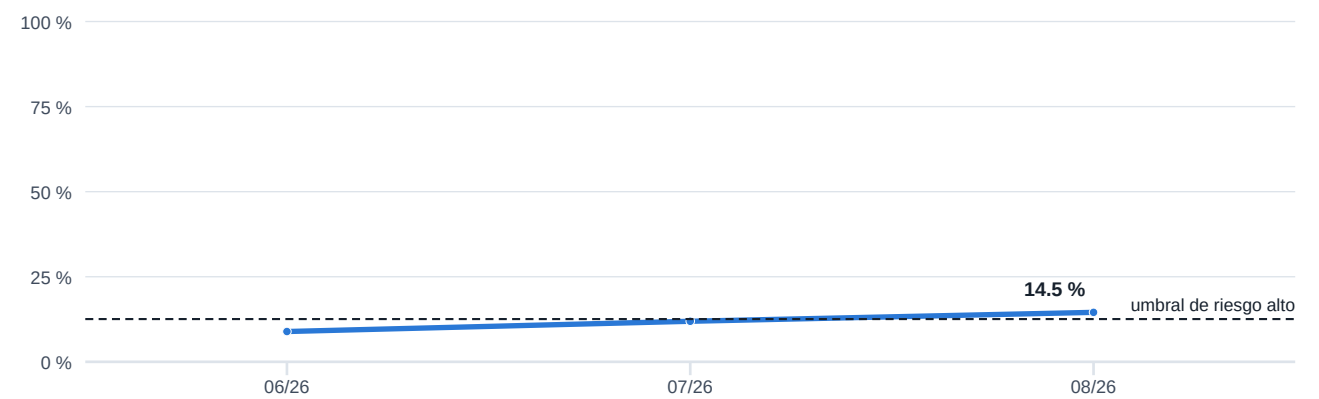

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.55 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.537
El 19 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.164
Departamento: Arequipa	Características de la obra		+0.142
El 7 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.126
Entidad contratante: otra entidad pública	Características de la obra		+0.097
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.62 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.091
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.090
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.085

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	14.5 %	13.9 %	-0.6 pp
Absolver todas las consultas pendientes	14.5 %	14.5 %	-0.1 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 35 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 18/08/2026

...as calendario, conforme al procedimiento establecido en el artículo 200 del reglamento de la ley n 32069, ley general de contrataciones publicas.la referida solicitud tiene como sustento la causal de atraso y/o paralización por causa no atribuible al contratista, derivada de la demora en la absolución de la consulta técnica relacionada con incidencias del expediente técnico, cuya atención requería la c...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 35 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 18/08/2026

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL N° 01: En la fecha, quien suscribe, en calidad de Residente de Obra, deja constancia que el Contratista PALERMO HERRERA ORÉ ha presentado formalmente ante la Entidad Contratante – Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. – SEAL y ante la Supervisión de Obra, la Carta N° 77-2026-HCC-RO/13AAHH (acompañada del Informe Técnico N° 006-2026-HCC-RO/HOP/13AAHH), media...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 34 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 14/08/2026

...mar) . se deja constancia que, en relación con el asiento n 23 del cuaderno de obra, de fecha 31.07.2026, mediante el cual residente de obra registro el inicio de la causal de ampliación de plazo por demora en la aprobación del plan de monitoreo arqueológico (pmar), se ha tomado conocimiento de la resolución directoral n 000535-2026/ddc/are/mc, de fecha 13.08.2026, comunicada mediante carta n 001850-202...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 32 · Participación del personal clave · SOEC_RESI · 14/08/2026

cambio de personal clave del plantel profesional-especialista en redes de media tensión y subestaciones de distribución . se deja constancia que, habiéndose tomado conocimiento de la autorización para el cambio del per...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 31 · Participación del personal clave · SOEC_RESI · 07/08/2026

cambio de personal clave del plantel profesional residente de obra . se deja constancia que, habiéndose tomado conocimiento de la autorización para el cambio del personal clave correspondiente al cargo de residente de ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 28 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 05/08/2026

ACLARACIÓN SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE LA CONSULTA ABSUELTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONTENIDO DE LAS CONSULTAS ABSUELTAS MEDIANTE CARTA N° 076-2026-JLVA/CO DE FECHA 05.08.2026 CORRESPONDE A LAS CONSULTAS TÉCNICAS FORMULADAS POR EL CONTRATISTA MEDIANTE INFORME TÉCNICO N° 002-2026-FSBH-RO/HOP/13AAHH, DE FECHA 25.06.2026.ASIMISMO, SE PRECISA QUE, SI BIEN EN EL ASIENTO N° 27 DEL CUADERNO DE OBRA LA SUPERVISIÓN CONSIGNA...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 29 · Respuestas a consultas · SOEC_RESI · 05/08/2026

inicio y fin de la causal de ampliación de plazo por demora en la absolución de consultas . se deja constancia que, habiéndose recibido la absolución de las consultas técnicas formuladas por el contratista, comunicada por la supervisión mediante carta n 076-2...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 25 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 04/08/2026

identificación de riesgo por demora en la absolución de consultas técnicas . se deja constancia que, durante la ejecución de la obra ampliación del servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas urbanas en 6 unidades productora...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 17 · Entregables · SOEC_SPV · 08/07/2026

RESPUESTA A LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE INGENIERIA DE DETALLE.: EN LA FECHA SE DEJA CONSTANCIA QUE CON DOCUMENTO CARTA N° 045-2026-JLVA/CO (DE FECHA 08.07.26) SE ALCANZA AL CONTRATISTA LA RESPUESTA A LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE INGENIERIA DE DETALLE, PARA QUE EL CONTRATISTA PROCEDA A LA SUBSANACIÓN CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS DENTRO DE SU CONTRATO VIGENTE.

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
