

INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion para la ejecucion de obra mejoramiento de la prestación de los servicios de salud en el puesto de salud occopata de la comunidad campesina de occopata, distrito de santiago - cusco - cusco

PROBABILIDAD A 60 DÍAS

13.2 %

▲ RIESGO ALTO

Al corte del 31/08/2026 la obra no registra el evento formal de atraso. El modelo estima una probabilidad de **13.2 %** de que se registre la causal de demora injustificada (valorización acumulada ejecutada menor al 80 % de la programada; RLCE art. 203 / RLGCP art. 207) en los próximos 60 días si persisten los factores detectados.

En la validación con datos pasados, 17.6 % de las obras clasificadas en nivel alto registró el atraso formal dentro de 60 días, frente a un promedio general de 5.6 % (3.2 veces el promedio).

umbral de riesgo alto 12.6 %

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	211 desde 02/02/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD OCCOPATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCOPATA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO - CUSCO
Contratista	CONSORCIO HEALTH OCCOPATA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	SANTIAGO / CUSCO / CUSCO
Código Único de Inversión (CUI)	2156397
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD OCCOPATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCOPATA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO
Función	SALUD
Identificador del contrato (SEACE)	2371396
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 2,108,579.00
Cuaderno de obra digital	211 asientos entre 02/02/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

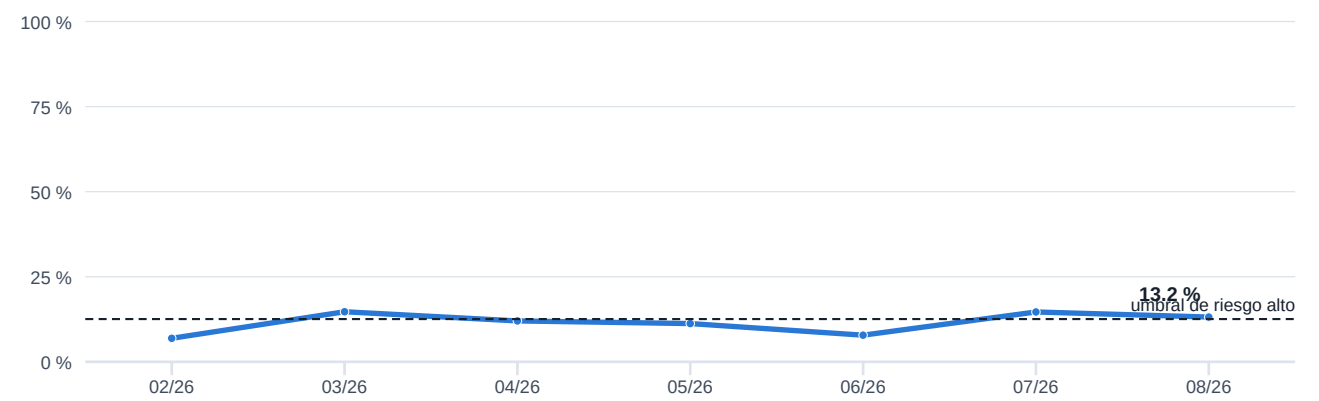

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (7 cortes, del 28/02/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.62 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.666
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.186
El 7 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.184
Departamento: Cusco	Características de la obra		-0.111
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.105
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona la regla del 80 % o un calendario acelerado	Contenido de los asientos		+0.083
6 asientos de adicionales de obra en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.079
Extensión media de los asientos recientes: 1,010 caracteres	Contenido de los asientos		-0.057

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	13.2 %	13.1 %	-0.0 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	13.2 %	13.2 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 204 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 26/08/2026

..., a la fecha de emision del presente asiento, no se ha alcanzado a la supervision ninguna ficha tecnica del equipamiento estrategico para su correspondiente revision y aprobacion, situacion que viene retrasando el inicio de las acciones necesarias para su adquisicion.en tal sentido, se requiere al contratista que, de manera inmediata, proceda con la presentacion de las respectivas fichas tecnicas y docu...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 187 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 07/08/2026

CUMPLIMIENTO DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAL CLAVE: SE DEJA CONSTANCIA QUE ESTA SUPERVISIÓN PONE EN CONOCIMIENTO DE LA RESIDENCIA DE OBRA QUE, EN CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE GESTIÓN COLABORATIVA DEL CONTRATO Y DE LA FINALIDAD PÚBLICA DEL PROYECTO, SE HA COORDINADO QUE, SI BIEN EL CONTRATISTA CUENTA CON UNA PROGRAMACIÓN DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL CLAVE PARA TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, ESTA DEBERÁ SER ACTU...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 187 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 07/08/2026

...a la permanencia en obra del especialista en arquitectura.no obstante, durante la verificacion realizada por esta supervision se constato que la referida especialista no se encontra presente en obra, incumpliendo la programacion presentada por el propio contratista.en consecuencia, se solicita a la residencia de obra adoptar las acciones necesarias para asegurar el estricto cumplimiento de la programac...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 186 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 07/08/2026

...ia de 9.30 %.en ese sentido, y de acuerdo con la evaluacion del cronograma de ejecucion de obra vigente, la obra se encuentra en situacion de obra atrasada, manteniendose al limite del rango mayor al 80 % del avance programado (80.08 %).asimismo, de los avances fisicos programados acumulados para los siguientes meses son:ago-26: 78.10 %set-26: 99.87 %oct-26: 100.00 %en ese contexto, luego de la evalua...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 186 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 07/08/2026

...dicho periodo es de 46.70 %, generandose una diferencia de 9.30 %.en ese sentido, y de acuerdo con la evaluacion del cronograma de ejecucion de obra vigente, la obra se encuentra en situacion de obra atrasada, manteniendose al limite del rango mayor al 80 % del avance programado (80.08 %).asimismo, de los avances fisicos programados acumulados para los siguientes meses son:ago-26: 78.10 %set-26: 99.87 ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 171 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 23/07/2026

...as adoptadas para garantizar su atencion oportuna.lo anterior, con la finalidad de verificar que las gestiones administrativas y tecnicas se desarrollen conforme a la programacion de la obra y evitar retrasos que puedan afectar la ruta critica, el cumplimiento del cronograma contractual y la puesta en funcionamiento de la infraestructura, siendo responsabilidad del contratista adoptar las acciones neces...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 167 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 22/07/2026

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA – VERSIÓN N° 02: SE DEJA CONSTANCIA QUE, MEDIANTE CARTA N° 073-2026-MDS-OGSLI-RTC, DE FECHA 17 DE JULIO DE 2026, LA ENTIDAD APROBÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA – VERSIÓN N° 02, EN EL CUAL SE ESTABLECEN LAS METAS Y AVANCES PROGRAMADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.DE LA REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN APROBADA S...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 168 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 22/07/2026 ...cia de obra, en consecuencia, cualquier afectacion a la calidad de la obra, a la seguridad y salud en el trabajo o cualquier consecuencia tecnica, administrativa, economica o contractual derivada del incumplimiento o atencion tardia de las observaciones y requerimientos formulados por esta supervision sera de exclusiva responsabilidad del contratista. Fuente: cod-asientos202607.csv
Asiento N.º 167 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 22/07/2026 ... optimizacion de la secuencia constructiva, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los avances establecidos en el programa de ejecucion de obra version n 02, mitigando el riesgo de mayores atrasos durante la ejecucion de la obra, bajo responsabilidad del contratista. Fuente: cod-asientos202607.csv
Asiento N.º 162 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/07/2026 ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA – VERSIÓN N° 02.: SE DEJA CONSTANCIA QUE, MEDIANTE CARTA N° 073-2026-MDS-OGSLI-RTC, DE FECHA 17 DE JULIO DE 2026, LA ENTIDAD COMUNICÓ LA PROCEDENCIA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA – VERSIÓN N° 02, ASÍ COMO DEL CALENDARIO DE AVANCE VALORIZADO, CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS Y CALENDARIO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS, LOS CUALES SE EN... Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
