


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

contratación de la ejecución de obra: ¿mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la AV. Ferrocarril, tramo: AV. San carlos - AV. Huancavelica, distritos de huancayo, chilca de la provincia de huancayo del departamento de junín¿, con CUI N° 2663368

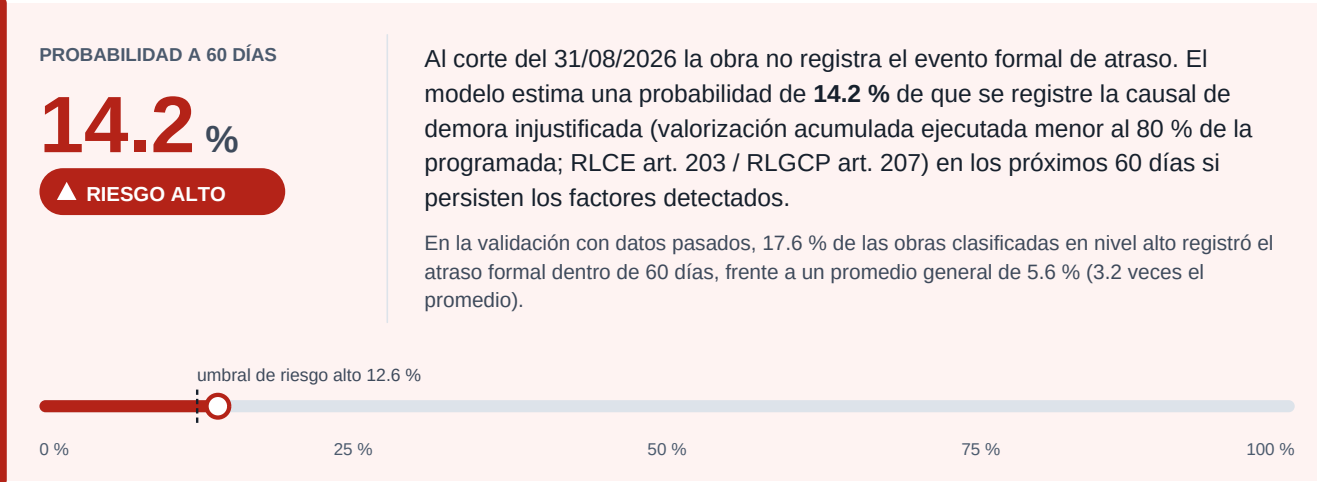


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	40 desde 13/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. FERROCARRIL, TRAMO: AV. SAN CARLOS - AV. HUANCVELICA, DISTRITOS DE HUANCAYO, CHILCA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN¿, CON CUI N° 2663368
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL
Contratista	CONSORCIO CHONTA PAUCARBAMBA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	HUANCAYO / HUANCAYO / JUNIN
Código Único de Inversión (CUI)	2663368
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. FERROCARRIL , TRAMO: AV. SAN CARLOS - AV. HUANCVELICA, DISTRITOS DE HUANCAYO, CHILCA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2400886
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 6,440,706.70
Cuaderno de obra digital	40 asientos entre 13/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

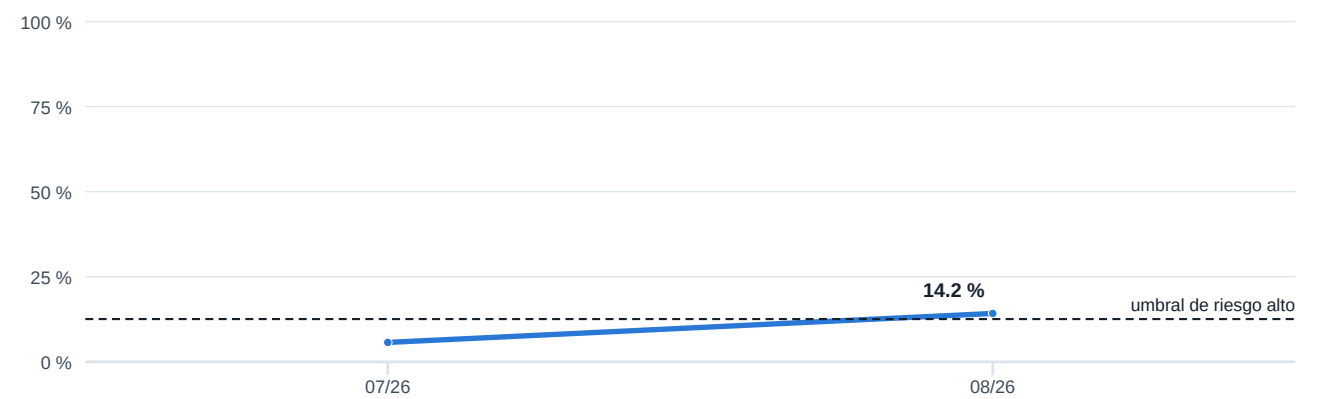

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.65 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.656
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.184
4 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.144
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.096
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.61 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.095
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.078
Departamento: Junín	Características de la obra		-0.062
Extensión media de los asientos recientes: 938 caracteres	Contenido de los asientos		-0.054

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	14.2 %	13.6 %	-0.6 pp
Absolver todas las consultas pendientes	14.2 %	14.2 %	+0.0 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	14.2 %	14.2 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 40 · Órdenes · SOEC_INSP · 31/08/2026

RESPUESTA SOBRE NECESIDAD DE ADICIONAL DE OBRA – ASIENTO 35: La solicitud de la residencia de obra a la Inspección de obra respecto al requerimiento de autorizar una prestación adicional de manera directa no está contemplada en el marco normativo de la Ley de contrataciones del Estado Ley N° 32069 ni en su reglamento, por tanto Esta esta inspección de obra en cumplimiento del reglamento de la Ley de contrataciones, a...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 37 · Órdenes · SOEC_INSP · 27/08/2026

EJECUCIÓN DE PARTIDA 01.07 RECAPE.O CON MEZCLA ASFALTICA EN CALZADA: La inspección de obra, visto el asiento 32 del residente de obra, donde indica que se está ejecutado la partida 01.07.01 LIMPIEZA Y BARRIDO PRELIMINAR, la que debe culminarse de manera adecuada pues la superficie de la vía en la Av. Ferrocarril en sus dos carriles desde la progresiva 0+020 a la 0+560 aun presenta material suelto compuesto de tierra,...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 33 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 24/08/2026

SOBRE CARTA PRESENTADA A ENTIDAD: Indica que se ejecutado la partida 01.07.01 LIMPIEZA Y BARRIDO PRELIMINAR, encontrando material sedimentado que es normal es este tipo de intervención. Además, comunica que ha presentado la CARTA N° 020-GRJ/CVHII del representante común conteniendo el INFORME N° 11-2026-CVHII/RO del residente de obra, esta inspección de obra requiere conocer el contenido o propuesta del informe presen...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 34 · Órdenes · SOEC_INSP · 24/08/2026

SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL INSPECTOR DE OBRA PARA PROSEGUIR CON LA EJECUCION DE LA PARTIDA: 01.07.02 RIEGO DE IMPRIMACION ASFALTICA CON MAQUINARIA: En el asiento 31 del residente de obra, indico lo de los sedimentos, escombros. y otros. Como esta inspección ya realizo el análisis y propuso las acciones siguientes: no se puede continuar con las partidas específicas de la 01.07 RECAPEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALZADA...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 27 · Administración de riesgos · SOEC_INSP · 18/08/2026

SOBRE EJECUCION DE OBRA: A la fecha, la ejecución de la obra durante el mes de agosto esta desarrollándose de manera muy lenta, se indica a la residencia de obra que en atención al Artículo 190, numeral "190.5. El contratista debe formular la consulta con la anticipación suficiente para que el programa de ejecución no sea afectado por el cumplimiento de los plazos del procedimiento para la atención de su consulta, c...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 27 · Administración de riesgos · SOEC_INSP · 18/08/2026

...a, caso contrario no puede alegar la afectacion de la ruta critica por los plazos de respuesta", se debe ser oportuno y agil en consultas y soluciones propuestas, de lo contrario se estaran generando retrasos en la ejecucion contractual de la obra a su cargo.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 26 · Ampliaciones de plazo · SOEC_INSP · 18/08/2026

...usal es el día 28/julio/2026, ya que no cuentan con respuesta de la entidad a esta la fecha. para el caso, el no iniciar la partida 01.08.05.01 encimado de buzones en la fecha prevista, esta generando retraso en el cronograma de ejecucion de obra vigente por que la indicada partida esta considerada dentro de la ruta critica de la obra.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 23 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 10/08/2026

INICIO DE PARTIDA 01.08.05.01 ENCIMADO DE BUZONES: CONTINUACION DEL ASIENTO N° 22.....QUE AUTORICE LA EJECUCION DE TRABAJOS EN LOS 141 BUZONES DEL PROYECTO QUE SON PROPIEDAD DE EMPRESAS DE SANEAMIENTO Y TELECOMUNICACIONES (SEDAM HUANCAYO, CLARO, TELEFONICA).CON LA FALTA DE DOCUMENTOS(ACTAS Y/O COMPROMISOS) EN EL EXPEDIENTE TECNICO, FALTA DE COMUNICACION DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE DOCUMENTOS DE AUTORIZACION ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
