


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecucion de Obra: Reforzamiento Estructural de Aula general, Auditorio y ambiente administrativo, Remodelacion de ambiente administrativo, Ademas de otros activos en el(la) administracion central de la sede Historica de la Universidad Nacinal de Musica en la localidad de Lima, distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima - IOARR 2541744

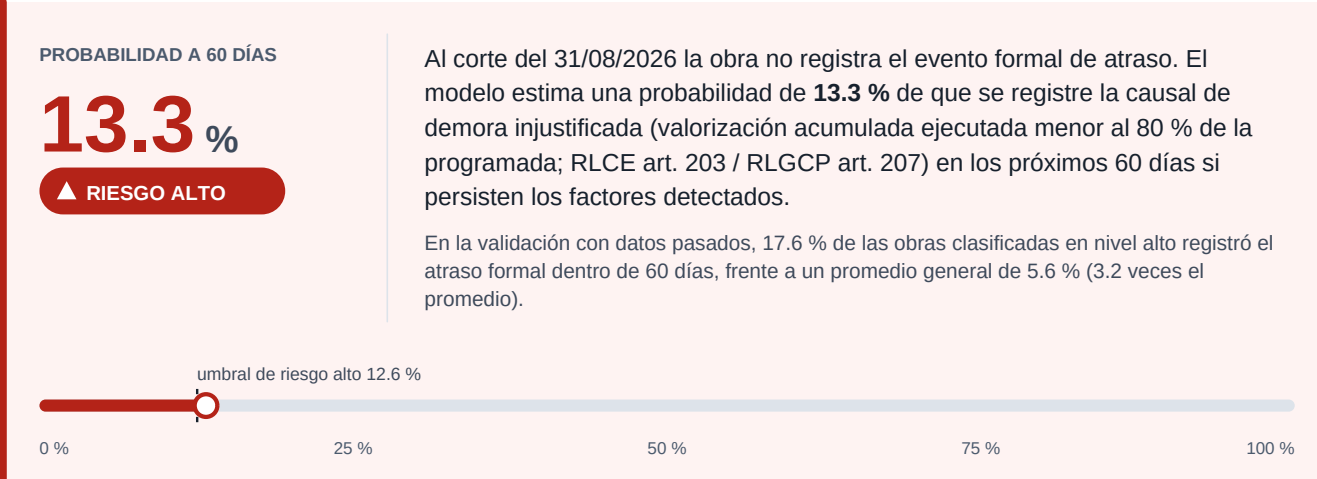

MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	102 desde 22/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato


Denominación oficial	Ejecucion de Obra: Reforzamiento Estructural de Aula general, Auditorio y ambiente administrativo, Remodelacion de ambiente administrativo, Ademas de otros activos en el(la) administracion central de la sede Historica de la Universidad Nacinal de Musica en la localidad de Lima, distrito de Lima, Provincia Lima, Departamento Lima - IOARR 2541744
Entidad contratante	CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA
Contratista	CONSORCIO TARMA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	LIMA / LIMA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2541744
Inversión asociada	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE AULA GENERAL, AUDITORIO Y AMBIENTE ADMINISTRATIVO REMODELACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SEDE HISTORICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MUSICA EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
Función	EDUCACIÓN
Identificador del contrato (SEACE)	2404791
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 3,914,135.33

Cuaderno de obra digital

102 asientos entre 22/07/2026 y 31/08/2026

02

Evolución del riesgo estimado a 60 días

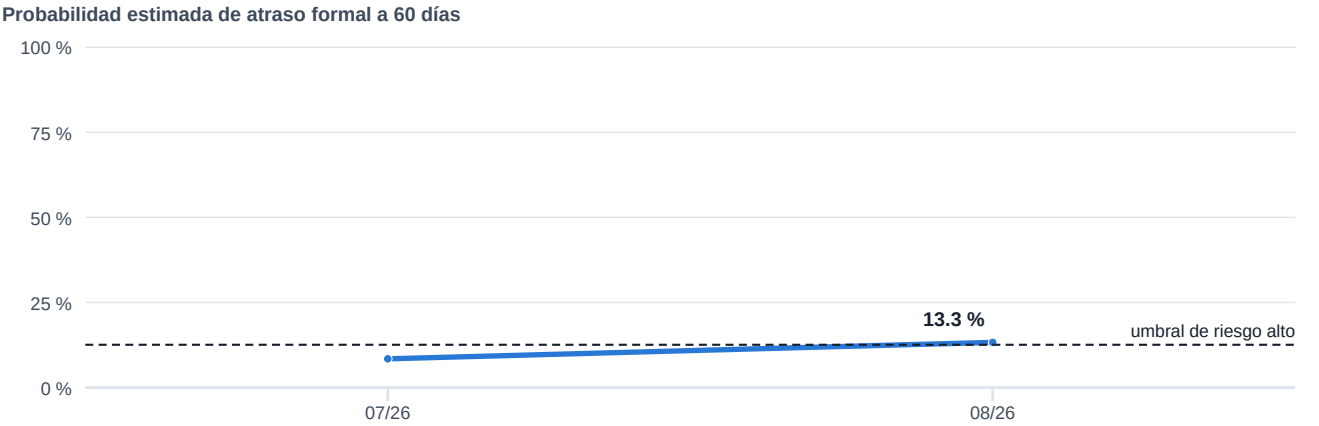

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03

Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.62 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.547
Entidad contratante: otra entidad pública	Características de la obra		+0.175
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.172
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.087
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.081
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.62 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.075
Hubo registros en el cuaderno 21 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.066
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.055

04

Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	13.3 %	13.8 %	+0.5 pp

05

Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 79 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 22/08/2026

REUBICACION DEL EJE DE COLUMNAS ENTRE EJE F - H AMBIENTE A-118: REFERENTE AL ASIENTO 76 SE LE COMUNICA AL RESIDENTE QUE DEBE PRESENTAR EL DETALLE TECNICO DE LA REUBICACION DE LAS COLUMNAS ENTRE EL EJE F y H SUSTENTANDO TAL PETICION, A FIN DE EVALUAR TECNICAMENTE Y DE SER FACTIBLE DAR PASE A DICHO PEDIDO.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 66 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/08/2026

CONSULTA TECNICA: REFERENTE A LOS ASIENOS 63 Y 64 DEL RESIDENTE EN EL CUAL MEDIANTE CARTA N° 024-2026/G MONTERRICO S.A.C y CARTA N° 023-2026/G MONTERRICO S.A.C DE FECHAS 17 AGOSTO 2026 FORMULAN CONSULTAS TECNICAS REFERENTE A UNA PRESTACION ADICIONAL PARA EL PISO DEL AMBIENTE A-118 y DESMONTAJES Y REMOCIONES DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA RESPECTIVAMENTE, SE LE COMUNICA AL RESIDENTE QUE SE ESTA EVALUANDO Y FORM...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 23 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 30/07/2026

CONSULTAS: SE LE INDICA AL RESIDENTE LO SGUIENTE- QUE TODAS LAS CONSULTAS DEBEN ESTAR ACOMPAÑADAS CON SUS RESPECTIVAS PROPUESTAS DE SOLUCION.- ES PRECISO DEFINIR QUE SUMA ALZADA ES LA MODALIDAD DE PAGO CUANDO LAS CANTIDDES, MAGNITUDES Y CALIDADES DE LA PRESTACION ESTAN DEFINIDAS EN EL REQUERIMIENTO, EL POSTOR FORMULA SU PROPUESTA PROPONIENDO UN MONTO FIJO INTEGRAL, ESO SIGNIFICA QUE EL CONTRATISTA ASUME EL RIESGO D...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
