


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento de la infraestructura deportiva, recreacional y cultural en el espacio deportivo del asentamiento humano san juan yurimaguas del distrito de yurimaguas - provincia de alto amazonas - departamento de loreto CUI N° 2440398

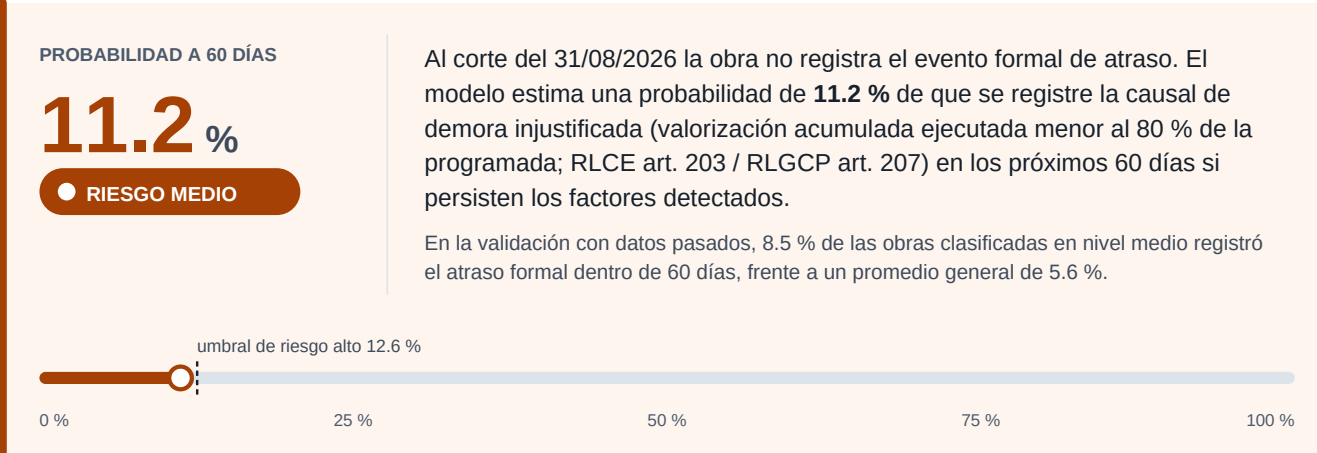


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	295 desde 01/04/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL ESPACIO DEPORTIVO DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN JUAN YURIMAGUAS DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO CUI N° 2440398
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS
Contratista	CONSORCIO EJECUTOR MYR
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	YURIMAGUAS / ALTO AMAZONAS / LORETO
Código Único de Inversión (CUI)	2440398
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREACIONAL Y CULTURAL EN EL ESPACIO DEPORTIVO DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN JUAN YURIMAGUAS DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO
Función	CULTURA Y DEPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2383889
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 2,605,853.00
Cuaderno de obra digital	295 asientos entre 01/04/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

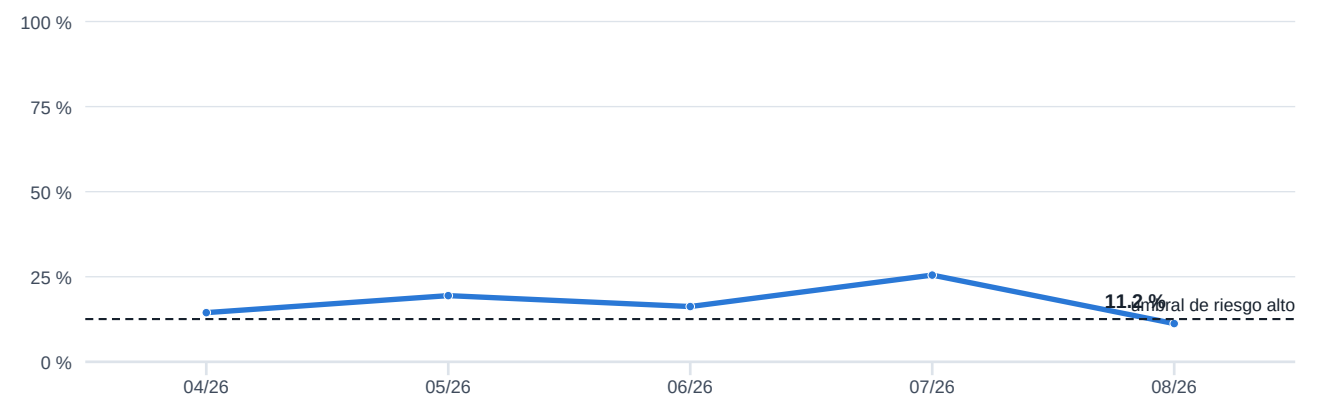

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (5 cortes, del 30/04/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.51 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.425
El 8 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.178
Departamento: Loreto	Características de la obra		+0.174
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.096
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 1,842,090	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.090
Extensión media de los asientos recientes: 1,011 caracteres	Contenido de los asientos		-0.070
Hubo registros en el cuaderno 20 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.067
16 asientos de respuestas a consultas en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.053

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	11.2 %	10.7 %	-0.5 pp
Absolver todas las consultas pendientes	11.2 %	11.1 %	-0.2 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	11.2 %	11.5 %	+0.3 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 294 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 31/08/2026

SE COMUNICA ELEVACION DE CONSULTA N°20 A LA ENTIDAD, SOLICITANDO LA ABSOLUCION DE CONSULTA Y/O PRONUNCIAMIENTO: Se comunica a la residencia que de fecha 31 de agosto del 2026 mediante Carta N°075-2026-CSGYG-RC-WAPV se elevo a la ENTIDAD la opinion tecnica de supervision y asimismo se solicito la absolucion de la consulta N°20. Por lo tanto, se hace de conocimiento para que pueda controlar sus plazos establecidos en e...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 283 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 25/08/2026

... en el cual se le comunica todos los posibles riesgo que esta generando la falta de absolucion y/o pronunciamiento por parte de la entidad edil, respecto a la consulta n09. el cual viene generando el atraso en la falta de fabricacion de las bancas de madera, debido a que no se cuenta con la aclaracion correspondiente a la incompatibilidad mostrada en el expediente tecnico. se adjunta la carta remitida ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 278 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

...ar los trabajos en frentes o zonas techadas que no representen peligro para los trabajadores. se le recuerda al ejecutor que debera cuantificar de manera exacta las horas muertas y el impacto de este retraso climatologico sobre la ruta critica del calendario de avance de obra vigente, registrando su propio asiento de constatacion e inicio de causal para los fines contractuales que correspondan, en estri...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 278 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

CONSTATACIÓN DE FUERTE PRECIPITACIÓN PLUVIAL Y AFECTACIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN OBRA: Se suscribe el presente asiento con la finalidad de dejar constancia técnica de que el día de hoy, 24 de agosto de 2026, desde tempranas horas de la mañana, se viene registrando una fuerte precipitación pluvial de gran intensidad sobre la ciudad de Yurimaguas. Este fenómeno climatológico exógeno y de fuerza mayor ha afe...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 252 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 10/08/2026

...69, esta supervision emite opinion favorable y autoriza al contratista proceder con la inmediata adquisicion de los materiales y la correspondiente ejecucion de los trabajos optimizados, evitando asi retrasos en el programa de ejecucion de la obra.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 245 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 06/08/2026

... vigas en administracionencofrado de columnas en tanque elevadoalbanileria en cuarto electrico y almacenarrajeo en columnas del polideportivocimentacion de sshh en polideportivose informa que existe demora de parte de electroriente en la respuesta al pedido de conexion electrica definitiva. se recomienda alertar a la entidad para que apoye en esta gestion.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 228 · Valorizaciones y metrados · SOEC_SPV · 31/07/2026

VERIFICACION DE METRADOS EJECUTADOS DURANTE EL MES DE JULIO Y SOLICITUD DE PRESENTACION DE TODA LA DOCUMENTACION RESPECTO A LA VALORIZACION N°04: El día de hoy se ha verificado los metrados ejecutados durante el mes de julio del 2026, junto con el contratista, el cual se ha constatado todos los metrados indicados por el residente de obra en su asiento 225. Por lo tanto, se indica al contratista presentar dentro de lo...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
