


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación para la ejecución de la obra creacion del servicio de movilidad urbana en las calles del sector enci mz s, t, u del distrito de pimentel de la provincia de chiclayo del departamento de lambayeque con CUI N° 2628394

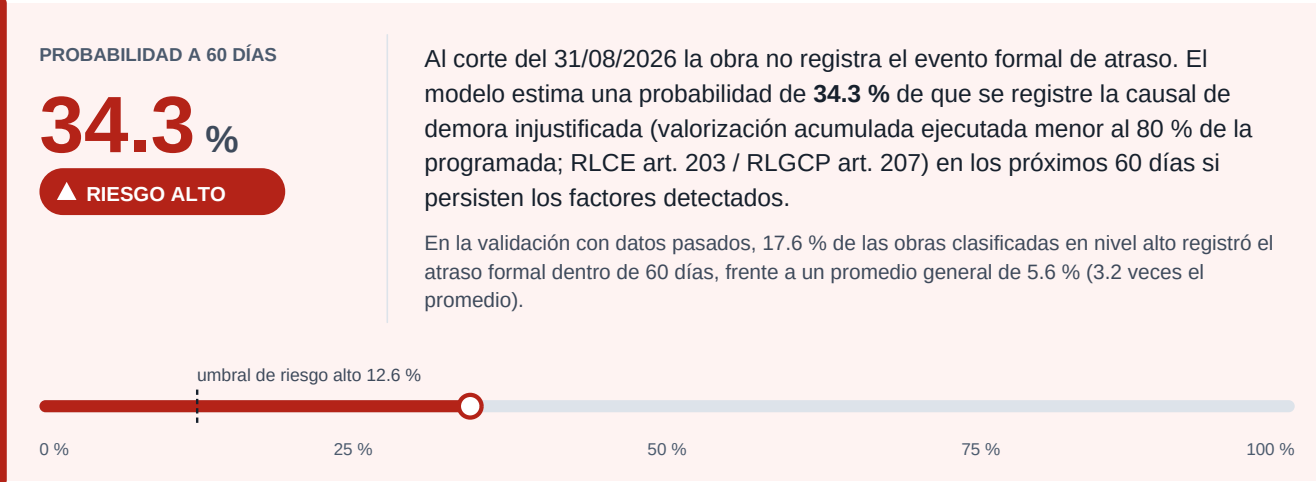

MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	127 desde 13/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DEL SECTOR ENCI MZ S, T, U DEL DISTRITO DE PIMENTEL DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CON CUI N° 2628394
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL
Contratista	CONSORCIO GRAU
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	PIMENTEL / CHICLAYO / LAMBAYEQUE
Código Único de Inversión (CUI)	2628394
Inversión asociada	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DEL SECTOR ENCI MZ S, T, U DEL DISTRITO DE PIMENTEL DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2407192
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 3,708,770.57
Cuaderno de obra digital	127 asientos entre 13/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días



Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.59 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.662
Departamento: Lambayeque	Características de la obra		+0.264
El 10 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.236
El 56 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.231
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.157
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona la regla del 80 % o un calendario acelerado	Contenido de los asientos		+0.112
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.106
Hubo registros en el cuaderno 23 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.086

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	34.3 %	34.0 %	-0.3 pp
Absolver todas las consultas pendientes	34.3 %	34.3 %	+0.0 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	34.3 %	34.3 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 124 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 31/08/2026

...de la partida de concreto de pavimento rigido, por el adicional de los dowels de 5/8. afectando la ruta critica y programacion de los trabajos, por causas no imputables al contratista, siendo esto un atraso justificado de las partidas mencionadas. se verifico en campo los trabajos conjuntamente con el supervisor de obra conciliando metrados de los trabajos ejecutados del mes de agosto, para elaborar la ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 127 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/08/2026

...utar en su totalidad las partidas de pavimento rigido debido a la espera del adicional de obra n. 01 y deductivo vinculante n. 01, senalando que dicha situacion afecta la ruta critica y constituye un atraso justificado por causas no imputables al contratista, esta supervision deja constancia de lo siguiente: -se toma conocimiento de lo manifestado, sin embargo, corresponde al contratista delimitar y sus...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 111 · Ejecución de mayores metrados · SOEC_SPV · 27/08/2026

...zonas donde la subrasante no haya sido ensayada, a fin de permitir que el laboratorio de la supervision efectue las pruebas de compactacion obligatorias (conforme a las normas astm d1556 / mtc). todo retraso derivado de esta subsanacion sera de exclusiva responsabilidad del contratista. -reservar y postergar el pronunciamiento para las partidas cama de arena gruesa para asentado del block grass y suminis...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 96 · Participación de profesionales adicionales al personal clave · SOEC_SPV · 21/08/2026

...alle especificos y la justificacion tecnica/causal correspondiente para cada una de las tres prestaciones. asimismo, debera demostrarse tecnicamente que la acumulacion no genera impactos negativos ni retrasos en la ruta critica del proyecto de pistas y veredas. -por lo tanto, se consiente el planteamiento formulado en el asiento n 94 y se exhige al contratista proceder con la entrega inmediata del expedi...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 65 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS: -Se verifica charlas de seguridad impartiendo a todo el personal técnico y obrero el uso de los equipos de protección personal y se cuenta con las señalizaciones en obra. -Se verifica la instalación de señalización temporal en la zona de trabajo. -Se continua con los trabajos de nivelación de cajas de agua y desagüe en las calles 07 y calle 08. -Se continua con el corte a nivel de s...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 65 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

...ta su opinion tecnica correspondiente y sea remitido a la entidad segun lo establecido en el reglamento de la ley n 32069. la consulta formulada por el contratista se tiene por no presentada debido al incumplimiento material de lo establecido en el articulo 190 del reglamento de la ley de contrataciones del estado. al haber omitido de forma negligente el informe tecnico correspondiente, el asiento del con...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 56 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 07/08/2026

...edad y recompactar el suelo de manera inmediata. -asimismo, se recuerda al residente no iniciar el tendido, colocacion de material de afirmado sobre las calles y tramos observados mientras persista el incumplimiento de densidad en la subrasante, y ademas que para evaluar la aptitud del material de afirmado de cantera que pretende colocar como estructura de base, debe presentar previamente a esta supervisi...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 35 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 30/07/2026

CONSULTAS REALIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA: -En referencia al Asiento N° 33, mediante el cual el Residente de Obra reitera supuestos impactos en la ruta crítica y futuros atrasos por trabajos no contemplados en el expediente técnico, esta Supervisión cumple con precisar y deslindar responsabilidades bajo el marco normativo vigente: Se ratifica de manera taxativa lo expresado por esta Supervisión en el Asiento N° 31...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 35 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 30/07/2026

...ades bajo el marco normativo vigente: se ratifica de manera taxativa lo expresado por esta supervisión en el asiento n 31. la consulta formulada por el contratista se tiene por no presentada debido al incumplimiento material de lo establecido en el artículo 190 del reglamento de la ley de contrataciones del estado. al haber omitido de forma negligente el informe técnico correspondiente, el asiento del con...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 12 · Calendario de avance de obra valorizado · SOEC_SPV · 16/07/2026

PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMAS AL INICIO DE OBRA Y CALENDARIO CALENDARIO DE PARTICIPACION DE PERSONAL CLAVE POR PARTE DEL CONSORCIO VIAL CENTAURUS: -Se recepciona la CARTA N°04-2026-CVIAL.C/RC de fecha 15/07/2026 en la que el CONSORCIO VIAL CENTAURUS hace llegar a la supervisión de obra el CRONOGRAMA Y PROGRAMACIÓN DE OBRA ACTUALIZADOS A LA FECHA DE INICIO DE OBRA N°01, asimismo CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
