


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación para la ejecución de la obra: Creacion de un campo deportivo e instalacion de juegos infantiles en la asociacion de vivienda 6 de enero, distrito de coronel gregorio albarracin lanchipa - tacna ¿ tacna

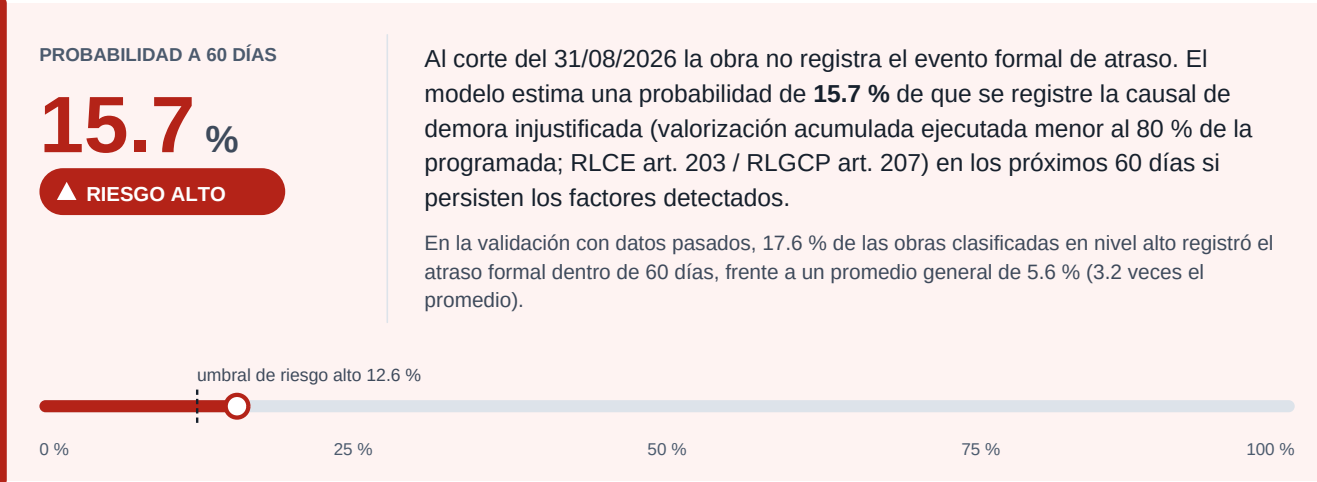


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	60 desde 12/08/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACION DE UN CAMPO DEPORTIVO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 6 DE ENERO, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA ¿ TACNA
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
Contratista	JP CONSTRUCCION & SUMINISTROS S.R.L.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA / TACNA / TACNA
Código Único de Inversión (CUI)	2219059
Inversión asociada	CREACION DE UN CAMPO DEPORTIVO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 6 DE ENERO, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA
Función	CULTURA Y DEPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2388259
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 2,858,415.00
Cuaderno de obra digital	60 asientos entre 12/08/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

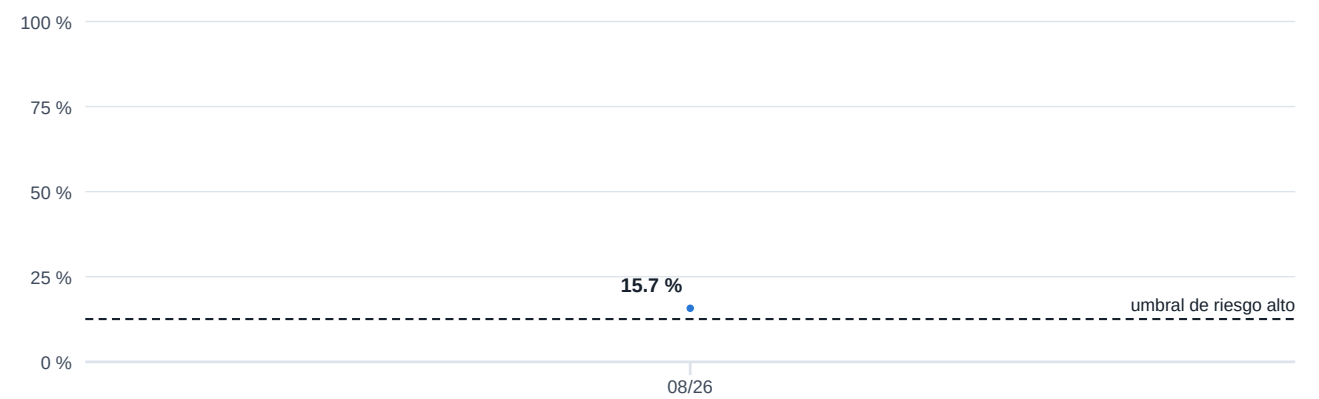

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (1 corte, del 31/08/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.58 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.544
El 10 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.258
Departamento: Tacna	Características de la obra		+0.209
El 8 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.172
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.115
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.57 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.110
Extensión media de los asientos recientes: 957 caracteres	Contenido de los asientos		-0.058
60 asientos registrados en los últimos 30 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.054

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	15.7 %	15.7 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 59 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 31/08/2026

...iene cumpliendo con los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo segun normativas vigente, a cargo del especialista correspondiente, por lo que se viene controlando el riesgo.r-012 riesgos por retrasos e incumplimientos de cronogramas (prioridad alta)en la semana transcurrida se conto los materiales correspondientes para ejecutar las diferentes partidas, para dar cumplimiento a la programacion, p...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 59 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 31/08/2026

...endo con los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo segun normativas vigente, a cargo del especialista correspondiente, por lo que se viene controlando el riesgo.r-012 riesgos por retrasos e incumplimientos de cronogramas (prioridad alta)en la semana transcurrida se conto los materiales correspondientes para ejecutar las diferentes partidas, para dar cumplimiento a la programacion, por lo que se...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 35 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 25/08/2026

RECOMENDACION PREVIAS AL INFORME COMPLEMENTARIO DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO (BASE GRANULAR): EN ATENCIÓN AL ASIENTO N° 30 DEL RESIDENTE, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA APROBACIÓN DEL MATERIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA 01.02.02.01.03 CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR E INCORPORA ENSAYOS COMPLEMENTARIOS, ESTA INSPECCIÓN COMUNICA QUE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REMITIDA EVIDENCIA RESULTADOS TÉCNICAMENTE FAV...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 33 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 24/08/2026

...iene cumpliendo con los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo segun normativas vigente, a cargo del especialista correspondiente, por lo que se viene controlando el riesgo.r-012 riesgos por retrasos e incumplimientos de cronogramas (prioridad alta)en la semana transcurrida se conto los materiales correspondientes para ejecutar las diferentes partidas, para dar cumplimiento a la programacion, p...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 33 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 24/08/2026

...endo con los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo segun normativas vigente, a cargo del especialista correspondiente, por lo que se viene controlando el riesgo.r-012 riesgos por retrasos e incumplimientos de cronogramas (prioridad alta)en la semana transcurrida se conto los materiales correspondientes para ejecutar las diferentes partidas, para dar cumplimiento a la programacion, por lo que se...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 15 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 18/08/2026

...a que dichos trabajos de remocion de tierras deben ejecutarse obligatoriamente con la presencia ininterrumpida y direccion tecnica del arqueologo lic. luis fernando bejar luksic (coarpe n 041198). el incumplimiento de esta disposicion sera causal inmediata de paralizacion de la partida por parte de esta inspeccion, asumiendo la contratista los atrasos y penalidades que de ello se deriven

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 17 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 18/08/2026

RESPECTO A INFORME TÉCNICO SOLICITADO DE LA CONSULTA N°01-BASE GRANULAR: EN ATENCION A LO SOLICITADO POR PARTE DEL INSPECTOR DE OBRA EN EL ASIENTO N°08, EN DONDE INDICA LA PRESENTACIÓN DE UN INFORME TÉCNICO DE LA CONSULTA N°01 REALIZADA POR PARTE DEL CONTRATISTA, EL SUSCRITO SEÑALA QUE, MEDIANTE CARTA N°019-2026-CIO.HERMES DE FECHA 17.08.2026 SE PRESENTO EL INFORME TÉCNICO SOLICITADO, A FIN DE CONTINUAR CON EL PROCED...

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 15 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 18/08/2026**

...lic. luis fernando bejar luksic (coarpe n 041198). el incumplimiento de esta disposicion sera causal inmediata de paralizacion de la partida por parte de esta inspeccion, asumiendo la contratista los atrasos y penalidades que de ello se deriven

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 18 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 18/08/2026**

... recuerda al residente de obra la obligatoriedad de contar con la presencia del arqueologo monitor previo a cualquier movimiento de tierras (r-007), y se dispone el seguimiento continuo del riesgo de incumplimiento de pagos a trabajadores (r-016) en las siguientes valorizaciones, debiendo el contratista continuar informando semanalmente la evolucion de la matriz de riesgos en cumplimiento de la ley n3206...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 10 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 17/08/2026**

...ifico algun cambio normativo, asimismo, se viene aplicando las normativas vigentes y establecidas para los diferentes procedimientos, en ese contexto, se viene controlando el riesgo.r-012 riesgos por retrasos e incumplimientos de cronogramas (prioridad alta)en la semana transcurrida se conto los materiales correspondientes para ejecutar las diferentes partidas, para dar cumplimiento a la programacion, p...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
