


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

ejecución de la obra, creación de la ciclovía en la AV. Principal surquillo, del distrito de surquillo, provincia de lima, departamento de lima, con CUI Nro. 2525692,

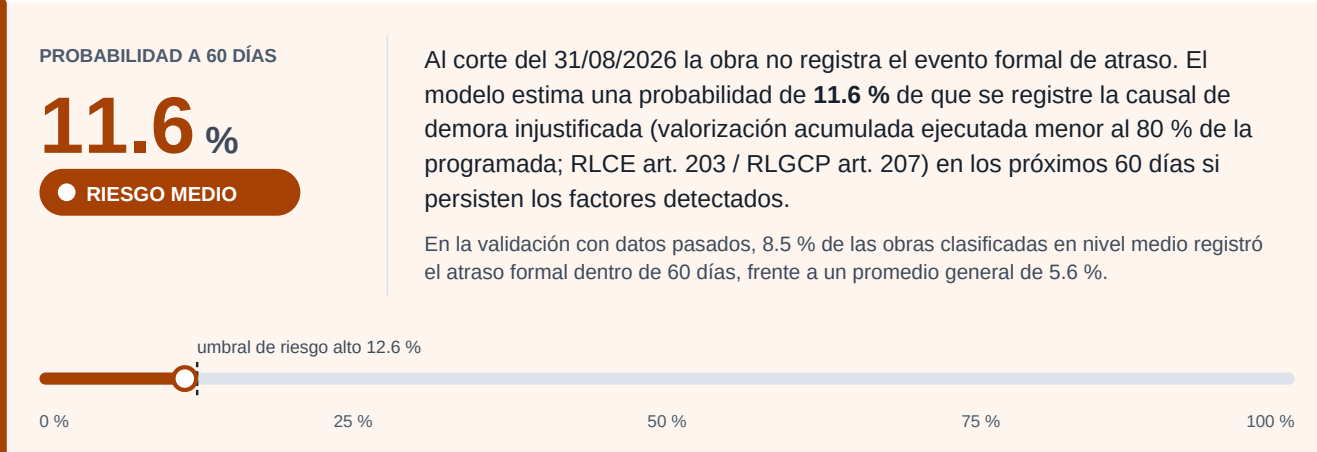


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	192 desde 29/04/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCIÓN DE LA OBRA, CREACIÓN DE LA CICLOVÍA EN LA AV. PRINCIPAL SURQUILLO, DEL DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI Nro. 2525692,
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Contratista	C.V. CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.C.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	SURQUILLO / LIMA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2525692
Inversión asociada	CREACION DE LA CICLOVÍA EN LA AV. PRINCIPAL, SURQUILLO DEL DISTRITO DE SURQUILLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2381776
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 931,261.75
Cuaderno de obra digital	192 asientos entre 29/04/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

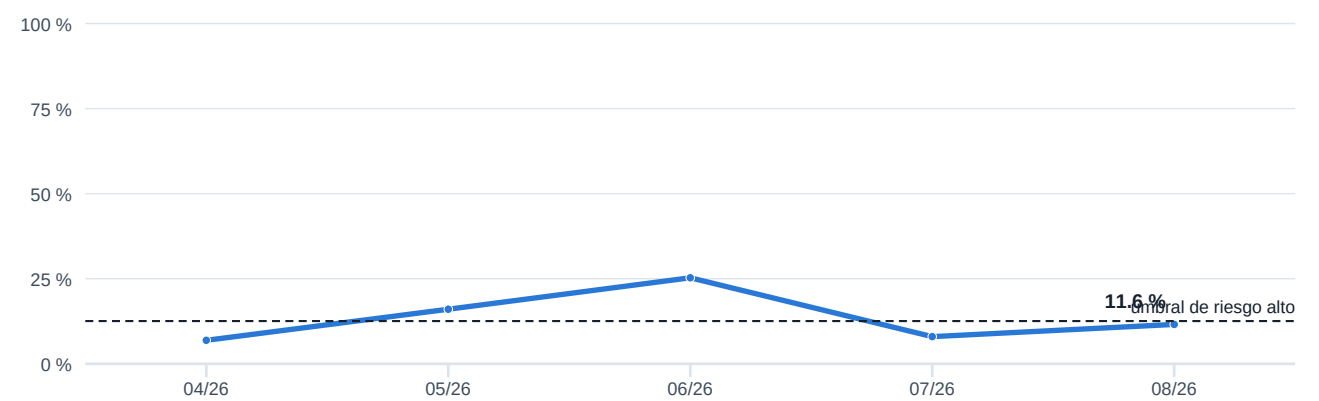

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (5 cortes, del 30/04/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.47 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.242
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.191
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.153
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.136
Entidad contratante: otra entidad pública	Características de la obra		+0.131
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.109
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.089
Registros del último mes: 0.67 veces el promedio mensual del trimestre	Actividad del cuaderno de obra		-0.071

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	11.6 %	11.3 %	-0.3 pp
Absolver todas las consultas pendientes	11.6 %	12.1 %	+0.5 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

- Asiento N.º 184 · Consultas · SOEC_SPV · 21/08/2026**

PRONUNCIAMIENTO SOBRE CONSULTA 13: Sobre la consulta 13 sobre el pedido de cambio del material segregador tipo oruga por falta de suministro en Perú, la supervisión recibe el pronunciamiento de la Entidad, en la fecha que se suscribe este asiento, dando la aprobación y conformidad a la propuesta brindada por la contratista ejecutora, que también fue ratificada por esta Supervisión, por lo que se adjunta y comunica a...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 170 · Participación del personal clave · SOEC_RESI · 06/08/2026**

cambio de residente . con fecha 30 de julio de 2026, se notifica mediante carta n doo3509-2026 mml-gmu-scf, la aprobacion del cambio de residente, mi persona: ing cesar vargas zuniga, con cip 54911, quien remplaza al i...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 169 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 01/08/2026**

...decio trabajos de limpieza, pintura en sardineles y finalizacion de la construccion de las bancas del proyecto.se solicita al residente de obra continuar con la ejecucion de las partidas y no caer en retrasos injustificados.

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 157 · Consultas · SOEC_SPV · 11/07/2026**

PROCEDENTE DE CONSULTA N°13 PROPUESTA DE SOLUCION MIXTA DE SEGREGACIÓN FISICA MEDIANTE CANALIZADORES TIPO ORUGA Y SARDINEL DE SEGREGACIÓN PROPUESTO (0.20 X 0.15 M): VISTO EL ASIENTO N°112, Y N°113, POR EL CONTRATISTA, SOBRE EVALUACION EN CUANTO A CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ES NECESARIO MANIFESTAR LO SIGUIENTE.- QUE TODA MODIFICACION GRAFICA, PRESUPUESTAL, O´ LO QUE CORRESPONDA, POR LA NATURALEZA DE LOS HECHOS ES PA...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 156 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 11/07/2026**

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 - CONFIGURACIÓN DEL SUPUESTO PREVISTO EN EL NUMERAL 198.4 DEL ARTÍCULO 198 DEL RLCE: En la fecha, esta Residencia deja constancia que mediante Carta N° 098-2026-CVC se presentó oportunamente la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, sustentada en una causal no atribuible al Contratista, cumpliéndose con el procedimiento, requisitos y documentación establecidos en el artículo 19...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 157 · Consultas · SOEC_SPV · 11/07/2026**

...a la autoridad a hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto administrativo por encima de los formalismos simples. las entidades deben remover obstaculos formales, evitar dilaciones o retrasos y sanear irregularidades para asegurar que el proyecto se ejecute (1.1. principio de legalidad, 1.2. principio de debido procedimiento).por lo tanto, (01) declarase que el informe n020-2026-jjcc/av...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
