


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

ejecucion de la obra: Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en las principales calles de la localidad de nuevo lima del distrito de bajo biavo - provincia de bellavista - departamento de san martin, CUI N° 2609039.

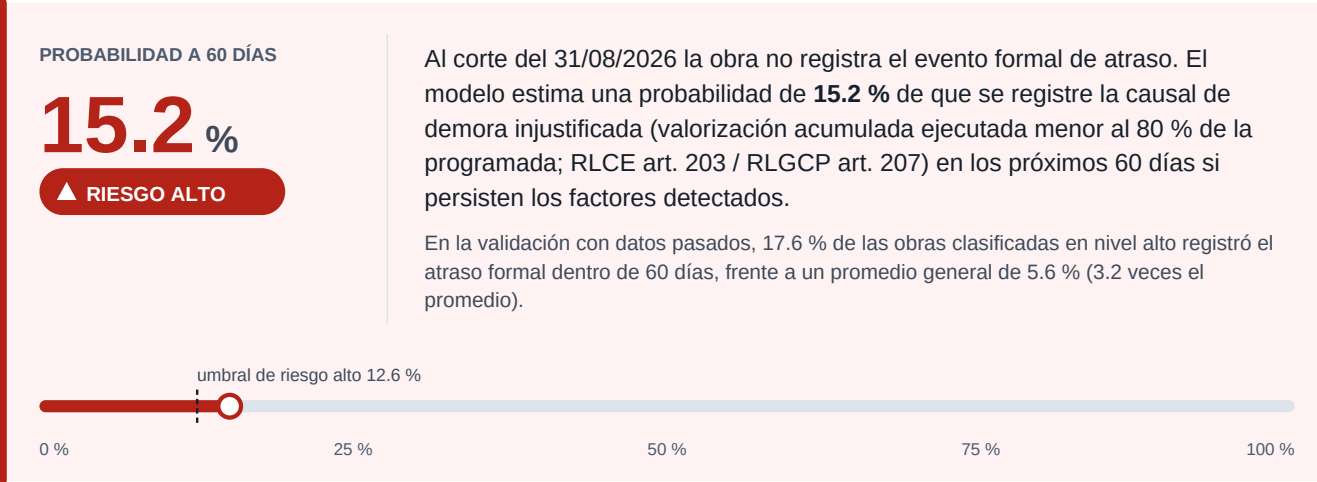


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	56 desde 10/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE NUEVO LIMA DEL DISTRITO DE BAJO BIAVO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, CUI N° 2609039.
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAJO BIAVO
Contratista	CONSORCIO SAN PEDRO
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	BAJO BIAVO / BELLAVISTA / SAN MARTIN
Código Único de Inversión (CUI)	2609039
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE NUEVO LIMA DEL DISTRITO DE BAJO BIAVO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2400033
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 8,669,895.61
Cuaderno de obra digital	56 asientos entre 10/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

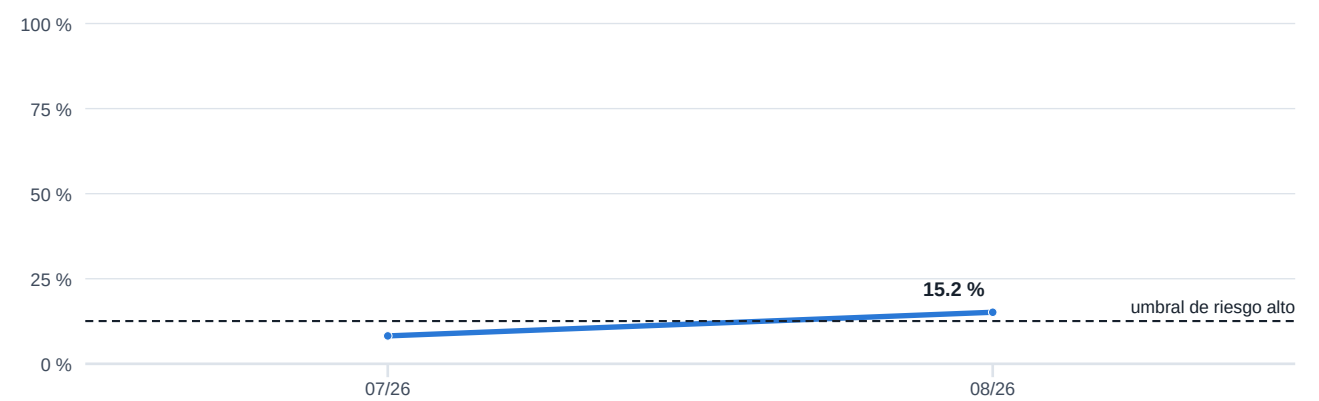

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.73 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.588
El 14 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.270
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.169
3 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.156
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.69 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.122
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.109
Hubo registros en el cuaderno 18 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.071
Extensión media de los asientos recientes: 1,117 caracteres	Contenido de los asientos		-0.070

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	15.2 %	15.0 %	-0.2 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 54 · Órdenes · SOEC_SPV · 31/08/2026

AUTORIZACION DE VACIADO DE MUROS DE CUNETAS: La Supervisión informa, que una vez realizado la verificación correspondiente del encofrado, se autorizo al Contratista, el vaciado de concreto $f'c=175 \text{ kg/cm}^2$, en los muros de las cunetas de evacuación y componentes de drenaje pluvial del lado izquierdo de las calles 01, 02 y 03 del Jr. Víctor Manuel Arévalo. Esta comunicación se realiza en respuesta a lo mencionado por el...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 32 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 07/08/2026

...calle 1. es importante senalar y precisar, que a la fecha, de acuerdo a la programacion de obra, los trabajos de replanteo topografico se encuentran en ejecucion, desde el 10.07.2026, por lo que todo retraso que pudiera existir es atribuible enteramente al contratista, en vista a la demora en la presentacion de los planos propiamente dichos, prueba de ello, es que recien el ida 05.08.2026, presentaron e...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 26 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 06/08/2026

...do publico ubicados dentro del area de intervencion proyectada.dicha comunicacion tuvo por finalidad prevenir afectaciones a la infraestructura existente, riesgos para el personal y equipos, asi como retrasos durante la ejecucion de las partidas de movimiento de tierras, conformacion de subrasante y demas trabajos previstos en el expediente tecnico.sin perjuicio de lo anterior, y en cumplimiento de lo s...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 23 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 06/08/2026

...nto sea emitido con la oportunidad necesaria, considerando que la falta de definicion del trazo y la imposibilidad de intervenir en el sector afectan la programacion de los trabajos y podrian generar retrasos no atribuibles al contratista.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 20 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 05/08/2026

...cho a reclamar mayores gastos generales ni ampliaciones de plazo. por lo expuesto, se insta al residente de obra a cenirse estrictamente a los procedimientos tecnicos contractuales establecidos, bajo apercibimiento de remitir un informe especial a la entidad reportando el deficiente desempeno del personal clave, que se encuentra ejecutando la obra.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 17 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 04/08/2026

... que resulta necesario definir tecnicamente el tratamiento que debiera adoptarse respecto de esta interferencia, a fin de evitar afectaciones a la infraestructura existente, riesgos para el personal y retrasos en la ejecucion de la obra.en ese sentido, se solicita al supervisor de obra emitir el pronunciamiento tecnico correspondiente, disponiendo las acciones que resulten pertinentes y, de ser el caso, ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 14 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 02/08/2026

SOBRE EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN OBRA: Respecto a lo manifestado por el Contratista en el Asiento N° 11 de fecha 31.07.2026, se le informa que en vista que todavía no se ha presentado a la Supervisión, los planos de replanteo topográfico para su revisión correspondiente, a la fecha, la Supervisión no autorizó la ejecución de trabajos de habilitación de acero de refuerzo $FY= 4200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60, en ese sentido, estos t...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 13 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 02/08/2026

SOBRE EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN OBRA: Respecto a lo manifestado por el Contratista en el Asiento N° 10 de fecha 27.07.2026, la Supervisión informa que se pudo verificar que en campo se concluyo con los trabajos de replanteo topográfico, por lo que se esta a la espera de la información impresa y de gabinete para realizar el análisis correspondiente de los trabajos a ejecutar en obra. Se llama la atención al Contratist...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 8 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/07/2026

RESPECTO A LA LLEGADA DE MATERIALES A OBRA Y LA FALTA DE REPLANTEO TOPOGRÁFICO: Se pone en conocimiento al Residente de Obra, que hasta la fecha, no se ha recibido de manera formal, ni informal, ningún certificado de calidad y/o ficha técnica de material alguno, que se pretende utilizar en obra. En ese sentido, se pone de manifiesto, que bajo su cuenta y riesgo se esta empezando a trasladar materiales a obra, sin el ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
