


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecucion de la obramejoramiento del servicio de movilidad urbana en vías locales del JR. Arica cuadras 05 al 11, JR. Luis linares cuadras 06 al 13, JR. Dos de mayo cuadras 11 al 13, JR. Andrés mori cuadra 04, JR. Tacna cuadras 10 al 13, JR. A. Grau cuadras 10 y 11, JR. Faustino maldonado cuadras 10 al 12, JR. Bolognesi cuadras 10 y 11, JR. Matilde del águila cua-dras 08 al 09 y pasaje arica cuadra 01, de la ciudad de rioja, distrito de rioja de la provincia de rioja del departamento de san m

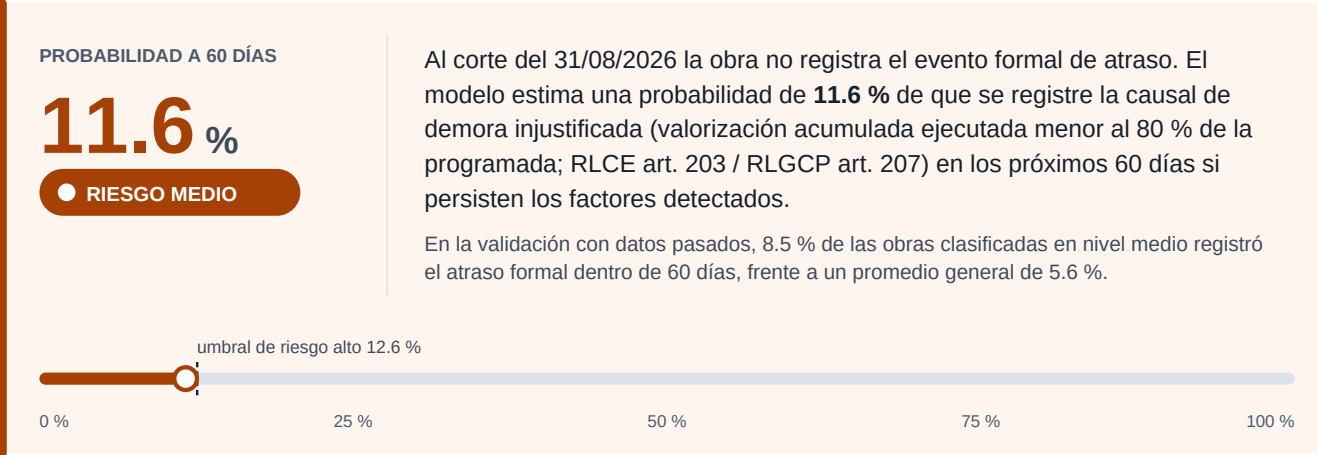

MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	136 desde 13/05/2026	28/08/2026


01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCION DE LA OBRAMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VÍAS LOCALES DEL JR. ARICA CUADRAS 05 AL 11, JR. LUIS LINARES CUADRAS 06 AL 13, JR. DOS DE MAYO CUADRAS 11 AL 13, JR. ANDRÉS MORI CUADRA 04, JR. TACNA CUADRAS 10 AL 13, JR. A. GRAU CUADRAS 10 Y 11, JR. FAUSTINO MALDONADO CUADRAS 10 AL 12, JR. BOLOGNESI CUADRAS 10 Y 11, JR. MATILDE DEL ÁGUILA CUA-DRAS 08 AL 09 Y PASAJE ARICA CUADRA 01, DE LA CIUDAD DE RIOJA, DISTRITO DE RIOJA DE LA PROVINCIA DE RIOJA DEL DEPARTAMENTO DE SAN M
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA
Contratista	CONSORCIO BASCA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	RIOJA / RIOJA / SAN MARTIN
Código Único de Inversión (CUI)	2619826
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DEL JR. ARICA CUADRAS 05 AL 11, JR. LUIS LINARES CUADRAS 06 AL 13, JR. DOS DE MAYO CUADRAS 11 AL 13, JR. ANDRES MORI CUADRA 04, JR. TACNA CUADRAS 10 AL 13, JR. A. GRAU CUADRAS 10 Y 11 , JR. FAUSTINO MALDONADO CUADRAS 10 AL 12, JR. BOLOGNESI CUADRAS 10 Y 11, JR. MATILDE DEL AGUILA CUADRAS 08 AL 09 Y PASAJE ARICA CUADRA 01, DE LA CIUDAD DE RIOJA, DISTRITO DE RIOJA DE LA PROVINCIA DE RIOJA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Función	TRANSPORTE

Identificador del contrato (SEACE)	2368641
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 9,345,131.95
Cuaderno de obra digital	136 asientos entre 13/05/2026 y 28/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

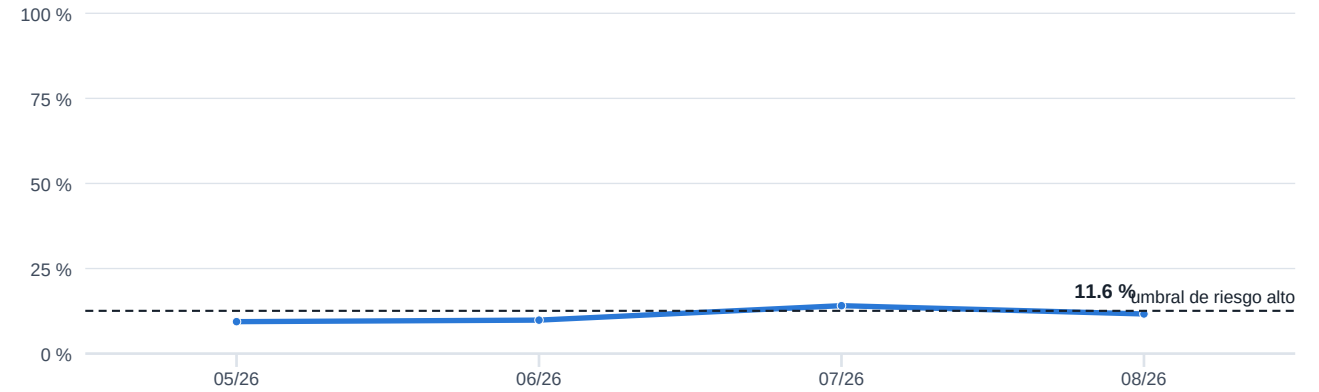

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (4 cortes, del 31/05/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.53 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.436
El 8 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.196
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona la regla del 80 % o un calendario acelerado	Contenido de los asientos		+0.113
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 2,158,761	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.106
Departamento: San Martín	Características de la obra		+0.101
El último asiento se registró hace 3 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.091
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.080
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.58 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.067

04

Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	11.6 %	11.1 %	-0.5 pp
Absolver todas las consultas pendientes	11.6 %	11.5 %	-0.2 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	11.6 %	11.6 %	+0.0 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	11.6 %	11.6 %	+0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	11.6 %	11.9 %	+0.3 pp

05

Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 131 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 25/08/2026 <i>...de ejecucion de obra vigente, al imposibilitar durante toda la jornada el desarrollo de las actividades programadas.finalmente, al termino de la presente jornada se registra el cierre de la causal de atraso y/o paralizacion iniciada el 24 de agosto de 2026, dejandose establecido que su periodo de incidencia comprende los dias 24 y 25 de agosto de 2026. la reanudacion de los trabajos se efectuara previa...</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 128 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 24/08/2026 <i>...es estables para su correcta ejecucion. este evento no es atribuible al contratista y se esta afectando la ruta critica del programa de ejecucion vigente.se deja constancia del inicio de la causal de atraso y/o paralizacion por precipitaciones pluviales, la cual permanecera vigente mientras persistan la saturacion y las condiciones inadecuadas del suelo. su culminacion sera registrada cuando el terreno...</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 129 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 24/08/2026 <i>...iene tuberias superficiales de red matriz de agua no se puede intervenir por que no es parte del contrato y esta supervision no puede exigir realizar dicho trabajo, por lo que se tiene un riego de un retraso eminente en la obra y dicha causal es ajena a la voluntad del contratista se hace de conocimiento mediante cuaderno de obra a la entidad ya que no se tendra un avance en la obra sin antes realizar t...</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 110 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 12/08/2026 <i>CONTINUIDAD DE PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR EVENTOS AJENOS AL CONTRATISTA: esta supervisión constata que las precipitaciones pluviales de baja a mediana intensidad continuaron el día de hoy y que la causa de este evento (lluvia) es la saturación del terreno de fundación por lo que no se pudo trabajar las tareas programadas el día de hoy que indica el cronograma aprobado, y que afecta a las siguientes partidas de l...</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 89 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 22/07/2026 <i>RESPUESTA A CONSULTA: esta supervisión indica que mediante CARTA N° 028-2026-CSR/RC/VMIDV, CARTA N° 030-2026-CSR/RC/VMIDV, se remitió tanto a la municipalidad provincial de Rioja y al CONSORCIO BASCA la respuesta a la consulta sobre el replanteo de la rasante del jr. Almirante Grau cdra. 11 y Psje. Arica cdra. 01, así también se indica que mediante CARTA N° 030-2026-CSR/RC/VMIDV, se traslado la consulta a la Municipa...</i> Fuente: cod-asientos202607.csv

- Asiento N.º 84 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 20/07/2026**

...entidad contratante no cumplen con lo señalado en el numeral precedente y no absuelven las consultas, el contratista puede solicitar ampliación de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora, la cual se computa desde la fecha en la que la falta de ejecución de los trabajos materia de la consulta genere impacto en la ruta crítica del programa de ejecución vigente.... por lo que esta super...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 77 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 13/07/2026**

...iente tecnico.ante esta situacion, por decision tecnica propia del contratista, se dispuso la ejecucion de calicatas de verificacion y ensayos de laboratorio, obteniendose valores de cbr de 3.60 %, 4.80 % y 4.30 %, respectivamente, que evidencian una baja capacidad de soporte del terreno natural.en consecuencia, se deja constancia de que no resulta tecnicamente recomendable continuar con la colocacion...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 75 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 10/07/2026**

RESPUESTA A CONSULTA REALIZADA: Esta supervisión hace mención que mediante CARTA N° 039-2026-BASCA/RC e INFORME N° 024-2026-CB-RO/RSY le presentan a esta supervisión un informe técnico donde se sustenta la necesidad de considerar muro de contención, sardinel y relleno con material propio seleccionado en el jr. Arica cdra. 05, para lo que esta supervisión indica lo siguiente, que si es de necesidad realizar dichos tra...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
