


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación para la ejecución de obra: Mejoramiento de los servicios de espacios públicos urbanos en el parque del C.P. San Juan de dios distrito de aucallama de la provincia de huaral del departamento de lima, con CUI: 2705690

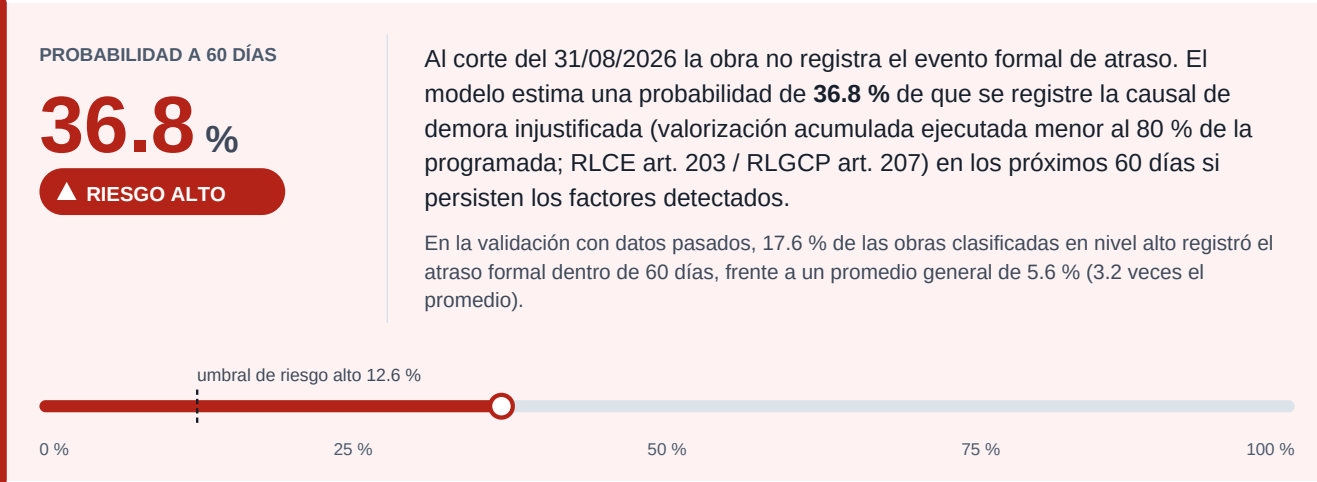


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	92 desde 24/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE DEL C.P. SAN JUAN DE DIOS DISTRITO DE AUCALLAMA DE LA PROVINCIA DE HUARAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI: 2705690
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA
Contratista	CONSORCIO CHUNA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	AUCALLAMA / HUARAL / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2705690
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE DEL C.P. SAN JUAN DE DIOS DISTRITO DE AUCALLAMA DE LA PROVINCIA DE HUARAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
Función	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Identificador del contrato (SEACE)	2409276
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 816,266.99
Cuaderno de obra digital	92 asientos entre 24/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

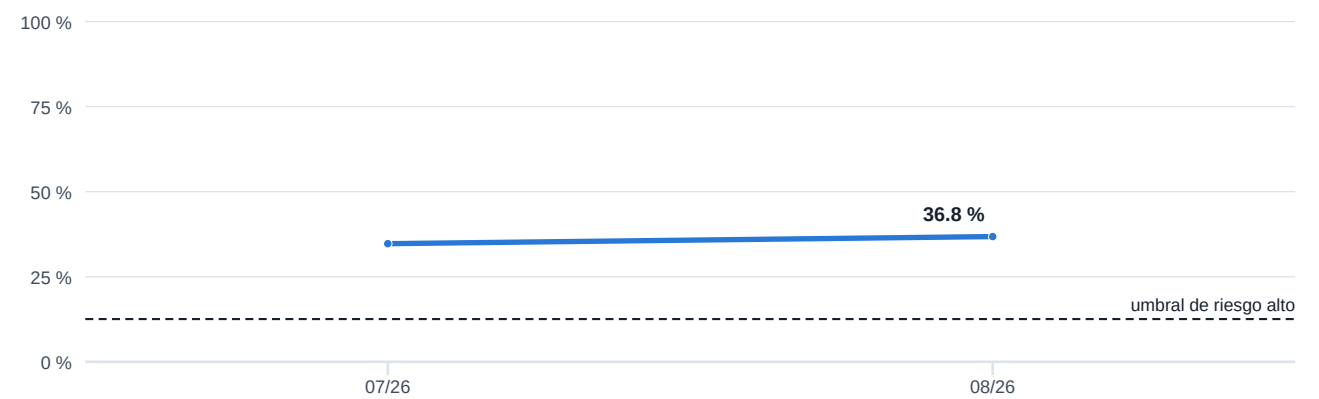

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.59 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.698
El 30 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.283
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.248
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.225
El 59 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.222
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.115
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona la regla del 80 % o un calendario acelerado	Contenido de los asientos		+0.102
2 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.099

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	36.8 %	36.8 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 92 · Valorizaciones y metrados · SOEC_RESI · 31/08/2026

...con la participacion del personal involucrado en las actividades programadas. asimismo, se continuo con el numero de cuadrillas de trabajo, con la finalidad de mantener el ritmo de ejecucion y evitar retrasos en el cronograma. para el desarrollo de las actividades se conto, ademas, con 1 minicargador y 1 cisterna de agua.se dio continuidad a las labores de mantenimiento de las areas verdes.se continuo c...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 90 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 30/08/2026

...con la participacion del personal involucrado en las actividades programadas. asimismo, se continuo con el numero de cuadrillas de trabajo, con la finalidad de mantener el ritmo de ejecucion y evitar retrasos en el cronograma. para el desarrollo de las actividades se conto, ademas, con 1 minicargador y 1 cisterna de agua.se dio continuidad a las labores de mantenimiento de las areas verdes.se continuo c...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 89 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 30/08/2026

...con la participacion del personal involucrado en las actividades programadas. asimismo, se continuo con el numero de cuadrillas de trabajo, con la finalidad de mantener el ritmo de ejecucion y evitar retrasos en el cronograma. para el desarrollo de las actividades se conto, ademas, con 1 minicargador y 1 cisterna de agua.se dio continuidad a las labores de mantenimiento de las areas verdes.se continuo c...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 88 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 30/08/2026

...con la participacion del personal involucrado en las actividades programadas. asimismo, se continuo con el numero de cuadrillas de trabajo, con la finalidad de mantener el ritmo de ejecucion y evitar retrasos en el cronograma. para el desarrollo de las actividades se conto, ademas, con 1 minicargador y 1 cisterna de agua.se dio continuidad a las labores de mantenimiento de las areas verdes.se continuo c...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 15 · Consultas · SOEC_RESI · 26/07/2026

CONSULTA 01,02 Y 03: Fecha: 26/07/2026Al realizar la revisión del expediente técnico y la verificación en campo, se han identificado las siguientes deficiencias, las cuales se detallan a continuación:CONSULTA N.º 01Habiéndose revisado el plano topográfico T-01, se observa que este no consigna un punto referencial tipo BM (Bench Mark) con el cual se haya realizado el levantamiento topográfico, sin embargo, en campo e...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 7 · Calendario de avance de obra valorizado · SOEC_SPV · 24/07/2026

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO: Se solicita al Residente de Obra, entregar el Calendario de Avance de Obra Valorizado, lo cual debe de guardar congruencia con el Programa de Ejecución de Obra (CPM), dentro de los plazos establecidos, con la finalidad de evitar aplicar las penalidades respectivas.

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 10 · Órdenes · SOEC_SPV · 24/07/2026

ÓRDENES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Se indica al Residente de Obra de cumplir con las siguientes acotaciones que se mencionan a continuación:- Todo el personal de Obra deberá laborar con Equipo Básico de Protección Personal (EPP).- El Contratista deberá de contar con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal y vehicular.- El Contratista deberá cumplir con ejecutar su prestación con el Personal Clav...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 7 · Calendario de avance de obra valorizado · SOEC_SPV · 24/07/2026

...r el calendario de avance de obra valorizado, lo cual debe de guardar congruencia con el programa de ejecucion de obra (cpm), dentro de los plazos establecidos, con la finalidad de evitar aplicar las penalidades respectivas.

Fuente: cod-asientos202607.csv

- Asiento N.º 6 · Programa de ejecución de obra - CPM · SOEC_SPV · 24/07/2026**

...rograma de ejecucion de obra cpm . se solicita al residente de obra, entregar el programa de ejecucion de obra (cpm), acorde al plazo y fecha de inicio de obra, con la finalidad de evitar aplicar las penalidades indicadas en las bases integradas del proceso y el contrato.

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 5 · Participación del personal clave · SOEC_SPV · 24/07/2026**

...ave del contratista, vale recalcar que, de modo permanente y directo, los profesionales que conforman el plantel profesional clave deben de encontrarse en obra, con la finalidad de evitar aplicar las penalidades indicadas en las bases integradas del proceso y el contrato.

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
