


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación de la ejecución de la obra: ¿mejoramiento del servicio de agua potable urbano y de alcantarillado en los AA.HH. Faustino sanchez carrión, AA.HH. Los cedros de corpac y AA.HH. Federico basadre del distrito de yarinacocha - provincia de coronel portillo - departamento de ucalyali¿. CUI N° 2534125

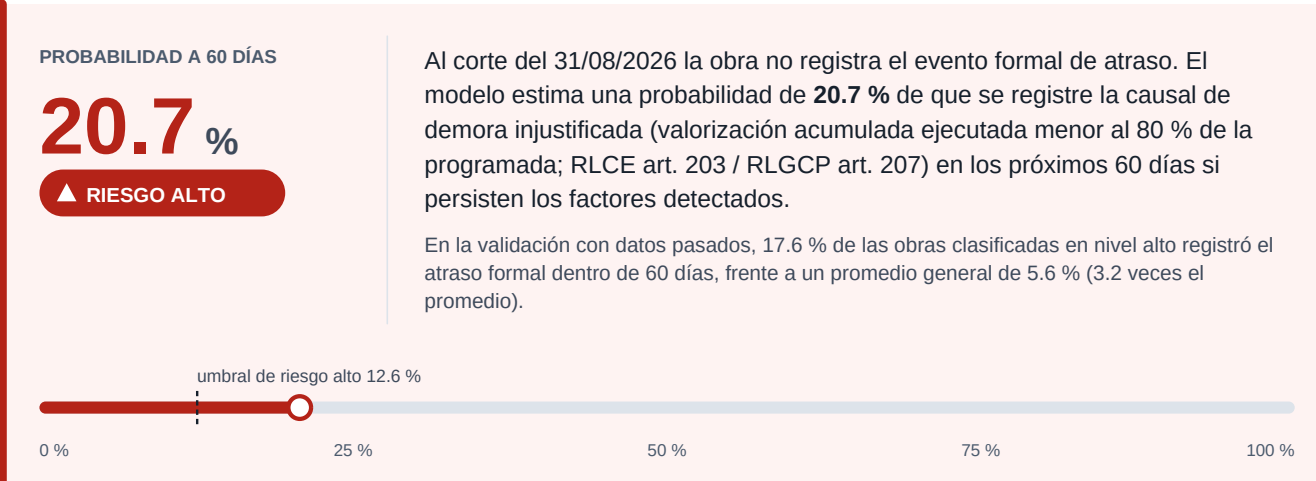

MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	257 desde 07/04/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato


Denominación oficial	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y DE ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. FAUSTINO SANCHEZ CARRIÓN, AA.HH. LOS CEDROS DE CORPAC Y AA.HH. FEDERICO BASADRE DEL DISTRITO DE YARINACOCOA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI¿. CUI N° 2534125
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL
Contratista	CONSORCIO CEDROS
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	YARINACOCOA / CORONEL PORTILLO / UCAYALI
Código Único de Inversión (CUI)	2534125
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y DE ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. FAUSTINO SANCHEZ CARRIÓN, AA.HH. LOS CEDROS DE CORPAC Y AA.HH. FEDERICO BASADRE DEL DISTRITO DE YARINACOCOA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2379352
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 1,767,913.86

Cuaderno de obra digital

257 asientos entre 07/04/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

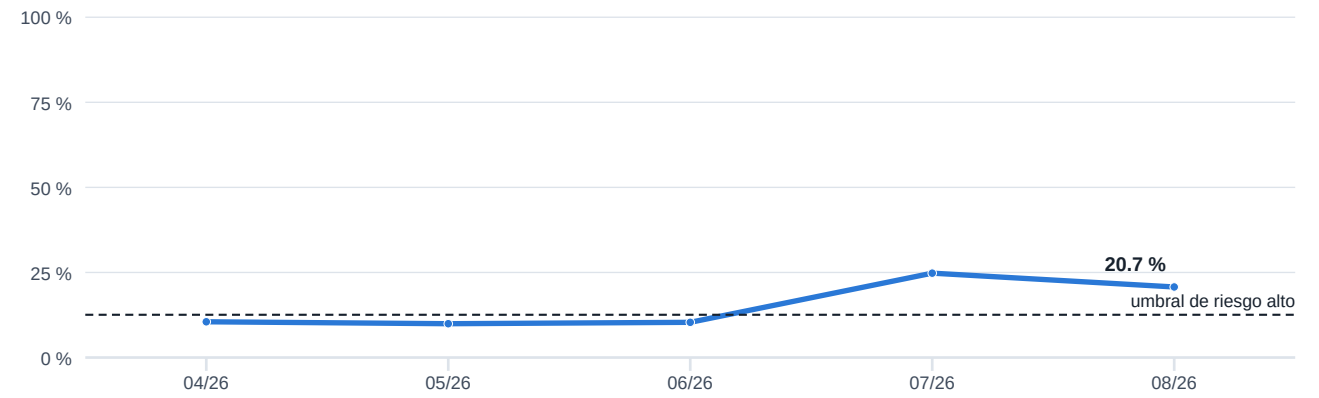

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (5 cortes, del 30/04/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.51 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.585
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.221
El 11 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.216
El 55 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.143
1 asiento de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.130
Hubo registros en el cuaderno 27 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.124
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.119
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 1,938,347	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.109

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	20.7 %	20.5 %	-0.3 pp
Absolver todas las consultas pendientes	20.7 %	20.7 %	-0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.° 239 · Consultas · SOEC_SPV · 19/08/2026

...las estructuras de los buzones (diamantina)hidraulicas, para continuar con la evaluacion. asimismo, se deja constancia de que dicho pronunciamiento no absuelve la consulta y ademas fue emitido con un atraso de 28 dc, considerando que debio efectuarse el 21/07/26.por lo que se exhorta al contratista a entregar dichas pruebas que garanticen la operatividad estructural de las infraestructuras existentes, ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 238 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 19/08/2026

...las estructuras de los buzones (diamantina)hidraulicas, para continuar con la evaluacion. asimismo, se deja constancia de que dicho pronunciamiento no absuelve la consulta y ademas fue emitido con un atraso de 28 dc, considerando que debio efectuarse el 21/07/26, en tal circunstancia, se considera como una consulta no absuelta a la fecha.el contratista estara remitiendo los estudios solicitados por el ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 216 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 07/08/2026

... asiento n 124 de fecha 26/06/26 sobre los instalacion de los sub colectores comprendido en los. bz 25, bz20, bz19, bz18, bz12 bz 5 bz6 bz 7 calle. jr. cayetano heredia, arborizacion y calle n3, esta demora viene, generando que el contratista, realice trabajos de contingencia en buzones criticos que no tiene continuidad en el sistema, con el fin de evitar aniegos y desborde de aguas servidas, en los pun...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 204 · Valorizaciones y metrados · SOEC_RESI · 02/08/2026

...ratista y supervision, el contratista procede a presentar la valorizacion mes de julio periodo del 01 al 31el cual se tiene un avance programado de 74.42 contra un avance ejecutado 67.56% teniendo un retraso justificado de -4.86% no es necesario presentar una reprogramacion acelerada en vista que el porcentaje del valor acumulado supera el 80% del programado.asi mismo se esta presentando como la valoriz...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 203 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 01/08/2026

...simismo, se constato el cumplimiento de la gestion de la calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (ssoma), correspondientes durante la ejecucion de los trabajos, no habiendose advertido incumplimientos en los aspectos verificados durante la presente jornada

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 194 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 28/07/2026

ATRASO JUSTIFICADO COLECTORES PRIMARIOS: Se deja constancia que a la fecha el contratista no puede ejecutar el tramo principal del colector primario comprendido entre los buzones. bz 25, bz20, bz19, bz18, bz12 bz 5 bz6 bz 7 calle.En asiento N° 124 res. de obra 26/06/26 En asiento N° 126 res. de obra 26/06/26 En asiento N° 127 sup. de obra 27/06/26 En asiento N° 129 res. de obra 27/06/26 Se configura la consulta h...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.° 186 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/07/2026

CUMPLIMIENTO DE GESTION DE CALIDAD/SST/AMBIENTAL: EN LA FECHA SE DEJA CONSTANCIA DE LAS SIGUIENTES ACTUACIONES Y REQUERIMIENTOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA DURANTE LA PRESENTE JORNADA:EN MATERIA AMBIENTAL: MEDIANTE LA CARTA N.° 17-2026-JRRA-CONSULTOR, ESTA SUPERVISIÓN EXHORTA AL CONTRATISTA QUE, PREVIO AL INICIO DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE IMPLIQUE LA AFECTACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS O ÁREAS VERDES , OBTENGA LA AUTORIZAC...

Fuente: cod-asientos202607.csv

- Asiento N.º 186 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/07/2026**

...efinitiva, toda vez que la seguridad del area intervenida forma parte de sus responsabilidades durante la ejecucion de la obra. en materia de calidad: se advierte que el especialista en calidad viene incumpliendo con la presentacion de los protocolos de control y formatos diarios correspondientes a las actividades ejecutadas, documentacion indispensable para verificar la correcta ejecucion de los trabajo...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 175 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/07/2026**

... la consulta para la incorporacion de nuevos beneficiarios con su sustento tecnico(ii) atender y levantar las observaciones de seguridad y salud en el trabajo mediante el informe correspondiente bajo apercibimiento de la aplicacion de las penalidades que correspondan por incumplimiento de las obligaciones de seguridad.(iii) presentar la justificacion tecnica y plano de replanteo para la reubicacion de la...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 172 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/07/2026**

...ialista en seguridad en obra de la supervision,(carta no013-2026-jrra-consultor, fecha 10/07) referidas a la implementacion de tranqueras y vigias, a fin de acreditar su atencion, precisandose que su incumplimiento constituye causal de penalidad conforme al contrato de ejecucion de obra. del mismo modo, se comunica que la supervision emitira un informe respecto al poste de alumbrado publico cuya integrid...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
