


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

ejecución de obra: ¿mejoramiento y ampliacion de la avenida 28 de julio de villa punchana, distrito de punchana ¿ maynas - loreto¿ CUI N° 2184820

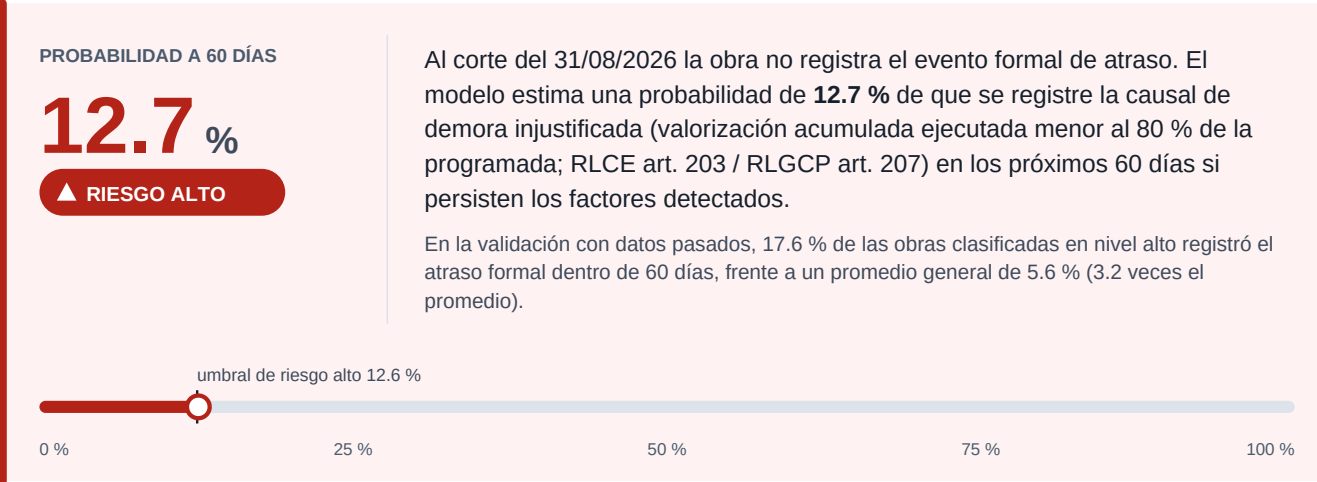


|                    |                |                        |                |
|--------------------|----------------|------------------------|----------------|
| MONTO DEL CONTRATO | PLAZO ORIGINAL | ASIENTOS DEL CUADERNO  | ÚLTIMO ASIENTO |
| No publicado       | No publicado   | 31<br>desde 03/08/2026 | 31/08/2026     |

01 Identificación de la obra y del contrato

|                                                 |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación oficial                            | EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AVENIDA 28 DE JULIO DE VILLA PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA ¿ MAYNAS - LORETO¿ CUI N° 2184820 |
| Entidad contratante                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA                                                                                                               |
| Contratista                                     | CONSTRUCTORA YAVARI S.R.L.                                                                                                                        |
| Ubicación (distrito / provincia / departamento) | PUNCHANA / MAYNAS / LORETO                                                                                                                        |
| Código Único de Inversión (CUI)                 | 2184820                                                                                                                                           |
| Inversión asociada                              | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AVENIDA 28 DE JULIO DE VILLA PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA - MAYNAS - LORETO                                     |
| Función                                         | TRANSPORTE                                                                                                                                        |
| Identificador del contrato (SEACE)              | 2384227                                                                                                                                           |
| Monto del contrato                              | -                                                                                                                                                 |
| Monto aprobado de la inversión                  | S/ 17,127,331.00                                                                                                                                  |
| Cuaderno de obra digital                        | 31 asientos entre 03/08/2026 y 31/08/2026                                                                                                         |

## 02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

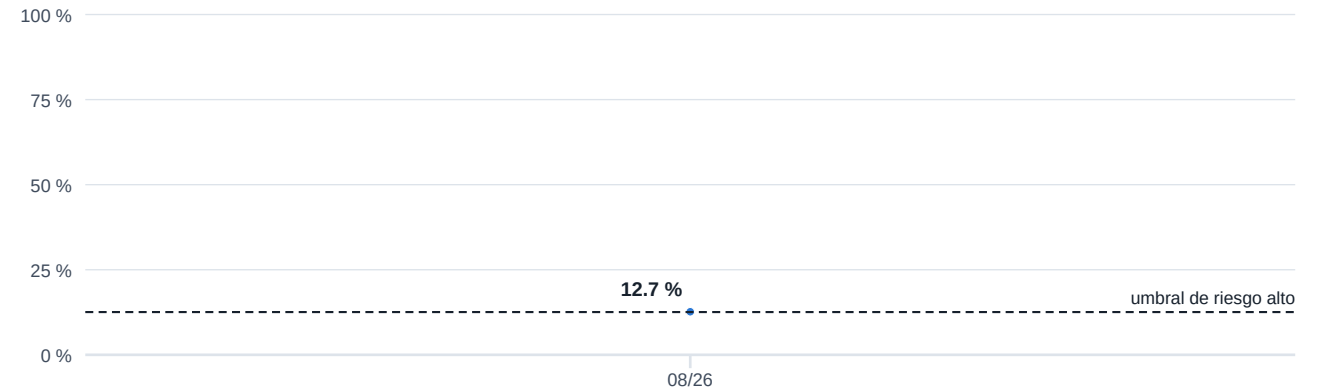

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (1 corte, del 31/08/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

## 03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

| Dato de la obra                                                                                 | Grupo                          | Reduce   Eleva | Efecto |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.67 (escala de 0 a 1)      | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.630 |
| El 10 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora                | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.163 |
| Departamento: Loreto                                                                            | Características de la obra     | <div></div>    | +0.100 |
| Hubo un asiento el mismo día del corte                                                          | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.096 |
| El 10 % de los asientos de los últimos 60 días menciona observaciones de calidad                | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.063 |
| Hubo registros en el cuaderno 15 días del último mes                                            | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.059 |
| Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales | Contenido de los asientos      | <div></div>    | -0.054 |
| Se ha gastado el 12 % del presupuesto inicial del año                                           | Ejecución del gasto (SIAF)     | <div></div>    | +0.053 |

## 04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

| Escenario                                                | Actual | Escenario | Cambio  |
|----------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días  | 12.7 % | 12.1 %    | -0.5 pp |
| Absolver todas las consultas pendientes                  | 12.7 % | 12.7 %    | +0.0 pp |
| Ejecución financiera al día (devengado en el último mes) | 12.7 % | 12.7 %    | +0.0 pp |

## 05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

### Asiento N.º 29 · Ampliaciones de plazo · SOEC\_RESI · 26/08/2026

...bios que han ocurrido en la ciudad, de tal manera en virtud de salvaguardar la integridad física de los trabajadores y del personal clave de la obra no se ha laborado, de esta manera ocasionandoos un atraso en la ejecucion de la obra ya que no se ha podido continuar con la programacion de la obra imposibilitandonos continuar con los trabajos de demolicion de pavimento de mortero armado existente e=0.20...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 29 · Ampliaciones de plazo · SOEC\_RESI · 26/08/2026

FINAL DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01: Se informa que hoy día no se ha podido trabajar suspendiéndose las labores debido al paro de 48 horas convocado por la CGTP los días 25 y 26 de Agosto divido a los disturbios que han ocurrido en la ciudad, de tal manera en virtud de salvaguardar la integridad física de los trabajadores y del personal clave de la obra no se ha laborado, de esta manera ocasionándoos un atraso en l...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 26 · Otras ocurrencias · SOEC\_RESI · 25/08/2026

...rbios que han ocurrido en la ciudad, de tal manera en virtud de salvaguardadla integridad fisica de los trabajadores y del personal clave de la obra no se ha laborado, de esta manera ocasionandoos un atraso en la ejecucion de la obra ya que no se ha podido continuar con la programacion de la obra imposibilitandonos continuar con los trabajos de encofrado de paredes laterales y losa inferior de sardinel...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 24 · Consultas · SOEC\_INSP · 24/08/2026

...ado cuenta con la factibilidad de la eps. sin embargo, de lo precisado por el contratista en los asientos de su consulta, y lo evidenciado en campo, se encuentra con sistema de agua y alcantarillado (deficiente). situacion que representa un riesgo a la estructura de pavimento del proyecto, ya que podria colapsar el sistema de saneamiento existente, y comprometer la vida util del proyecto.de acuerdo con el n...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 18 · Consultas · SOEC\_RESI · 20/08/2026

... la opinion tecnica del proyectista o de quien corresponda ya que se ha verificado la condicion de las redes de agua potable y alcantarillado existentes dentro del area de intervencion, encontrandose observaciones que reflejan un estado de inoperatividad de dichas tuberias, las cuales resultan determinantes para la sostenibilidad de la obra vial, dado que: la ejecucion de pavimentacion sobre redes de agua y ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 14 · Consultas · SOEC\_RESI · 20/08/2026

... la opinion tecnica del proyectista o de quien corresponda ya que se ha verificado la condicion de las redes de agua potable y alcantarillado existentes dentro del area de intervencion, encontrandose observaciones que reflejan un estado de inoperatividad de dichas tuberias, las cuales resultan determinantes para la sostenibilidad de la obra vial, dado que: la ejecucion de pavimentacion sobre redes de agua y ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

### Asiento N.º 12 · Otras ocurrencias · SOEC\_INSP · 17/08/2026

EJECUCIÓN DE OBRA.: Se le indica al contratista que todo el personal que labora en los trabajos de ejecución de la obra deberá contar con sus respectivos implementos de Seguridad Personal.Del mismo modo, también deberá tener un personal para realizar trabajos de información y/o sensibilización a los vecinos, sobres los alcances de la ejecución del proyecto, toda vez que algunos de ellos manifiestan desconocer en qué ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 12 · Otras ocurrencias · SOEC\_INSP · 17/08/2026**

...lizacion a los vecinos, sobres los alcances de la ejecucion del proyecto, toda vez que algunos de ellos manifiestan desconocer en que consiste la ejecucion del proyecto, y, con la finalidad de evitar atrasos y/o paralizaciones en la ejecucion del proyecto, exhorto a su representada, presentar el informe de revision de expediente tecnico del proyecto, y de ser el caso, identifique, posible incompatibili...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 6 · Otras ocurrencias · SOEC\_INSP · 10/08/2026**

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL CLAVE Y CUMPLIR EL PLAN DE TRABAJO.: SE EXHORTA LA PARTICIPACIÓN LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL CLAVE, PROPUESTO, Y EN CASO DE HABER PERSONAL ADICIONAL INFORMAR A ESTA INSPECCIÓN. TAMBIÉN, REALIZAR LAS GESTIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO, PRESENTADO A LA FIRMA DE CONTRATO.

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

| Indicador (prueba temporal ciega) | Nacional | Arequipa |
|-----------------------------------|----------|----------|
| ROC-AUC                           | 0.774    | 0.719    |
| PR-AUC                            | 0.158    | 0.216    |
| Prevalencia del evento            | 0.050    | 0.091    |

Modelo atraso-H60-B\_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

**CÓMO USAR ESTE INFORME**

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
