


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación para la ejecución del saldo de obra del proyecto de inversión: Rehabilitación de las redes de agua y alcantarillado de los sectores circunvalación cuajone, miguel grau, los olivos y miramar parte alta, distrito y provincia de ilo, region moquegua con CUI N°2252177

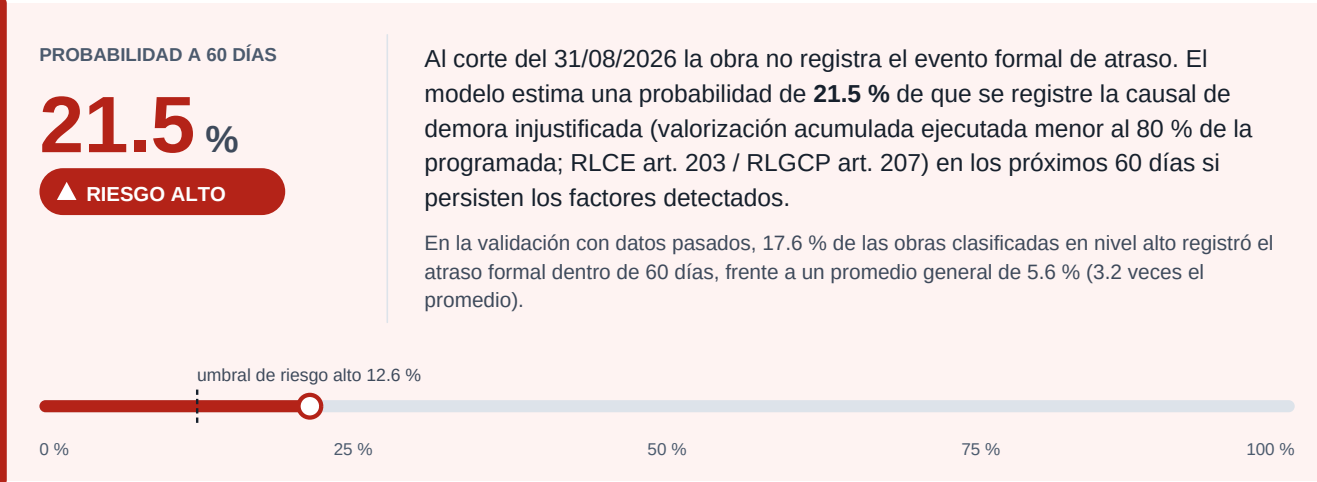


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	240 días	250 desde 03/03/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES CIRCUNVALACIÓN CUAJONE, MIGUEL GRAU, LOS OLIVOS Y MIRAMAR PARTE ALTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA CON CUI N°2252177
Entidad contratante	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE ILO SA
Contratista	Z & Z INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	ILO / ILO / MOQUEGUA
Código Único de Inversión (CUI)	2252177
Inversión asociada	REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES CIRCUNVALACION CUAJONE, MIGUEL GRAU, LOS OLIVOS Y MIRAMAR PARTE ALTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2378590
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 5,787,207.00
Cuaderno de obra digital	250 asientos entre 03/03/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

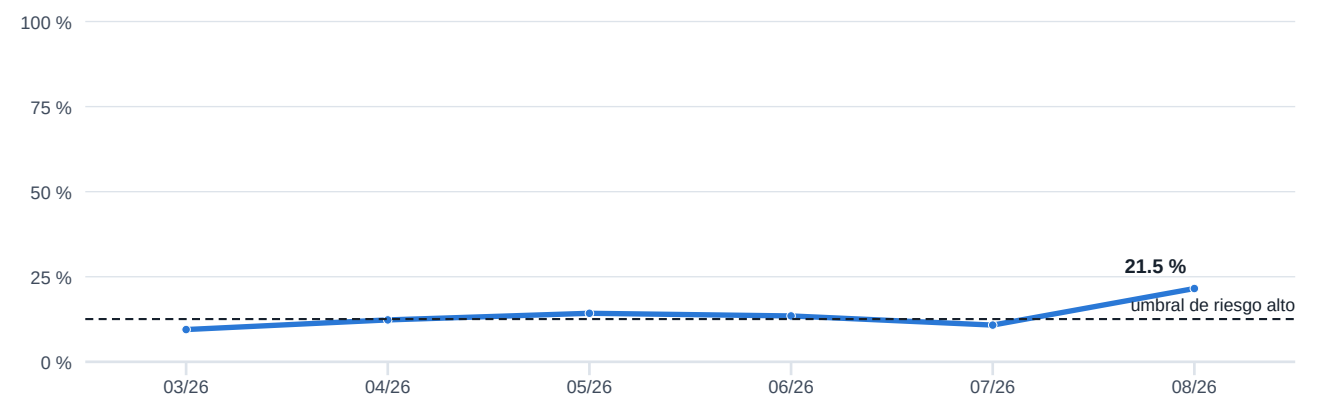

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (6 cortes, del 31/03/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.64 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.735
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.214
Departamento: Moquegua	Características de la obra		+0.171
El 55 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.163
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.80 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.130
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.115
El plazo original venció hace 632 días	Datos del contrato		-0.108
Ha transcurrido el 363 % del plazo original	Datos del contrato		-0.097

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	21.5 %	21.5 %	+0.0 pp
Absolver todas las consultas pendientes	21.5 %	21.9 %	+0.4 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.° 238 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026

RESPUESTA AL ASIENTO N°236: En atención al Asiento N°236 de la contratista, y luego de revisar la solicitud y el plano de replanteo presentado, la Supervisión AUTORIZA el replanteo de la red colectora de alcantarillado en la Calle 3 de Octubre, conforme a la ubicación propuesta, a fin de garantizar la continuidad y funcionalidad de la red de alcantarillado. La ejecución deberá efectuarse de acuerdo con el plano de rep...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 227 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 18/08/2026

...do de todos los lotes contemplados en el expediente tecnico, independientemente de su inclusion o no en el padron actualizado de beneficiarios, a fin de continuar con la ejecucion de la obra y evitar retrasos en su programacion.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 222 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 17/08/2026

...stente), la cual forma parte de la ruta critica del cronograma de obra, asi como otras actividades programadas. por lo expuesto, se deja expresa constancia de que estas circunstancias vienen generando retrasos en la ejecucion de la obra no atribuibles al contratista, para los fines contractuales correspondientes. asi mismo se deja constancia que permanece la presencia de precipitacion pluvial por lo que s...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 216 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

...rabajos pendientes viene generando observaciones y reclamos de los usuarios, siendo responsabilidad de la contratista adoptar las acciones correctivas y de programacion necesarias para evitar mayores retrasos en la culminacion de las partidas correspondientes.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 209 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 04/08/2026

...de concreto e=8" resulta tecnicamente procedente y compatible con el expediente tecnico de obra. la presente aprobacion se emite con la finalidad de garantizar la continuidad de los trabajos y evitar retrasos en el cumplimiento del hito 1.5 conexiones domiciliarias de desague, debiendo ejecutarse conforme a las especificaciones tecnicas del proyecto, siendo el metrado real objeto de verificacion durante...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 192 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/07/2026

RESPUESTA AL ASIENTO N°182: RESPECTO AL ASIENTO N°182, CORRESPONDE AL CONTRATISTA EJECUTAR LA OBRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, POR LO QUE, EL CORTE, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN EN BERMAS SE DEBERÁ EJECUTAR DE CONFORMIDAD CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA. ASIMISMO, SE SOLICITA AL CONTRATISTA, EL PLAN DE TRABAJO Y SU PROPUESTA DE EJECUCIÓN EN BERMAS

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.° 184 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 08/07/2026

SE REITERA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y CALENDARIOS: Se reitera al contratista que, debe presentar el programa de ejecución de obra y sus calendarios actualizados del expediente técnico de prestación adicional de obra N°01, dicha actualización deberá realizarse a la fecha de notificación y aprobación del referido expediente técnico, lo solicitado deberá presentarlo dentro del plazo máximo de dos (02) días...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
