


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion para la ejecucion de la obra - creacion del servicio de movilidad urbana en las vias locales del aa.hh avimapa del distrito de ventanilla-provincia constitucional del callao-departamento del callao-cui N-2552917

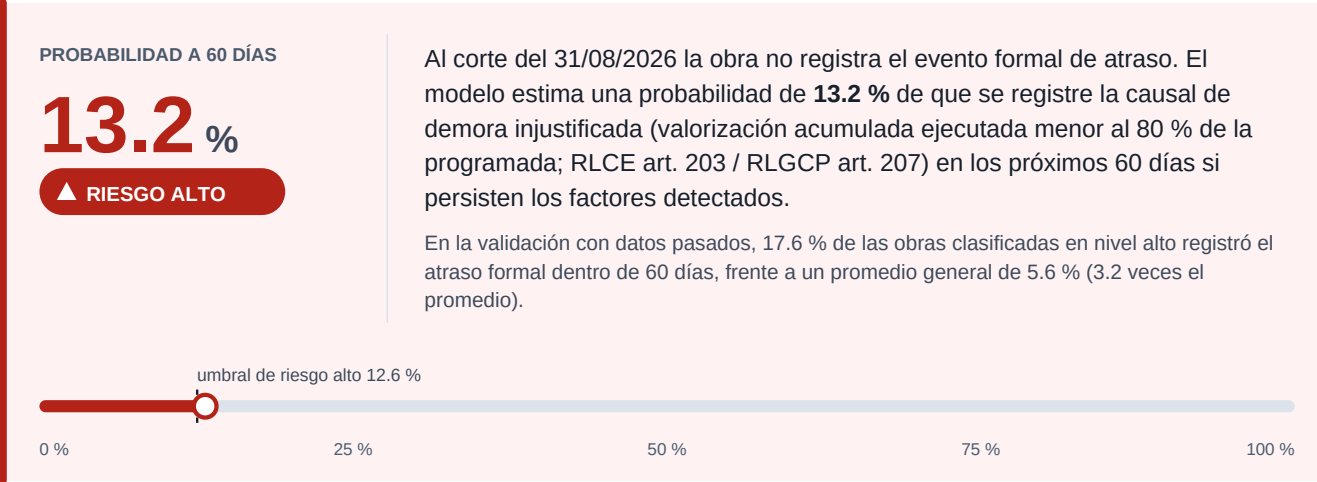


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	80 desde 07/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH AVIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO-DEPARTAMENTO DEL CALLAO-CUI N-2552917
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO SEDE CENTRAL
Contratista	CONSORCIO VIAL ERMIR
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	VENTANILLA / CALLAO / CALLAO
Código Único de Inversión (CUI)	2552917
Inversión asociada	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH AVIMAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2402484
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 4,996,275.11
Cuaderno de obra digital	80 asientos entre 07/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

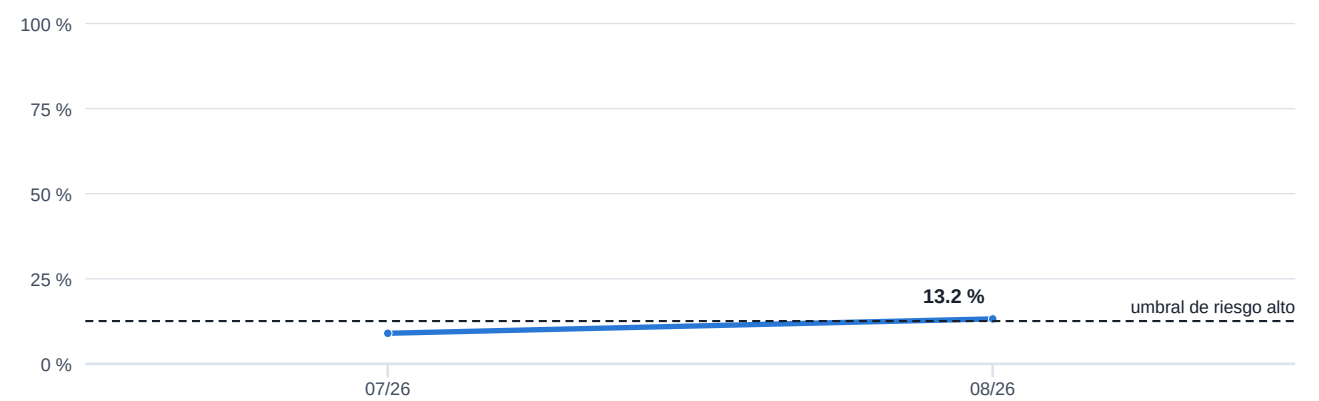

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.63 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.622
Departamento: Callao	Características de la obra		+0.193
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.168
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.087
Extensión media de los asientos recientes: 1,077 caracteres	Contenido de los asientos		-0.072
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.061
6 asientos de adicionales de obra en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.054
Se ha gastado el 0 % del presupuesto inicial del año	Ejecución del gasto (SIAF)		+0.054

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	13.2 %	13.2 %	+0.0 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	13.2 %	13.2 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 68 · Adicionales · SOEC_INSP · 27/08/2026

ADICIONAL DE OBRA N°01: Esta Inspección de Obra pone en conocimiento del Contratista que, mediante el Informe N.º 040-2026-GRC/OCV-MOR de la Coordinación de Obra se me trasladó el Informe N.º 315-2026-GRC/OCV-LALLJ en el cual el Área de Estudios de la Entidad ha formulado observaciones técnicas al Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N.º 01, presentado formalmente mediante Carta N.º 029-2026-LPSG-RC-C...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 63 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 15/08/2026

...a programacion contempla una duracion de 15 dias, con fecha de inicio prevista el 14 de agosto de 2026 y termino programado el 28 de agosto de 2026.en tal sentido, se deja constancia de que cualquier retraso o impedimento que se presente en la ejecucion de la referida partida, al encontrarse vinculada a la ruta critica, podria generar incidencia directa en el plazo contractual de la obra, afectando las ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 58 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 11/08/2026

...guimiento continuo y las coordinaciones directas ante las entidades publicas y eps, adoptando las medidas preventivas e identificaciones necesarias en campo para mitigar los riesgos de paralización o demoras en la obra.se adjunta al presente asiento la copia escaneada del informe n. 113-2026-grc/ocv-rser de fecha 11/08/2026, debidamente recepcionado por la entidad, para conocimiento, seguimiento y fines...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 54 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 10/08/2026

... secuencia constructiva y programacion de la obra.en tal sentido, la falta de definicion y atencion oportuna de dichas interferencias podria generar mayores afectaciones a la secuencia constructiva y retrasar la ejecucion de las actividades programadas, con la consecuente incidencia en el plazo de ejecucion de la obra.se deja constancia de lo indicado para los fines correspondientes y se solicita la ate...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 48 · Adicionales · SOEC_RESI · 07/08/2026

ENTREGA DE LA PRESTACION DEL ADICIONAL DE OBRA N°01: En la fecha, se realiza la entrega de la prestación correspondiente al Adicional de Obra N.º 01, denominada "Conformación manual de subrasante para veredas, rampas y marillos", conforme al sustento técnico elaborado y a las condiciones verificadas durante la ejecución de la obra.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 44 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 04/08/2026

EJECUCIÓN DE OBRA: En atención a los Asientos N° 42 y N° 43 del Residente de Obra, correspondientes a los trabajos ejecutados los días 01 y 03 de agosto de 2026, esta Inspección toma conocimiento del cumplimiento de las charlas diarias de seguridad y de los trabajos reportados, los cuales incluyen trazo y replanteo, demoliciones, eliminación de excedentes mediante volquete, cortes a nivel de subrasante, excavaciones ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 41 · Adicionales · SOEC_INSP · 03/08/2026

SOBRE ADICIONALES DE OBRA: Se reitera al Contratista lo asentado en el Asiento N°37 del Inspector de Obra, en atención a lo anotado en el Asiento N.º 33 por parte del Residente de Obra, la Inspección ha cumplido dentro del plazo legal con emitir y remitir a la Entidad el respectivo Informe Técnico de Sustento y Gestión de Riesgo, ratificando la posición respecto a la necesidad de la prestación adicional N°01, en conf...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 41 · Adicionales · SOEC_INSP · 03/08/2026

...entidad a la fecha respecto al resto de observaciones elevadas mediante el informe de revision del expediente tecnico de obra, y con el fin de evitar mayores diferimientos, contingencias operativas o retrasos en el cronograma, se solicita al contratista con caracter de muy urgente:- identificar y formalizar a traves del cuaderno de incidencias, a modo de consultas independientes, aquellas observaciones ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 36 · Adicionales · SOEC_RESI · 29/07/2026

NECESIAD DE EJECUTAR ADICIONALES DE OBRA: Continuando con los trabajos de movimiento de tierras de la partida 02.03 VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS, encontramos la existencia de parques y jardines, donde la sub partida 02.03.05 CONCRETO PREMEZCALDO F´C=175KG/CM2 PARA UÑA DE VEREDA Y MARTILLS C/CEMENTO TIPO HS, Hprom. =0.45M, fue diseñada en veredas, rampas y martillos con una sola uña. De acuerdo al proceso constructivo ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 33 · Adicionales · SOEC_RESI · 25/07/2026

NECESIDAD DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA: Se pone en conocimiento del Inspector de Obra que, mediante el presente asiento, se adjunta el Informe Técnico de NECESIDAD DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA DE LA PARTIDA “CONFORMACION MANUAL DE SUBRASANTE PARA VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS” solicitado en el Asiento N.º 32, el cual complementa nuestra solicitud de prestación adicional de obra formulada y comu...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 32 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 24/07/2026

EJECUCIÓN DE OBRA: RESPECTO AL ASIENTO N° 31 DEL RESIDENTE DE OBRA EN MÉRITO AL NUMERAL 190.2 DEL ARTICULO 190 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS VIGENTE, SE INDICA QUE SU REPRESENTADA DEBE ACOMPAÑAR LA ANOTACIÓN CORRESPONDIENTE CON UN INFORME TÉCNICO PARA SER ATENDIDA

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
