

INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento de las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la asociacion casa blanca del distrito de sayan - provincia de huaura - departamento de lima, meta iii CUI N°2501908

PROBABILIDAD A 60 DÍAS

12.6 %

▲ RIESGO ALTO

Al corte del 31/08/2026 la obra no registra el evento formal de atraso. El modelo estima una probabilidad de **12.6 %** de que se registre la causal de demora injustificada (valorización acumulada ejecutada menor al 80 % de la programada; RLCE art. 203 / RLGCP art. 207) en los próximos 60 días si persisten los factores detectados.

En la validación con datos pasados, 17.6 % de las obras clasificadas en nivel alto registró el atraso formal dentro de 60 días, frente a un promedio general de 5.6 % (3.2 veces el promedio).

umbral de riesgo alto 12.6 %

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	67 desde 16/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION CASA BLANCA DEL DISTRITO DE SAYAN - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA, META III CUI N°2501908
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN
Contratista	CONSORCIO TERESA DE CALCUTA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	SAYAN / HUAURA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2501908
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION CASA BLANCA DEL DISTRITO DE SAYAN - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2406222
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 5,650,455.45
Cuaderno de obra digital	67 asientos entre 16/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

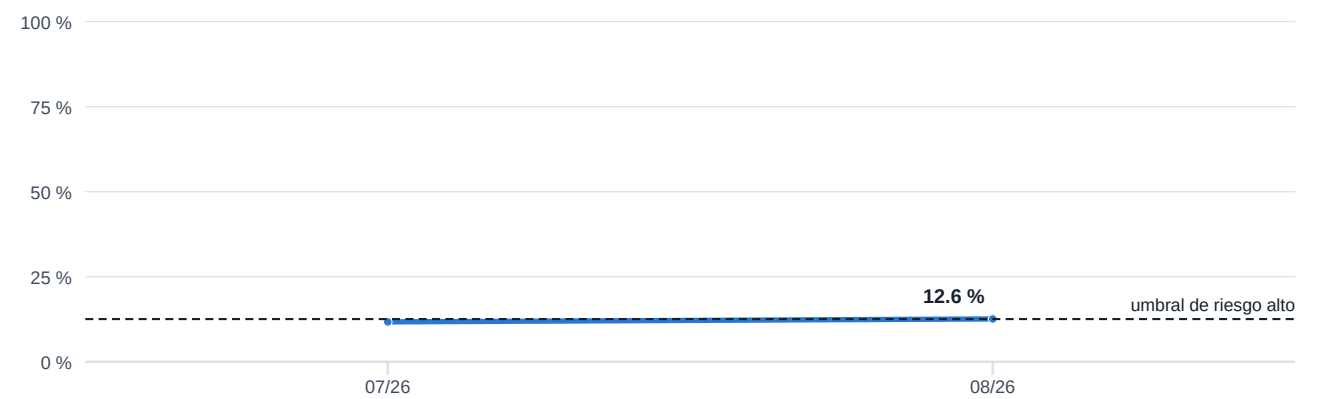

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.56 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.439
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.178
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.159
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.135
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.089
Extensión media de los asientos recientes: 980 caracteres	Contenido de los asientos		-0.058
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.55 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.057
Hubo registros en el cuaderno 15 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.052

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	12.6 %	12.6 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 42 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 05/08/2026

VERIFICACION Y APROBACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA JORNADA - FECHA 04/08/2026 Y 05/08/2026: *Se confirma que se inició la jornada con la charla de seguridad dirigida a los obreros, cumpliendo con lo establecido en el plan seguridad en obra.*Se verifica la continuidad del regado del área de trabajo con camión cisterna, a fin de mitigar la generación de polvo y cumplir con las medidas ambientales establecidas.*...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 40 · Adicionales · SOEC_RESI · 05/08/2026

...informa que el día de mañana se estará sacando las respectivas pruebas de densidad de campo en dichos pasajes.tambien se realizaron la conformacion de sub rasante en veredas estos trabajos han estado demorando debido a que la empresa prestadora de servicios recién ha culminado sus instalaciones nuevas.se realiza el regado de toda el area con ayuda de camion cisterna.el día de hoy se ha presentado el exp...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 39 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 04/08/2026

...espectiva charla de seguridad a los trabajadores de la obra.se informa que segun la empresa prestadora de servicios 8 vecinos han solicitados la conexion nueva de agua y desagüe lo que esta generando atrasos con los trabajos de conformacion de base granular en veredas y en algunos casos ha excavado en areas ya trabajadas, estas nuevas instalaciones generaran mayores metrados en las partidas 9.01 reposi...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 37 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 03/08/2026

...que.se realiza el regado del area de trabajo con camion cisterna.se continua a la espera del pronunciamiento por parte de la entidad referente a la consulta n 01 del expediente tecnico, esto nos esta retrasando con el avance normal en obra, por lo de continuar sin que la entidad se pronuncie se vera afectada la ruta critica y por consiguiente se generara una posible ampliacion de plazo.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 13 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 22/07/2026

TRABAJOS DIARIOS: Mediante el presente asiento se hace la entrega del cronograma de participación del personal clave.También se informa al supervisor que las charlas de seguridad duran 5 minutos y que eso lo hacemos en el pasaje 06 en las afueras del almacén de la obra.El día de hoy también se llevo a cabo la respectiva charla de seguridad y tuvimos la visita de los dirigentes de los gremios de construcción civil qui...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 13 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 22/07/2026

...o con la eliminacion del material de demolicion de las veredas ya que no es posible que la maquina ingrese al pasaje 05.estaremos informando si estas conexiones continuaran por que de ser asi esto no retrasara al momento de realizar el corte del terreno natural.por la tarde se inicio con el acopio de agregados hasta el lugar de la obra con ayuda de volquetes.estamos a la espera de la respuesta de la con...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 12 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 21/07/2026

VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA JORNADA - FECHA 21/07/2026: *Se solicita a la contratista implementar la seguridad de obra y señalización bajo responsabilidad el cual no cuenta como se aprecia en la imagen adjunto.*No se pudo verificar esta ocurrencia descrita por el residente de obra al inicio de la jornada se realizó la charla de seguridad dirigida al personal obrero, reforzando las medi...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 12 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 21/07/2026

...del personal clave (especialista de seguridad y especialistas ambiental) que hasta la fecha no presente como fue descrito en asientos anteriores, por ende, caso omiso se realizara la aplicacion de la penalidad acorde al contrato no 006-2026-gm/mds, y como establece en la clausula decimoquinta: penalidad y como estable en item 3.20 otras penalidades, establecidas en los terminos de referencia de las bases i...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
