


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecucion de la obra plan de contingencia del proyecto mejoramiento y ampliacion de los servicios de salud del hospital de apoyo tomas lafora guadalupe, del distrito de guadalupe provincia de pacasmayo departamento de la libertad con CUI n 2427376

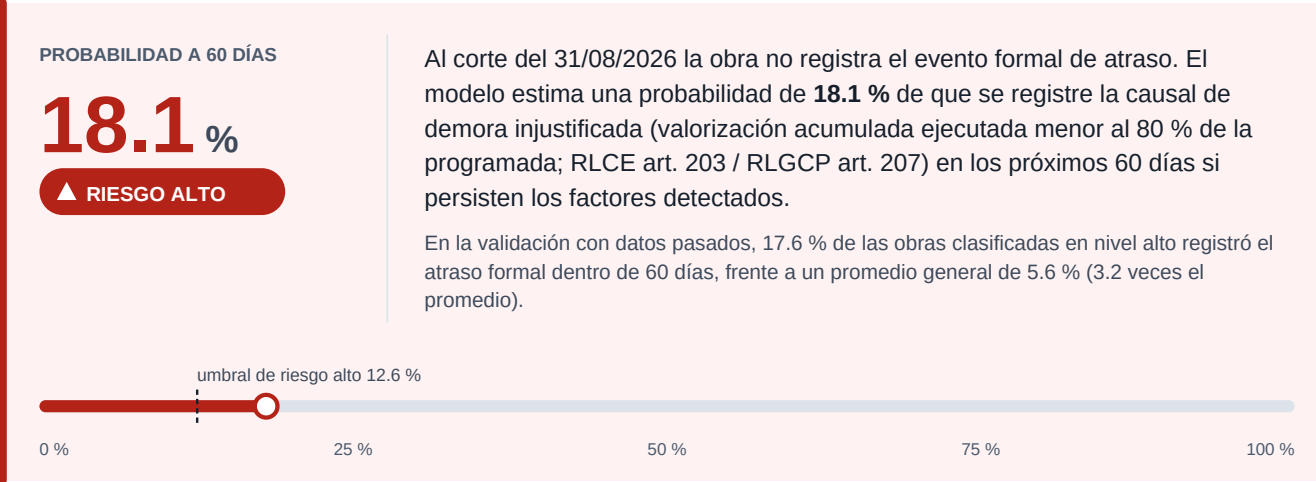


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	1,584 desde 11/11/2024	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCION DE LA OBRA PLAN DE CONTINGENCIA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO TOMAS LAFORA GUADALUPE, DEL DISTRITO DE GUADALUPE PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD CON CUI N 2427376
Entidad contratante	UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
Contratista	CONSORCIO PROCERES
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	GUADALUPE / PACASMAYO / LA LIBERTAD
Código Único de Inversión (CUI)	2427376
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO TOMAS LAFORA, GUADALUPE DEL DISTRITO DE GUADALUPE - PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Función	SALUD
Identificador del contrato (SEACE)	2283909
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 163,197,445.93
Cuaderno de obra digital	1584 asientos entre 11/11/2024 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

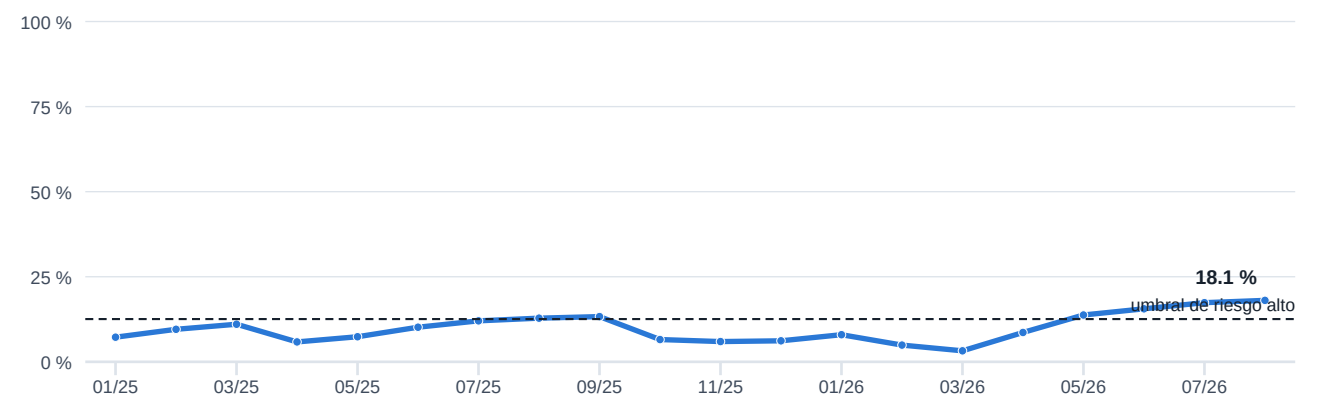

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (20 cortes, del 31/01/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.75 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.687
El 17 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.225
El 9 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.184
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.105
Se ha gastado el 4 % del presupuesto inicial del año	Ejecución del gasto (SIAF)		+0.080
Hubo registros en el cuaderno 18 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.072
Gasto acumulado de la inversión (devengado): S/ 111,538,456	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.070
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.62 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.065

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	18.1 %	17.8 %	-0.2 pp
Absolver todas las consultas pendientes	18.1 %	18.1 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 1580 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 28/08/2026

elevacion a la entidad de la consulta n27-arq: solicitud de definicion tecnica ante incumplimiento de las dimensiones de las puertas hpl respecto de la nts n110-minsa/dgiem-v.01 . mediante el presente asiento, se procede a dar respuesta al asiento n1578 de fecha 24/08/2026, a traves del cua...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1579 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 25/08/2026

...as e impagas. por tanto, se deja constancia que conforme al plazo perentorio senalado en el numeral 201.1 del articulo 201 del rlce, en las citadas valorizaciones, sus respectivos plazos han vencido, incumpliendo la entidad con realizar los pagos correspondientes, la cual afecta el flujo directo y oportuno de la obra.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1579 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 25/08/2026

demora de pago de valorizaciones de mayores gastos generales variables n 01, n 02, n 03 y n 04, derivado de las ampliaciones de plazo n 01, n 02, n 03 y n 06. . en referencia al asiento 1552 de fecha 03 de ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1578 · Consultas · SOEC_RESI · 24/08/2026

consulta n27-arq: solicitud de definicion tecnica ante incumplimiento de las dimensiones de las puertas hpl respecto de la nts n110-minsa/dgiem-v.01 infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del segundo nivel de atencion. . se deja constanc...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1575 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 21/08/2026

...198 del rlce b) respecto al riesgo no previsto r.006 riesgo de errores o deficiencias en el diseno que repercutan en el costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecucion de la obra.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1574 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 21/08/2026

cierre de circunstancias de ampliacion de plazo, por impedimento de continuar partidas programadas en la ejecucion de obra por tiempo necesario para la elaboracion y demora en la aprobacion de la prestacion adicional de obra no03 (2/2) . (... viene del asiento anterior)conforme a ello, a partir de carta n02-2025-chg/js de fecha de recepcion 04 de diciembre del 2025, la ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1573 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 21/08/2026

cierre de circunstancias de ampliacion de plazo, por impedimento de continuar partidas programadas en la ejecucion de obra por tiempo necesario para la elaboracion y demora en la aprobacion de la prestacion adicional de obra no03 (1/2) . a) fin de las circunstancias: 1. se deja constancia que, el día 21 de agosto de 2026 a las 9:48 am, mediante el correo electronico <ua...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1541 · Programa de ejecución de obra - CPM · SOEC_RESI · 22/07/2026

PRESENTACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y DE LOS CALENDARIOS VALORIZADOS ASOCIADOS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 202 DEL RLCE: En atención al Asiento de Cuaderno de Obra N°1538, efectuado por la Supervisión de Obra, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 202 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se deja constancia que, mediante CARTA N°071-2026-CONS...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 1536 · Programa de ejecución de obra - CPM · SOEC_RESI · 20/07/2026 PRESENTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y DE LOS CALENDARIOS VALORIZADOS ASOCIADOS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 202 DEL RLCE, EN ATENCIÓN AL ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA N°1531 DEL SUPERVISOR DE OBRA: En atención al Asiento de Cuaderno de Obra N°1531, efectuado por la Supervisión de Obra, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 202 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Est... Fuente: cod-asientos202607.csv
Asiento N.º 1531 · Programa de ejecución de obra - CPM · SOEC_SPV · 13/07/2026 REQUERIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA (CPM) Y CALENDARIOS ASOCIADOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 202 DEL RLCE.: Mediante el presente asiento, esta Supervisión hace de conocimiento al Contratista que, tras la evaluación técnica y normativa contenida en el Informe N°029-2026-CHG/ERAQ de nuestro Especialista de Costos, Metrados y Valorizaciones, se ha determinado objetivamente que el Programa de Eje... Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
