


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratación de la ejecución de la obra mejoramiento y ampliación del parque deportivo-recreativo de la asociación los montoneros, distrito de cerro colorado - arequipa - arequipa con CUI 2142896

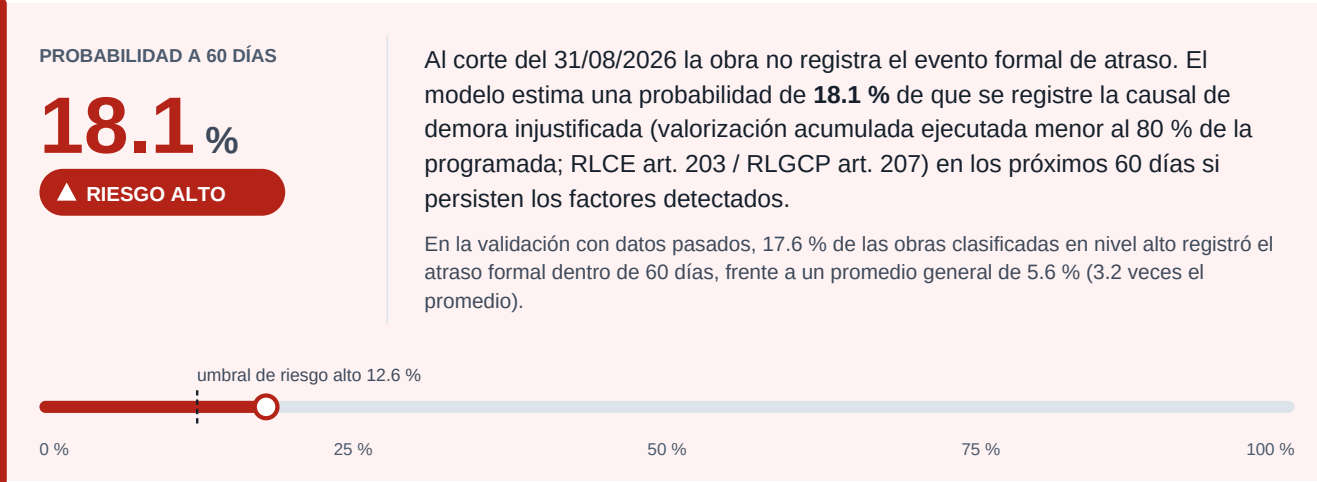


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 3,737,969.47	180 días	740 desde 01/07/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DEPORTIVO-RECREATIVO DE LA ASOCIACIÓN LOS MONTONEROS, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA CON CUI 2142896
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Contratista	CONSORCIO AQP CONTRATISTAS
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CERRO COLORADO / AREQUIPA / AREQUIPA
Código Único de Inversión (CUI)	2142896
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DEPORTIVO-RECREATIVO DE LA ASOCIACIÓN LOS MONTONEROS, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA
Función	CULTURA Y DEPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2332131
Monto del contrato	S/ 3,737,969.47
Monto aprobado de la inversión	S/ 452,485.00
Cuaderno de obra digital	740 asientos entre 01/07/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

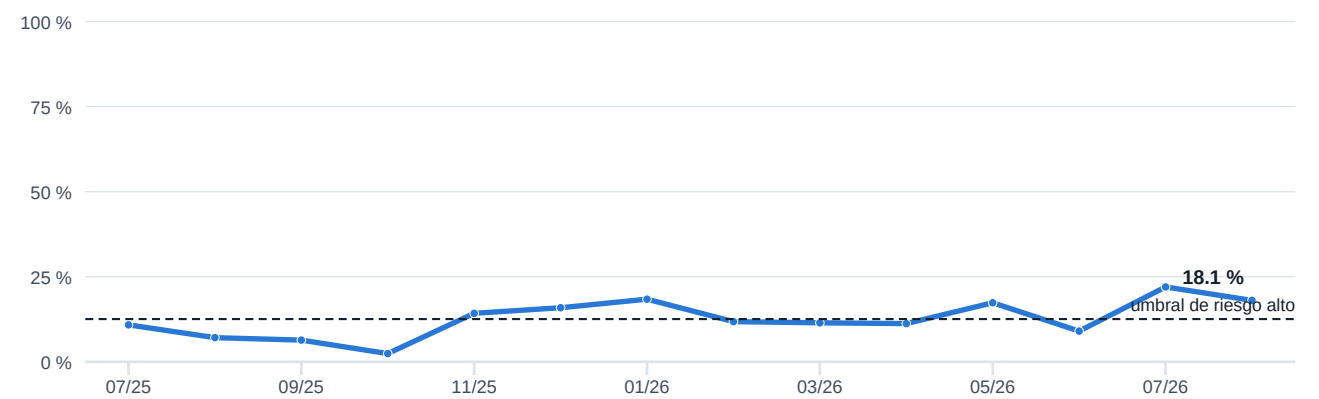

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (14 cortes, del 31/07/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.57 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.572
El 9 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.236
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.210
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.203
Ha transcurrido el 237 % del plazo original	Datos del contrato		-0.124
1 asiento de aplicación de penalidades desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.118
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.110
El plazo original venció hace 246 días	Datos del contrato		-0.106

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	18.1 %	17.8 %	-0.2 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 737 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 30/08/2026

...dad.ademas, se verificaron trabajos de pintado de cerco perimetrico, tarrajeo de muro en ingreso n3 y desinstalacion de bocatormenta en grada colindante a la zona de gymse reitera a la contratista, la falta de personal obrero para poder culminar los trabajos en los tiempos estipulados considerando la cantidad de partidas que faltan por culminar.ademas, el día de ayer se realiza la conciliacion de metrados ejecutado...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 731 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 26/08/2026

...ato en cerco perimetrico de tubos metalicos. se le reitera a la residencia, que debe tomar las precauciones del caso para el izaje de vigas y coberturas, de tal manera que no se generen imprevistos y retrasos en el avance de la obra, bajo responsabilidad.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 727 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

...se deja constancia mediante el presente asiento que, a la fecha no se ha recepcionado el informe de protocolos de seguridad para el izaje de vigas metalicas (vg-01), lo que imposibilita dicho izaje y retrasan los trabajos programados bajo responsabilidad de la contratista y del personal tecnico contratado.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 725 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 22/08/2026

...uracion de dicha bocatormenta, la cual sera revisada y evaluada por la supervision. por lo tanto, quedan suspendidos dichos trabajos hasta su aprobacion, bajo responsabilidad de la contratista por la demora en la presentacion de documentos."asi mismo, mediante el presente asiento se informa y deja constancia que, a la fecha de hoy y siendo las 11.15am no se ha presentado el informe de protocolo de segur...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 724 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 21/08/2026

cambio de personal clave (especialista) . -se hace de conocimiento a supervision que el dia de hoy 21 de agosto del 2026 se nos ha notificado a representante legal de la empresa contratista con la carta n 114 2026 mdcc...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 722 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 21/08/2026

RESPUESTA A CONSULTA: SOBRE LA CONSULTA REALIZADA EN EL ASIENTO N°720 DEL RESIDENTE DE OBRA DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE INSTALACION DE GRASS SINTETICO EL CUAL PRESENTA UNA INCONGRUENCIA TÉCNICA EN EL PLANO PG-01 (DETALLE DE TRATAMIENTO DE PISOS CORTE 01-A Y 02-F) LA ACOTACIÓN ACTUAL PRESENTA CONTRADICCIONES MUESTRA UNA COTA GENERAL DE 0.22M Y COTAS PARALELAS FRACCIONADAS QUE SUMAN VALORES INCONGRUENTES CON EL DISEÑO...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 713 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 18/08/2026

...omo tambien viga vg-01 aplicandose base zincromato , segun coordinado y mencionado en informe de colores para el proyecto.se hace mencion que se ha entregado a la entidad la documentacion referente a retraso justificado mediante carta n 120-2026-caqpc/jply referente a solicitud de no aplicacion de penalidad por mora sustento de retraso justificado n 02, debido a que han quedado actividades que estuvieron...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 713 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 18/08/2026

...lores para el proyecto.se hace mencion que se ha entregado a la entidad la documentacion referente a retraso justificado mediante carta n 120-2026-caqpc/jply referente a solicitud de no aplicacion de penalidad por mora sustento de retraso justificado n 02, debido a que han quedado actividades que estuvieron supeditadas hasta la culminacion del periodo de ejecucion del adicional n 03 , siendo estas partidas...

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 709 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/08/2026**

...medio del presente asiento se deja constancia.asi mismo, el dia de manana 18/08/2026, se vence el plazo de ejecucion de obra, del adicional y deductivo vinculante n2 , por lo que la contratista viene incumpliendo dichos plazos, considerando que aun falta el izaje de la cobertura metalica entre otros trabajos pendientes de ejecutar, bajo responsabilidad de la contratista.

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 684 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 05/08/2026**

ABSOLUCION DE CONSULTAS: SOBRE LA CONSULTA REALIZADA EN EL ASIENTO N° 679 DEL RESIDENTE DE OBRA, DICHA CONSULTA NO ESPECIFICA LA PARTIDA QUE DESEA CONSULTAR POR LO QUE DEBERA REITERAR MENCIONANDO LA PARTIDA Y UBICACION DE SU CONSULTA, ACLARANDO GRAFICAMENTE DE SER NECESARIO EN DETALLE PARA MEJOR ENTENDIMIENTO LA CONSULTA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA INCOMPLETA DICHA CONSULTA. SE VERIFICAN TRABAJOS EN VIGAS METALICAS Y ...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 683 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 05/08/2026**

...s presentadas, tal como lo indica el residente de obra en su asiento n678, y corre bajo su responsabilidad la no presntacion de dicho informe, lo cual sera notificado a la entidad oportunamente de su incumplimiento.

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 674 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 01/08/2026**

...en el mes de julio 2026.se comenta lo siguiente, sobre el art 194.6 los metrados ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor. "la contratista viene incumpliendo con dicha norma en el articulo mencionado ya que se le ha conminado reiteradas veces sobre las conciliaciones mensuales y no se han efectuado, por lo que estria incumpliendo con lo estipulado en...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
