

INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en la av 24 de junio, calle 3, calle b, calle s/n, JR. Carlos pareja paz soldan, CA. Thomas alva edinson y av eduardo dibós en el aahh pampa san juan de amancaes distrito de rimac de la provincia de lima del departamento de lima - comas


PROBABILIDAD A 60 DÍAS

17.8 %

▲ RIESGO ALTO

Al corte del 31/08/2026 la obra no registra el evento formal de atraso. El modelo estima una probabilidad de **17.8 %** de que se registre la causal de demora injustificada (valorización acumulada ejecutada menor al 80 % de la programada; RLCE art. 203 / RLGCP art. 207) en los próximos 60 días si persisten los factores detectados.

En la validación con datos pasados, 17.6 % de las obras clasificadas en nivel alto registró el atraso formal dentro de 60 días, frente a un promedio general de 5.6 % (3.2 veces el promedio).




MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	112 desde 21/05/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV 24 DE JUNIO, CALLE 3, CALLE B, CALLE S/N, JR. CARLOS PAREJA PAZ SOLDAN, CA. THOMAS ALVA EDINSON Y AV EDUARDO DIBÓS EN EL AAHH PAMPA SAN JUAN DE AMANCAES DISTRITO DE RIMAC DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA - COMAS
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIMAC
Contratista	CONSORCIO LOS INCAS
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	RIMAC / LIMA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2598752
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV 24 DE JUNIO, CALLE 3, CALLE B, CALLE S/N, JR. CARLOS PAREJA PAZ SOLDAN, CA. THOMAS ALVA EDINSON Y AV EDUARDO DIBÓS EN EL AAHH PAMPA SAN JUAN DE AMANCAES DISTRITO DE RIMAC DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2394282
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 4,928,983.88
Cuaderno de obra digital	112 asientos entre 21/05/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

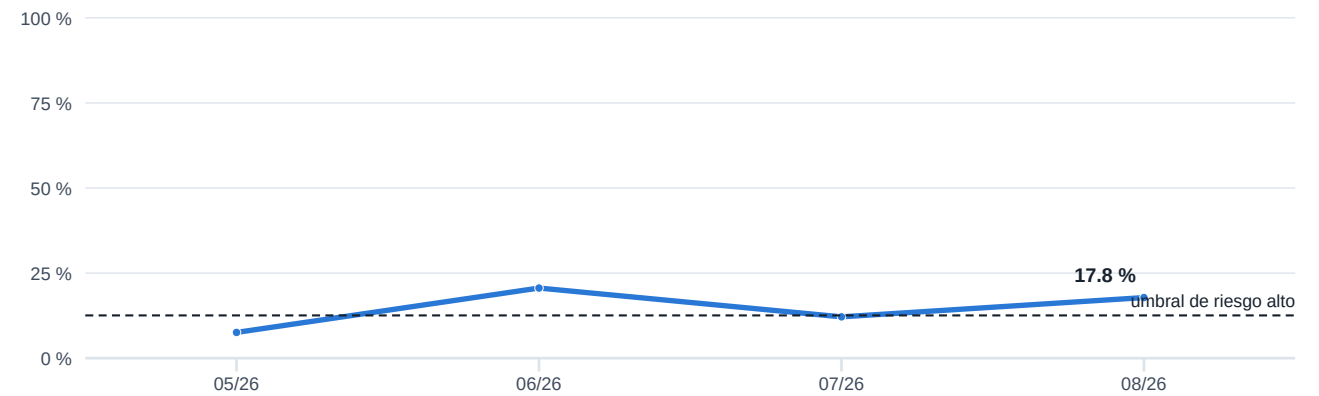

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (4 cortes, del 31/05/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.58 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.494
El 21 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.229
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.189
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.178
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.65 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.106
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona la regla del 80 % o un calendario acelerado	Contenido de los asientos		+0.097
Hubo registros en el cuaderno 20 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.092
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.092

04 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 108 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 28/08/2026

PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LOS ASIENTOS N° 104, 105 Y 106 – POSIBLE AFECTACIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA: En atención a lo comunicado por el R.O. mediante los Asientos N° 104, 105 y 106, relacionados con la afectación de partidas consecutivas y la pendiente definición técnica vinculada a la modificación de la sección vial, esta Supervisión toma conocimiento y deja registrada la situación comunicada por el Contratist...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 106 · Otras modificaciones contractuales · SOEC_RESI · 28/08/2026 <i>retraso por afectacion de partidas consecutivas y pendiente de definicion tecnica (aprobacion del adicional de obra no02) por cambio de la seccion de via-parte 3 . viene del asiento anterior....lo senalado ...</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 105 · Otras modificaciones contractuales · SOEC_RESI · 28/08/2026 <i>retraso por afectacion de partidas consecutivas y pendiente de definicion tecnica (aprobacion del adicional de obra no02) por cambio de la seccion de via-parte 2 . viene del asiento anterior...en consecuenc...</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 104 · Otras modificaciones contractuales · SOEC_RESI · 28/08/2026 <i>retraso por afectacion de partidas consecutivas y pendiente de definicion tecnica (aprobacion del adicional de obra no02) por cambio de la seccion de via-parte 1 . se comunica a la supervision que, de acuer...</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 100 · Consultas · SOEC_RESI · 27/08/2026 <i>...discrepancias durante la ejecucion de las partidas correspondientes.se solicita que dicha documentacion sea proporcionada a la brevedad, a fin de no afectar la programacion de los trabajos ni generar retrasos en la ejecucion de las actividades relacionadas con los muros de contencion.</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 98 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 25/08/2026 <i>RESPUESTA A LOS ASIENTOS N° 96 Y 97 – AFECTACIÓN ALEGADA AL PLAZO CONTRACTUAL Y RUTA CRÍTICA: De los Asientos N° 96 y 97 del Residente, mediante los cuales se comunica una presunta afectación a la secuencia constructiva y ruta crítica como consecuencia de las modificaciones técnicas señaladas por la Entidad, esta Supervisión toma conocimiento.Al respecto, se precisa que la anotación efectuada en el C.I. no determina ...</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 69 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 07/08/2026 <i>OBSERVACIÓN A CONSULTA SOBRE SEÑALIZACIÓN VERTICAL – ASIENTO N° 62 (1): En atención al Asiento N° 62 – “Consulta sobre Señalización Vertical”, mediante el cual el Residente de Obra comunica diferencias respecto de las cantidades consideradas en las partidas 02.09.01 SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA y 02.09.02 SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, proponiendo una nueva distribución y cantidad de señales verticales y adjuntando para tal e...</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 56 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 22/07/2026 <i>...iveles de ruido asi lo requieran, asi como ropa de trabajo y chaleco reflectivo de alta visibilidad. la inspeccion realiza verificaciones permanentes, disponiendo la inmediata correccion de cualquier incumplimiento detectado.</i> Fuente: cod-asientos202607.csv

05 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60_B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
