


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecucion de la obra "mejoramiento y ampliacion de los servicios de espacios publicos urbanos en el eco-parque distrito de pachacamac de la provincia de lima del departamento de lima" con CUI N°2699388

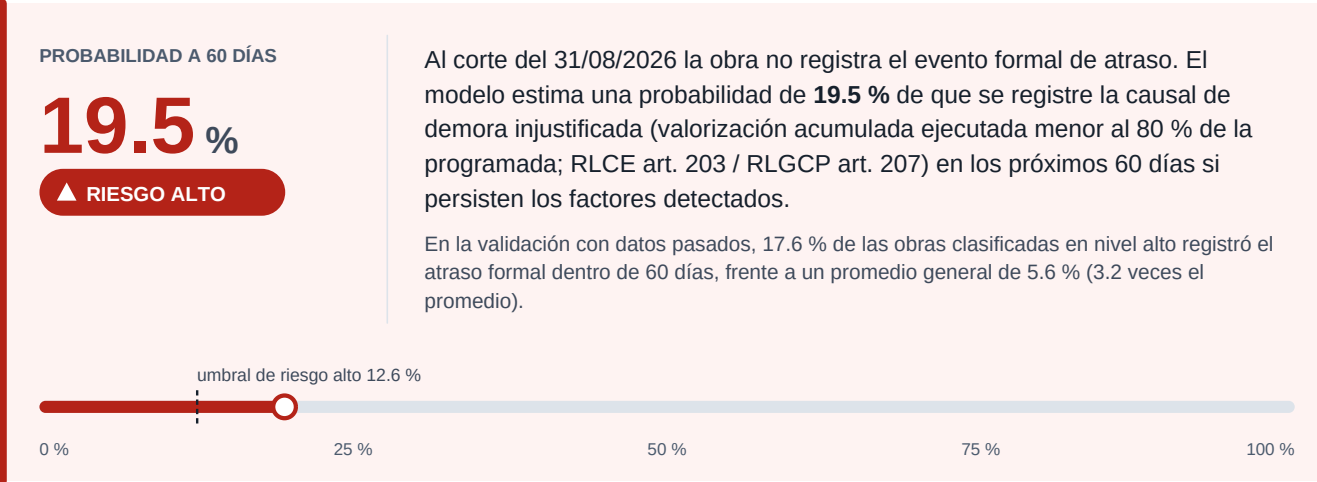


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	106 desde 09/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL ECO-PARQUE DISTRITO DE PACHACAMAC DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N°2699388
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
Contratista	CONSORCIO VILLA CONSTRUCTOR
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	PACHACAMAC / LIMA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2699388
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL ECO-PARQUE DISTRITO DE PACHACAMAC DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
Función	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Identificador del contrato (SEACE)	2404579
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 25,187,194.46
Cuaderno de obra digital	106 asientos entre 09/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

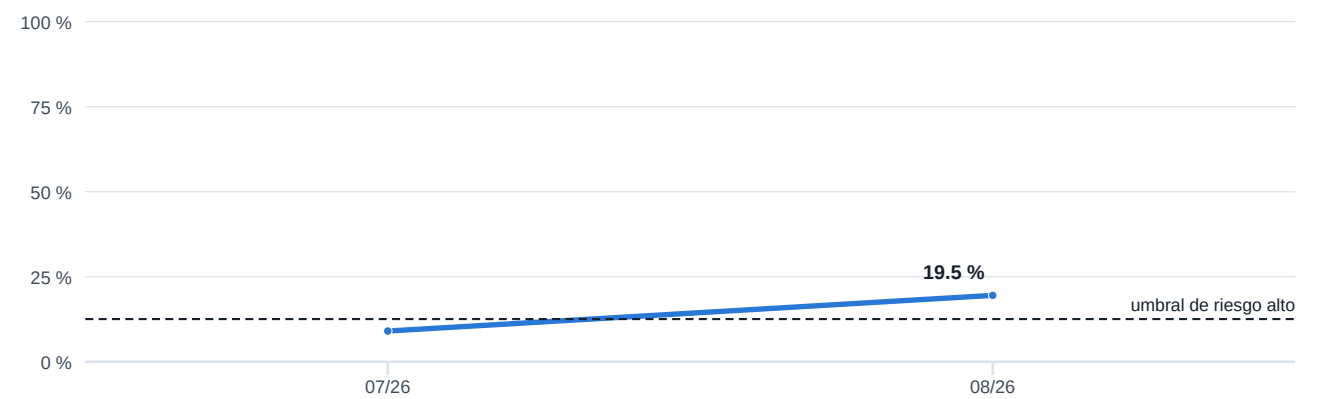

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.63 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.541
El 20 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.231
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.148
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.117
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.108
Hubo registros en el cuaderno 25 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.108
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.62 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.097
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.094

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	19.5 %	19.3 %	-0.2 pp
Absolver todas las consultas pendientes	19.5 %	19.5 %	-0.1 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 106 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 31/08/2026

...te, por lo que el impedimento existente viene afectando directamente el plazo contractual desde el 29/07/2026. el artículo 198.1 del reglamento establece que procede solicitar ampliación de plazo por atrasos y/o paralizaciones no atribuibles al contratista cuando estos modifiquen la ruta crítica. en consecuencia, al 31/08/2026 se efectúa un cierre parcial únicamente para fines de cuantificación, determi...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 104 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 31/08/2026

...lmente, se solicita la adopción de las acciones preventivas y de seguridad que correspondan, con la finalidad de garantizar la protección del personal y evitar que los hechos descritos puedan generar retrasos, interrupciones o cualquier otra afectación al normal cumplimiento de las actividades programadas en la obra

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 96 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 27/08/2026

...elleno y compactación con material afirmado, y mediante los asientos n. 65 al 67 del 17/08/2026, las interferencias existentes con viviendas y accesos en el trazo del cerco perimetrico. respecto de la demora en las absoluciones, mediante asiento n. 74 del 18/08/2026 se notifica la absolución de la consulta n. 01, sin embargo, mediante los asientos n. 75 y 76 del 19/08/2026 se dejó constancia de la demora...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 97 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 27/08/2026

...ulo 207.1 del reglamento de la ley general de contrataciones públicas, cualquier evaluación relacionada con dicho porcentaje debe considerar que la disposición se encuentra vinculada a un supuesto de retraso injustificado, por lo que una eventual desviación no puede ser atribuida automáticamente al contratista sin evaluar previamente las causas registradas, las restricciones existentes y su incidencia e...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 67 · Consultas · SOEC_RESI · 17/08/2026

CONTINUA DEL ASIENTO 66: CONSULTA N.º 13 – INTERFERENCIAS CON VIVIENDAS Y ACCESOS EXISTENTES EN EL TRAZO DEL CERCO PERIMÉTRICO – PARTIDA 11.00: Asimismo, conforme al artículo 190.4 del Reglamento de la Ley N.º 32069, si la consulta no es absuelta dentro de los plazos establecidos y dicha demora genera imposibilidad de ejecutar los trabajos materia de consulta con impacto en la ruta crítica, el Contratista podrá solici...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 50 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 14/08/2026

IMPEDIMENTO DE EJECUCIÓN DE LA PARTIDA 16.01.01.01.01 – EXCAVACIÓN DE ZANJAS, AFECTACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA E INICIO DE CAUSAL DE AMPLIACIÓN DE PLAZO: A la fecha, persiste la imposibilidad de iniciar la partida 16.01.01.01.01 – EXCAVACIÓN DE ZANJAS D=1'-1.50 M C/MAQUINARIA, cuyo inicio se encontraba programado para el 29/07/2026, debido a la presencia de material de relleno antrópico encontrado a una profundidad de 4...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 43 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 07/08/2026

ejecución de trazo y replanteo, visita de monitoreo del pnc-mvcs y comunicación de cambio de especialista en calidad. el día de la fecha se inició la jornada laboral con la charla diaria de cinco (05) minutos de seguridad y salud en el trabajo, desarrollándose el tema "trabajo en equipo". asimismo, se c...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 38 · Otras ocurrencias · SOEC_INSP · 04/08/2026

...jo responsabilidad, a fin de no afectar el adecuado control técnico de la obra ni generar retrasos en la ejecución contractual. asimismo, se deja constancia de que cualquier consecuencia derivada del incumplimiento será de exclusiva responsabilidad del contratista, conforme a las obligaciones establecidas en el contrato y la normativa vigente aplicable.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 11 · Consultas · SOEC_RESI · 24/07/2026

CONSULTA N°01 - "INTERFERENCIAS PREDIALES, ARQUITECTÓNICAS Y MÓDULO DE ESTACIONAMIENTO": -EL DÍA DE HOY, SE PRESENTÓ LA CARTA N.º 006-2026-CONSORCIO VILLA CONSTRUCTOR CON INFORME N°02/JCGC/RO, MEDIANTE LA CUAL SE FORMULA LA CONSULTA N.º 01: "INTERFERENCIAS PREDIALES, ARQUITECTÓNICAS Y MÓDULO DE ESTACIONAMIENTO", LA CUAL MENCIONA QUE, DURANTE EL REPLANTEO TOPOGRÁFICO EFECTUADO EN CAMPO, SE IDENTIFICARON INTERFERENCIA...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
