

INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Construcción del puente juana ríos y accesos


PROBABILIDAD A 60 DÍAS

19.6 %

▲ RIESGO ALTO

Al corte del 31/08/2026 la obra no registra el evento formal de atraso. El modelo estima una probabilidad de **19.6 %** de que se registre la causal de demora injustificada (valorización acumulada ejecutada menor al 80 % de la programada; RLCE art. 203 / RLGCP art. 207) en los próximos 60 días si persisten los factores detectados.

En la validación con datos pasados, 17.6 % de las obras clasificadas en nivel alto registró el atraso formal dentro de 60 días, frente a un promedio general de 5.6 % (3.2 veces el promedio).




MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	385 desde 27/08/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE JUANA RÍOS Y ACCESOS
Entidad contratante	MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Contratista	CONSORCIO 2B
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CHONGOYAPE / CHICLAYO / LAMBAYEQUE
Código Único de Inversión (CUI)	2059649
Inversión asociada	CONSTRUCCION DEL PUENTE ETEN Y ACCESOS
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2317140
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 11,952,513.00
Cuaderno de obra digital	385 asientos entre 27/08/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

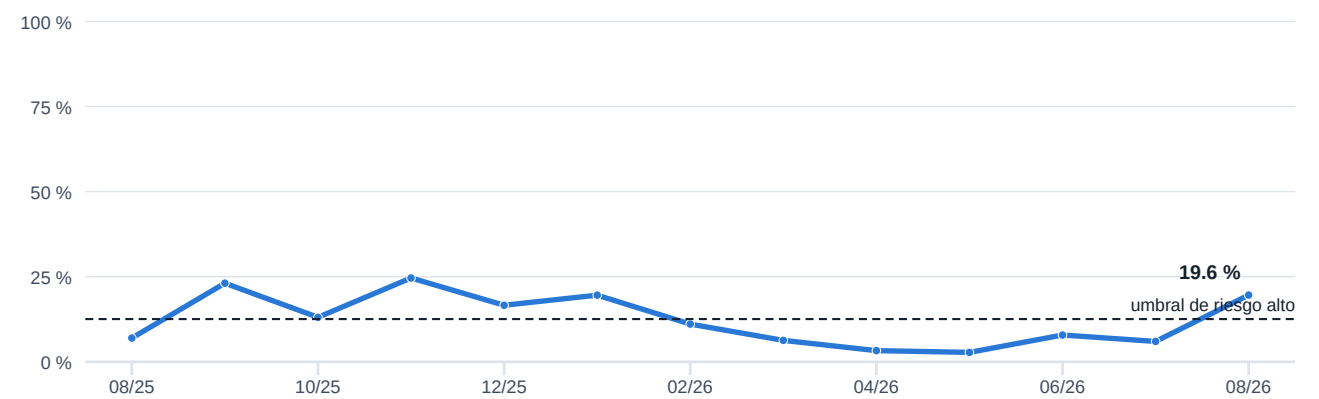

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (13 cortes, del 31/08/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.76 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.747
El 30 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.213
Departamento: Lambayeque	Características de la obra		+0.200
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.100
Extensión media de los asientos recientes: 1,434 caracteres	Contenido de los asientos		-0.077
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona la regla del 80 % o un calendario acelerado	Contenido de los asientos		+0.075
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.072
El 19 % de los asientos de los últimos 60 días menciona observaciones de calidad	Contenido de los asientos		+0.059

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	19.6 %	19.1 %	-0.5 pp
Absolver todas las consultas pendientes	19.6 %	19.1 %	-0.5 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	19.6 %	20.0 %	+0.4 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 380 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 28/08/2026

COMUNICACIONES Y RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA: - LA SUPERVISIÓN, CON CARTA N° 041-2026-CSJR/NVQH-JS DE FECHA 26/08/2026, COMUNICÓ AL CONTRATISTA QUE, SE HAN IDENTIFICADO OBSERVACIONES AL PROCEDIMIENTO DE RESANE DE LAS FISURAS IDENTIFICADAS EN LAS ALCANTARILLAS N° 03, N° 04 Y N° 06, QUE, EL CONTRATISTA DEBE ABSOLVER EN LA BREVEDAD Y PRESENTAR A LA SUPERVISIÓN, BAJO RESPONSABILIDAD.- LA SUPERVISIÓN, CON CARTA N° 042-...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 380 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 28/08/2026

...e ejecutados que se van a valorizar en cada una de las partidas ejecutadas, bajo responsabilidad.- se reitera la recomendación al contratista, incrementar mas frentes de trabajo, a fin de revertir el atraso que se tiene en la ejecución de la obra hasta el 31/07/2026, comparado con el porcentaje de avance de obra programado acumulado, considerando que, existen frentes liberados para trabajar, que son de...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 369 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

recomendaciones al contratista . - se reitera al contratista, incrementar mas frentes de trabajo, a fin de revertir el atraso de 3.80%, que se tiene en la ejecución de la obra hasta el 31/07/2026, comparado con el porcentaje de avance de obra programado acumulado, considerando que, existen frentes liberados para trabajar, como: en l...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 370 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

...nado con la ejecución de los pilotes en el pilar derecho que corresponden a la prestación adicional de obra no 01 y presupuesto contractual, bajo responsabilidad.- se comunica al contratista que, la demora en el inicio de ejecución de los trabajos en las actividades liberadas anteriormente por la supervisión, no es causal de ampliación de plazo por el inicio tardío y la demora en la ejecución, por lo q...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 369 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026

recomendaciones al contratista . - se reitera al contratista, incrementar mas frentes de trabajo, a fin de revertir el atraso de 3.80%, que se tiene en la ejecución de la obra hasta el 31/07/2026, comparado con el porcentaje de avance de obra programado acumulado, considerando que, existen frentes liberados para trabajar, ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 366 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/08/2026

...anulares y todo el material necesario para la preparación de todos los diseños de concreto, bajo responsabilidad.- en caso que, el contratista haga caso omiso a la recomendación de la supervisión, el atraso o demora en la ejecución de esas partidas, será responsabilidad única y exclusiva del contratista, que no conllevará a ninguna ampliación de plazo, bajo responsabilidad.- se reitera al contratista, i...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 364 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/08/2026

COMUNICACIONES Y RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA: - LA SUPERVISIÓN, CON CARTA N° 021-2026-CSJR/NVQH-JS DE FECHA 14/08/2026, COMUNICÓ AL CONTRATISTA QUE, SE HAN IDENTIFICADO OBSERVACIONES A LOS PLANOS DE REPLANTEO, PARA LA EJECUCIÓN DE LA EXCAVACIÓN DE LA ZAPATA EN EL PILAR DERECHO, QUE DEBE SER ABSUELTO EN LA BREVEDAD, BAJO RESPONSABILIDAD.- LA SUPERVISIÓN, CON CARTA N° 022-2026-CSJR/NVQH-JS DE FECHA 14/08/2026, COMUN...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 355 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 12/08/2026 RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA PRESENTAR PLANOS DE DESPIECE DE ACERO: - EL CONTRATISTA, DEBE ELABORAR UNA MATRIZ DE RIESGOS, DONDE DEBE CONSIDERAR TODAS LAS DIFICULTADES E INTERFERENCIAS QUE EXISTE PARA EJECUTAR ALGUNA ACTIVIDAD, COMO: ALCANTARILLAS, CANALES, ACCESO DERECHO, ACCESO IZQUIERDO, EXCAVACIÓN EN LA ZAPATA DEL PILAR DERECHO, DESCABEZADO DE PILOTES EN EL PILAR DERECHO Y PILAR IZQUIERDO, DESCABEZADO DE PILOTE... Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 354 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 12/08/2026 ...de julio del 2026, fue de 2.11% y el porcentaje de avance ejecutado acumulado al 31 de julio del 2026 19.84%. - el porcentaje comparativo entre lo programado y lo ejecutado, es del 83.87%, superior al 80%, por lo que, no se solicita al contratista un calendario acelerado, sin embargo, si debe presentar la programacion mensual, donde se evidencie la recuperacion del atraso, equivalente a 3.80%. - por lo... Fuente: cod-asientos202608.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
