

INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion para la ejecucion de la obra: Creacion del parque recreativo en la asociación de vivienda villa colonial, distrito de coronel gregorio albarracin lanchipa - tacna - tacna

PROBABILIDAD A 60 DÍAS

14.4 %

▲ RIESGO ALTO

Al corte del 31/08/2026 la obra no registra el evento formal de atraso. El modelo estima una probabilidad de **14.4 %** de que se registre la causal de demora injustificada (valorización acumulada ejecutada menor al 80 % de la programada; RLCE art. 203 / RLGCP art. 207) en los próximos 60 días si persisten los factores detectados.

En la validación con datos pasados, 17.6 % de las obras clasificadas en nivel alto registró el atraso formal dentro de 60 días, frente a un promedio general de 5.6 % (3.2 veces el promedio).

umbral de riesgo alto 12.6 %

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	71 desde 22/06/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DEL PARQUE RECREATIVO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA COLONIAL, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
Contratista	CONSORCIO VILLA COLONIAL
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA / TACNA / TACNA
Código Único de Inversión (CUI)	2180049
Inversión asociada	CREACION DEL PARQUE RECREATIVO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA COLONIAL, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA
Función	CULTURA Y DEPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2398505
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 2,921,623.00
Cuaderno de obra digital	71 asientos entre 22/06/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

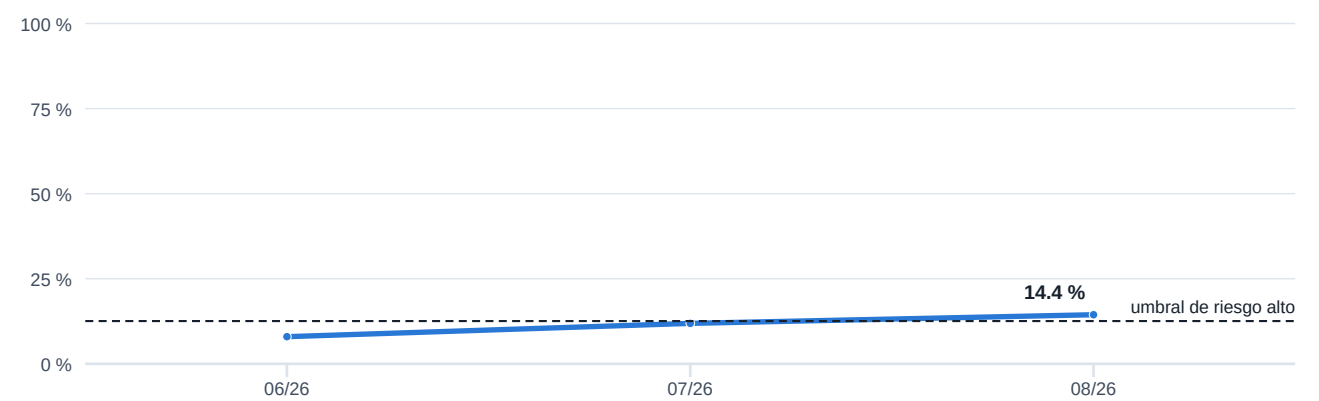

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.66 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.672
Departamento: Tacna	Características de la obra		+0.221
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.208
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.70 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.138
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.102
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.085
Extensión media de los asientos recientes: 1,103 caracteres	Contenido de los asientos		-0.065
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 7,240	Ejecución del gasto (SIAF)		+0.057

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	14.4 %	14.4 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 44 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/07/2026

...os veintiseis (26) días calendario indicados por la residencia en el asiento n 42, se le reitera que es de su estricta y exclusiva responsabilidad sustentar mediante el respectivo expediente sobre la demora que se ha generado en afectación real a la ruta crítica del calendario de obra vigente. de considerar pertinente solicitar una ampliación de plazo, deberá cenirse estrictamente a los plazos, formalid...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 42 · Respuestas a consultas · SOEC_RESI · 21/07/2026

RATIFICACION DE PARTE DE LA ENTIDAD LA ABSOLUCION DE COMPLEMENTARIA DE LA CONSULTA DE OBRA N° 01: Se comunica al Supervisor de Obra que con fecha 21/07/2026, la Entidad ha remitido al CONSORCIO VILLA COLONIAL la CARTA N° 1420-2026-GEI/MDCGAL, mediante la cual se ratifica la absolución complementaria de la Consulta de Obra N° 01, relacionada a las partidas estructurales correspondientes a Zapata Z-1, Columna C-1 y Col...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 42 · Respuestas a consultas · SOEC_RESI · 21/07/2026

...on de la consulta (25/06/2026) y la absolución total ratificada por la entidad (21/07/2026) es de veintiseis (26) días calendario, plazo que será evaluado por esta residencia para determinar si dicha demora ha generado o no afectación a la ruta crítica del calendario de obra vigente a fin de determinar si procede la formulación de la solicitud de ampliación de plazo correspondiente, conforme a lo establ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 34 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/07/2026

RATIFICACION DE ABSOLUCION DE CONSULTA DE OBRA N°01: SE TOMÓ CONOCIMIENTO DE LO ANOTADO POR LA RESIDENCIA CON RESPECTO A LOS CATORCE (14) DÍAS CALENDARIO TRANSCURRIDOS PARA LA EMISIÓN DE LA CARTA N°1318-2026-GEI/MDCGAL POR PARTE DE LA ENTIDAD. AL RESPECTO, ESTA SUPERVISIÓN INDICA QUE, EN CASO EL CONTRATISTA DETECTE QUE DICHA ABSOLUCIÓN AFECTE PARTIDAS DE LA RUTA CRÍTICA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA VIGENTE, DEBE...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 31 · Consultas · SOEC_RESI · 10/07/2026

SOLICITO ABSOLUCIÓN COMPLEMENTARIA DE LA CONSULTA DE OBRA N° 01, POR ABSOLUCIÓN PARCIAL, INCOMPLETA E IMPRECISA: Se deja constancia que luego de revisado la CARTA N° 1318-2026-GEI/MDCGAL, de fecha 09/07/2026 mediante la cual la Entidad comunica la ratificación del pronunciamiento y absolución de la Consulta de Obra N° 01, se observa lo siguiente:1. Respecto a la Consulta N°1 (Zapata Z-1): El pronunciamiento señala qu...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 30 · Respuestas a consultas · SOEC_RESI · 10/07/2026

... de la consulta (25/06/2026) y la absolución ratificada por la entidad (09/07/2026) asciende a catorce (14) días calendario, plazo que deberá ser evaluado por esta residencia para determinar si dicha demora ha generado o no afectación a la ruta crítica del calendario de obra vigente.asimismo, con la absolución de consulta se ha ampliado procedimientos constructivos que por ende genera mayores metrados q...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
