


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución de saldo de obra: Intervención en reconstrucción mediante inversiones-iri- en la IE N° 20073 del C.P. La campiña, distrito de catacaos, provincia de piura, región piura. CI 413500, fur N° 2465277.

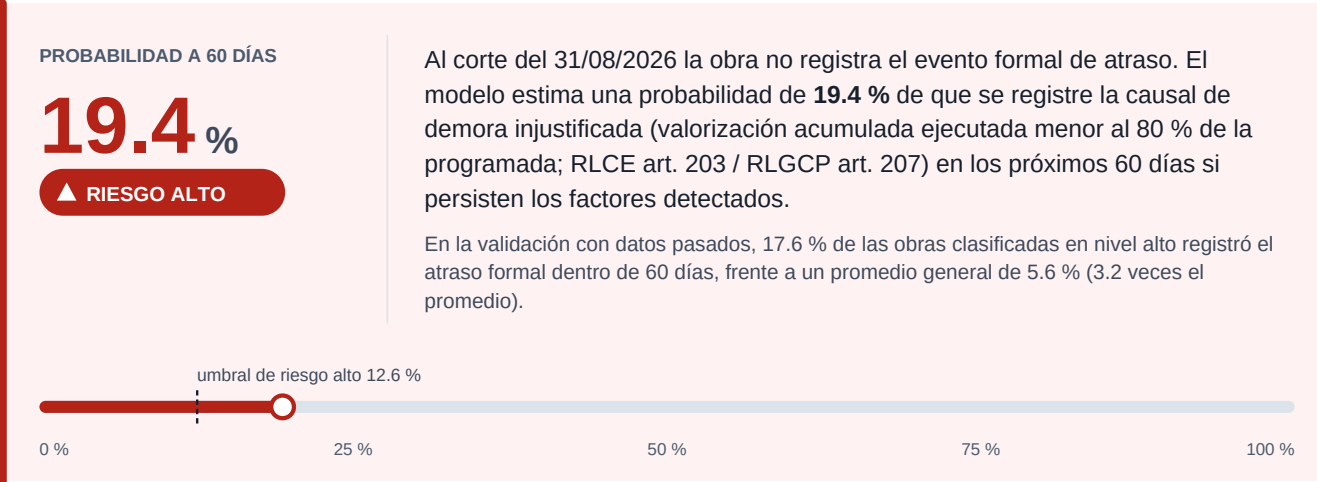


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 3,577,505.35	191 días	49 desde 22/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES-IRI- EN LA IE N° 20073 DEL C.P. LA CAMPIÑA, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 413500, FUR N° 2465277.
Entidad contratante	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Contratista	CONSORCIO EJECUTOR CPR
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CATACAOS / PIURA / PIURA
Código Único de Inversión (CUI)	2465277
Inversión asociada	IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 413500
Función	EDUCACIÓN
Identificador del contrato (SEACE)	2406248
Monto del contrato	S/ 3,577,505.35
Monto aprobado de la inversión	S/ 4,216,446.85
Cuaderno de obra digital	49 asientos entre 22/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

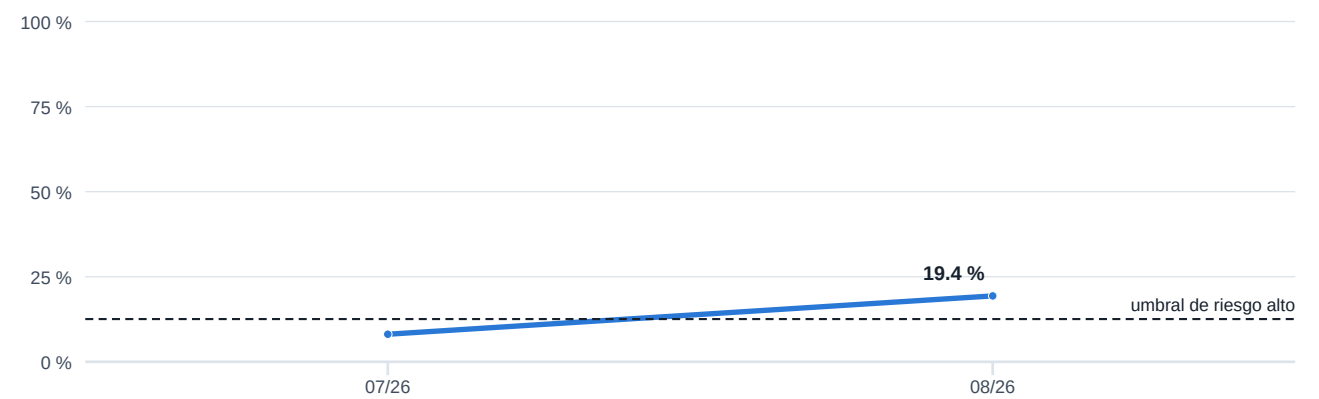

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.62 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.670
El 69 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.220
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.166
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.151
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.127
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.57 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.105
Entidad contratante: programa nacional	Características de la obra		+0.104
Departamento: Piura	Características de la obra		-0.097

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	19.4 %	20.1 %	+0.7 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 25 · Participación del personal clave · SOEC_SPV · 17/08/2026

...nuevo residente a dar estricto cumplimiento al calendario de avance de obra vigente, las especificaciones técnicas del expediente y las normas de seguridad aplicables para mitigar cualquier riesgo de retraso o penalidades contractuales.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 25 · Participación del personal clave · SOEC_SPV · 17/08/2026

...dente a dar estricto cumplimiento al calendario de avance de obra vigente, las especificaciones técnicas del expediente y las normas de seguridad aplicables para mitigar cualquier riesgo de retraso o penalidades contractuales.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 21 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 14/08/2026

...operario de pintura.con fecha 13.08.2026 la supervision mediante carta n018-2026/so/rsdq/takeshisac comunica al contratista sobre la aprobacion del plan de trabajo de la contratista y notificacion de penalidad aplicable segun terminos de referencia (tdr).con fecha 13.08.2026 la supervision mediante carta n143-2026/takeshisac comunica a la entidad sobre la aprobacion del plan de trabajo de la contratista y ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 20 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 13/08/2026

...eal en un laboratorio acreditado y, posteriormente, repetir las pruebas de densidad de campo en presencia de la supervision en el tramo 01 y 02 del cerco perimetrico nuevo.se remarca que los costos y retrasos derivados de esta accion son de entera responsabilidad del contratista de acuerdo al tdr y contrato.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 16 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 10/08/2026

ACTIVIDADES FÍSICAS EN OBRA: Se continua con el ?retiro de juntas asfáltica en patio y exteriores de aulas del bloque 01, 02 y 03, limpieza en obra.Se recibe la programación de ejecución semanal correspondiente del 10 al 15.08.2026 del contratista el cual debe cumplir dicha programación, está Supervisión realizara el monitoreo y control.Se solicita al contratista en presentar con urgencia: Plan de Trabajo, Plan de SS...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 17 · Participación del personal clave · SOEC_SPV · 10/08/2026

SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA: Se solicita al contratista de manera obligatoria la presentación del Cronograma de Permanencia y Participación del Personal Clave de acuerdo al expediente técnico y TDR, dicho documento es indispensable para que esta Supervisión pueda verificar, controlar y asegurar el cumplimiento efectivo de los porcentajes de participación técnica ofertados en su propuesta...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 6 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 28/07/2026

ACTIVIDADES EN OBRA: Con fecha 27/07/2026 la Supervisión participo en el ensayo de comprensión de los testigos o muestras de corazones diamantados, con el fin de obtener los resultados y seguidamente elevar un informe a la entidad de acuerdo al tiempo estipulado en el TDR de la Supervisión, se remarca que la extracción de testigos de diamantina se efectuó el día 22/07/2026 en el Bloque 03 de la I.E. 20073 – La Campiñ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
