


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento y ampliacion del servicio de formación de pregrado en educación superior universitaria en las escuelas profesionales de contabilidad, auditoria empresarial y del sector público, gestión tributaria , y presupuesto y finanzas públicas de la facultad de ciencias contables de la universidad nacional mayor de san marcos distrito de lima de la provincia de lima del departamento de lima

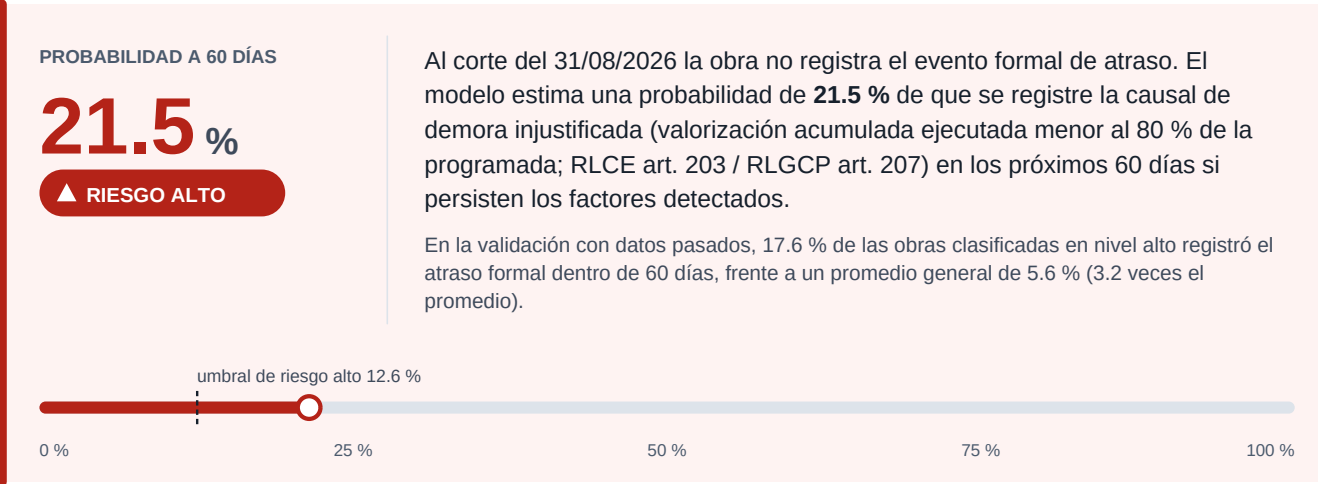

MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 34,648,710.12	300 días	279 desde 14/01/2026	31/08/2026


01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA EMPRESARIAL Y DEL SECTOR PÚBLICO, GESTIÓN TRIBUTARIA , Y PRESUPUESTO Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS DISTRITO DE LIMA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
Entidad contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Contratista	CONSORCIO CONTABILIDAD
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	LIMA / LIMA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2643175
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA EMPRESARIAL Y DEL SECTOR PÚBLICO, GESTIÓN TRIBUTARIA , Y PRESUPUESTO Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS DISTRITO DE LIMA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
Función	EDUCACIÓN
Identificador del contrato (SEACE)	2371787

Monto del contrato	S/ 34,648,710.12
Monto aprobado de la inversión	S/ 96,956,846.00
Cuaderno de obra digital	279 asientos entre 14/01/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

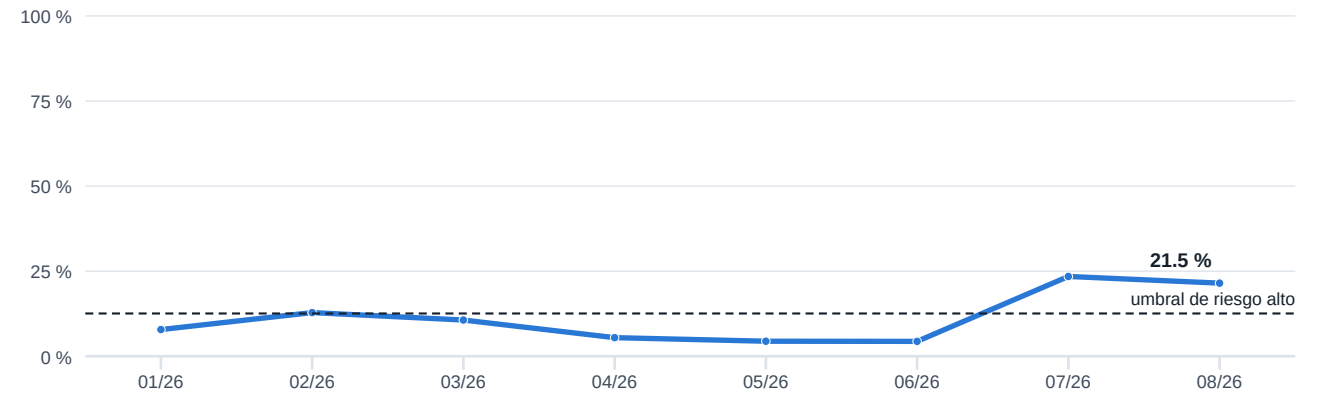

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (8 cortes, del 31/01/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.72 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.678
El 18 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.240
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.185
El 4 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.154
Faltan 86 días para el fin del plazo original	Datos del contrato		+0.137
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.68 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.121
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.111
Extensión media de los asientos recientes: 1,386 caracteres	Contenido de los asientos		-0.094

04 **Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)**

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	21.5 %	21.2 %	-0.3 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	21.5 %	21.9 %	+0.4 pp
Absolver todas las consultas pendientes	21.5 %	22.6 %	+1.1 pp

05 **Evidencia documental**

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 275 · Consultas · SOEC_RESI · 28/08/2026 <i>...presentes consultas deberan ser atendidas conforme el procedimiento establecido en el artiuclro 190 del reglamento de la ley n 32069 ley general de contrataciones publicas, de tal manera de no generar atrasos y/o paralizaciones por afectacion de la ruta critica del programa de obra vigente.</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 270 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 28/08/2026 <i>...de avance programado acumulado establecido en el calendario de avance de obra valorizado vigente por motivos que no son nuestra responsabilidad, configurandose igualmente como el mes de julio 2026 un atraso o retraso justificado.asimsimo, debemos indicar que la absolucion de la consulta formulada en el asiento n 23 refreido a acero en placas, estas han sido absueltas de manera parcial estableciendose m...</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 262 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 18/08/2026 <i>...8/2026 la supervision de obra ha remitido a la entidad la conformidad de la prestacion adicional de obra n02 y deductivo vinculante n02, para su evaluacion y aprobacion mediante acto resolutivo.4) el atraso que se viene presentando en la ejecucion de partidas contractuales y del adicional n02 en el presente mes de agosto 2026, se configura como atraso justificado del contratista, situacion que se consi...</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 261 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 18/08/2026 <i>...e se continua con la imposibilidad de poder continua con la ejecucion de las partidas criticas del contrato principal asi como de la prestacion adicional n 01, al no concluirse la causal invocada por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, establecida en el literal a) del numeral 198.1 del articulo 198 del reglamento de la ley n 32069 ley de contrataciones publicas, aprobad...</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 243 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 12/08/2026 <i>... observaciones de campo en materia de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente solicitandonos realizar el levantamiento de las observaciones descritas en un plazo no mayor a 72 horas, en caso de incumplimiento seran de aplicacion las penalidades correspondientes. continua en el siguiente asiento</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 235 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026 <i>...das las observaciones alcanzadas se encuentran alineadas en cumplimiento de la normativa sectorial vigente, la cual debe aplicarse durante todo el desarrollo de la obra. se le recuerda que en caso de incumplimiento en el levantamiento de las observaciones seran de aplicacion las penalidades correspondientes.se adjunta informe n004-2026-unmsm contabilidad/ing.iaar</i> Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 235 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026 REMITO OBSERVACIONES DEL AREA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL Y SOBRE COMPONENTE DE MITIGACION AMBIENTAL: Al contratista Consorcio Contabilidad, mediante INFORME N°004-2026-UNMSM CONTABILIDAD/ING.IARR de la Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional de la Supervisión se le remite OBSERVACIONES DEL AREA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL Y SOBRE EL COMPONENTE DE MITIGACION AMBIENTAL, debien... Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 218 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 04/08/2026 INFORME DE IMPOSIBILIDAD DEL CONSORCIO CONTABILIDAD DE CUMPLIR CON EL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO Y AFECTACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA VIGENTE PARA LA VALORIZACIÓN AL MES DE JULIO DE 2026, CALIFICANDOSE COMO ATRASO JUSTIFICADO: Mediante CARTA N°077-2026-CONSORCIO CONTABILIDAD/LP04 de fecha 03/08/2026 el Contratista Consorcio Contabilidad emitida al correo electrónico de la Sup... Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 215 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 03/08/2026 ...orizacion correspondiente al mes de julio de 2026, el avance fisico acumulado de la obra presenta un desfase de retraso respecto del avance acumulado programado, situacion originadaexclusivamente por incumplimiento por parte de la entidad contratante en la demora en la absolucion de consultas formuladas mediante asiento del cuaderno incidencias de obras, las mismas que se comunicaron de manera oportuna, ... Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 214 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 03/08/2026 ...orizacion correspondiente al mes de julio de 2026, el avance fisico acumulado de la obra presenta un desfase de retraso respecto del avance acumulado programado, situacion originadaexclusivamente por incumplimiento por parte de la entidad contratante en la demora en la absolucion de consultas formuladas mediante asiento del cuaderno incidencias de obras, las mismas que se comunicaron de manera oportuna, ... Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 187 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 22/07/2026 SOLICITA INFORMACION IMPORTANTE.: Al contratista CONSORCIO CONTABILIDAD, mediante CARTA N°002-2026/ING.EARC.SO de fecha 22 de julio del 2026, la Supervisión de obra en cumplimiento de sus funciones establecidas en las Bases Integradas y a lo indicado en el Artículo 187 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°009-2025-EF, solicita alcanzar a la Supervisión de Obra la información que se detalla en la Carta adju... Fuente: cod-asientos202607.csv
INFOBRAS · - Días para el fin programado original: 86

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
