


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Contratacion de ejecucion de obra del proyecto mejoramiento y ampliacion de los servicios de salud del puesto de salud puyca-provincia de la union departamento de arequipa CUI 2535597

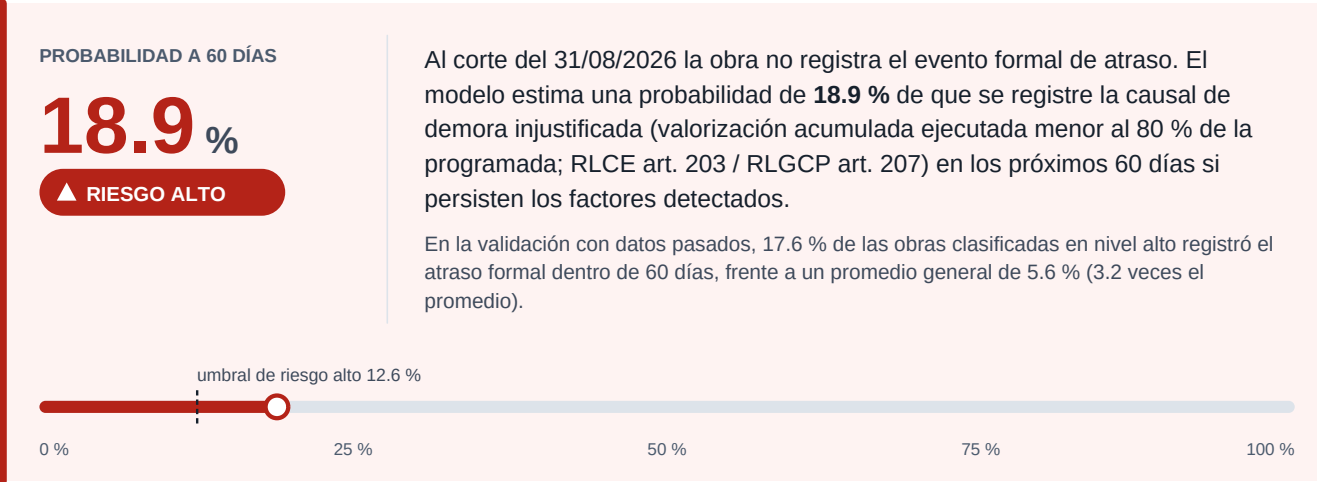


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	73 desde 09/06/2026	30/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PUYCA-PROVINCIA DE LA UNION DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CUI 2535597
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central
Contratista	CONSORCIO GABRIEL
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	PUYCA / LA UNION / AREQUIPA
Código Único de Inversión (CUI)	2535597
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PUYCA DISTRITO DE PUYCA - PROVINCIA DE LA UNION - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Función	SALUD
Identificador del contrato (SEACE)	2395111
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 4,200,495.14
Cuaderno de obra digital	73 asientos entre 09/06/2026 y 30/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

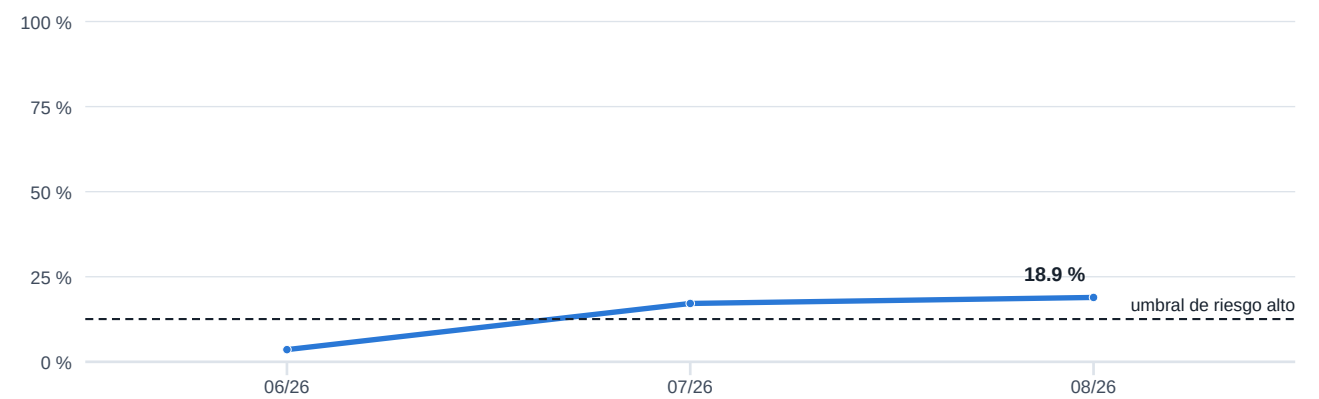

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.59 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.591
El 10 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.293
El 13 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.210
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.189
Departamento: Arequipa	Características de la obra		+0.156
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 3,826,434	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.107
El último asiento se registró hace 1 día	Actividad del cuaderno de obra		+0.100
Hubo registros en el cuaderno 19 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.095

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	18.9 %	18.7 %	-0.2 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	18.9 %	18.9 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 69 · Consultas · SOEC_RESI · 26/08/2026

...on no constituye un elemento sustancial que altere la funcionalidad, resistencia, calidad ni diseño del cielo raso, manteniéndose inalteradas las propiedades acústicas, dimensionales y de acabado. la demora en la incorporación del perfil original afectará a un mas, el cronograma de obra, en especial considerando que se trabaja bajo el plan de contingencia, sin margen de espera para plazos de importación...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 66 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 25/08/2026

...ectivos. la documentación entregada contiene el expediente completo subsanado, ajustado a las observaciones planteadas y al marco normativo vigente, incluyendo la precisión respecto a la aplicación de penalidades conforme a la normativa de contrataciones del estado y las funciones del inspector/supervisor de obra. la recepción física fue realizada por la supervisión el mismo 24 de agosto de 2026 a horas 5.00...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 56 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 20/08/2026

...llo, dejamos constancia que el contratista ha cumplido con todo lo indicado en la normativa, en cuanto a plazos y procedimientos. el pronunciamiento de la supervisión confirma la necesidad, sin que la demora en su emisión sea responsabilidad del contratista. por lo expuesto en aplicación del numeral 194.2 ítem a, comunicamos la necesidad de ejecutar prestación adicional de obra, a fin de poder implementar ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 46 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 15/08/2026

...ue no cumplan con las ee. tt del expediente técnico y no se realice las pruebas o ensayos necesarios y que no cuenten con certificados de calidad previo a su utilización es una causal de aplicación de penalidad conforme el contrato de ejecución de obra. - se verifica la colocación de correas metálicas 25x25x1.5mm en el área de toma de muestras y pruebas rápidas del tercer piso del bloque 1 área 1 del plan d...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 41 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 14/08/2026

RESPUESTA AL ASIENTO N.º 39 DEL SUPERVISOR – OBSERVACIONES SOBRE PERSONAL CLAVE /NO CLAVE Y ESPECIALISTA DE SEGURIDAD.: En respuesta al asiento N.º 39 registrado por la Supervisión con fecha 13 de agosto de 2026, respecto a la presunta falta de presentación de la relación de personal clave y no clave, así como la ausencia del especialista de seguridad en el cronograma de obra, se manifiesta lo siguiente: 1.- Sobre el Per...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 43 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 14/08/2026

RPTA ASIENTO N.º 42 DEL RESIDENTE DE OBRA: - RESPECTO A LO INDICADO POR EL RESIDENTE DE OBRA, CABE PRECISAR QUE, CONFORME LO INDICADO EL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y MEDIO AMBIENTE NO FIGURA COMO PERSONAL CLAVE EN LAS BASES INTEGRADAS, SIN EMBARGO, EN EL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES SE ACREDITA SU PARTICIPACIÓN AL 100%, ASIMISMO, TENER EN CONSIDERACIÓN QUE, EN LA CLÁUSULA CONTRACTUAL DÉCIMA QUINTA: PENALID...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 43 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 14/08/2026

...clave en las bases integradas, sin embargo, en el desagregado de gastos generales se acredita su participación al 100%, asimismo, tener en consideración que, en la cláusula contractual décima quinta: penalidades del contrato n 72-2026-gra señala que en caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.- en ese sentido, se ha solicit...

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 41 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 14/08/2026**

...ormacion que no fue requerida en el proceso de contratacion. el personal de apoyo y operativo sera asignado por el contratista segun sus necesidades internas y el avance de la obra, sin perjuicio del incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 41 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 14/08/2026**

...idad. . en respuesta al asiento n39 registrado por la supervision con fecha 13 de agosto de 2026, respecto a la presunta falta de presentacion de la relacion de personal clava y no clave, asi como la ausencia del especialista de seguridad en el cronograma de obra, se manifiesta lo siguiente:1.- sobre el personal clave y su cronograma de participacion la revision de las bases integradas , el contrato n72-2026-gra y el expe...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 32 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 10/08/2026**

...de agosto del 2026- se verifica al 31 de julio del 2026, un avance fisico acumulado de 1.30% conforme lo informado por la contratista y un avance programado acumulado de 3.03%, lo cual, manifiesta un retraso de -1.70% y un porcentaje de atraso de 42.90% en funcion del avance acumulado programado, en ese sentido, la obra se encuentra en atraso.

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 27 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 31/07/2026**

...a la autorizacion para elaborar el expediente tecnico de adicional y deductivo vinculante, requisito indispensable para efectuar modificaciones al expediente tecnico vigente.3.- esta situacion genera retrasos sin responsabilidad alguna del contratista, quedando a la espera de la respuesta formal por parte del gobierno regional de arequipa.

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 22 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 24/07/2026**

CONSTANCIA DE VENCIMIENTO DE PLAZO DE ABSOLUCION DE CONSULTATECNICA,AFECTACION A RUTA CRITICA Y CONFIGURACION DE CAUSAL DE AMPLIACION DE PLAZO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA: Mediante los asientos N° 11 y 12 del cuaderno de obra, de fecha 03.07.2026, contratista formuló una consulta técnica crucial sobre el plan de contingencia. Conforme al artículo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE), la E...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
