


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Servicio de ejecución de obra: Mejoramiento y ampliación del servicio de transitabilidad vial interurbana en trayecto APP-557 casacancha a huayllapata distrito de talavera de la provincia de andahuaylas del departamento de apurímac

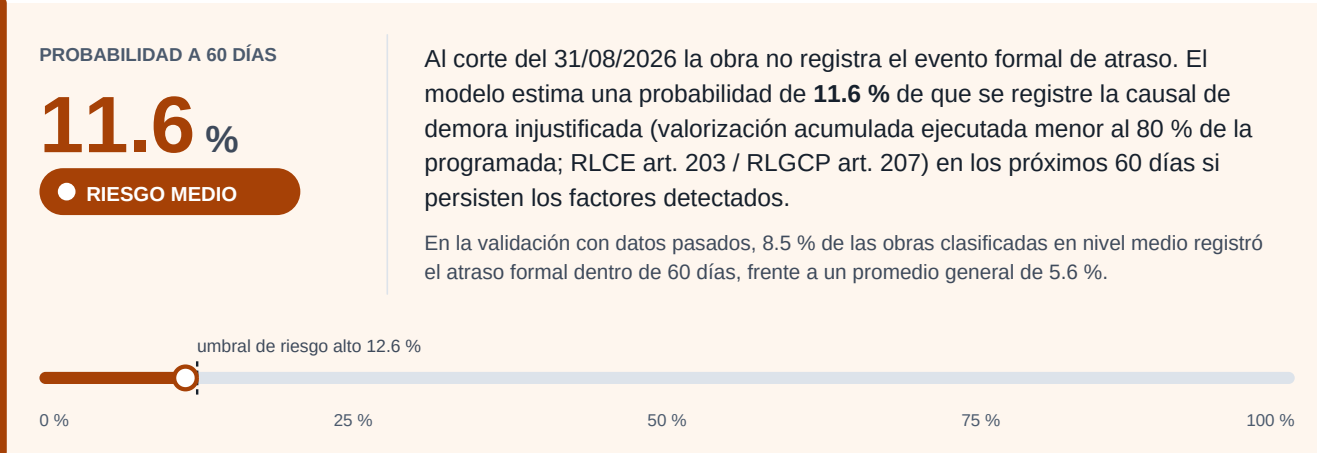


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	266 desde 24/02/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TRAYECTO APP-557 CASACANCHA A HUAYLLAPATA DISTRITO DE TALAVERA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
Contratista	CONSORCIO VIAL TALAVERA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	TALAVERA / ANDAHUAYLAS / APURIMAC
Código Único de Inversión (CUI)	2642066
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TRAYECTO APP-557 CASACANCHA A HUAYLLAPATA DISTRITO DE TALAVERA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2371622
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 1,225,922.17
Cuaderno de obra digital	266 asientos entre 24/02/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

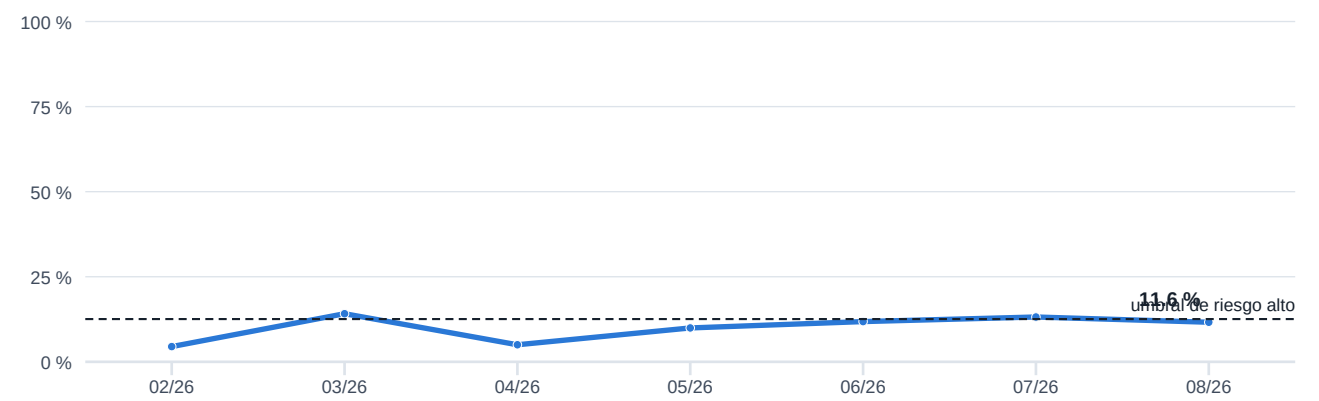

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (7 cortes, del 28/02/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.55 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.495
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.212
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.195
Hubo registros en el cuaderno 24 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.124
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.108
Extensión media de los asientos recientes: 1,372 caracteres	Contenido de los asientos		-0.078
Departamento: Apurímac	Características de la obra		-0.065
51 asientos registrados en los últimos 30 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.044

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	11.6 %	11.6 %	+0.0 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	11.6 %	11.6 %	+0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	11.6 %	11.9 %	+0.3 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 260 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 27/08/2026

...rabajos, priorizando las actividades necesarias para asegurar la culminacion de la obra dentro del plazo contractual vigente, debiendo adoptar las medidas tecnicas y operativas necesarias para evitar retrasos y garantizar el cumplimiento de las metas previstas.finalmente, la supervision deja constancia que continuara realizando el control y seguimiento de la ejecucion.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 248 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/08/2026

...rganizacion y disponibilidad de personal, materiales, equipos y demas recursos necesarios, a fin de mantener la ejecucion de los trabajos conforme al cronograma vigente de ejecucion de obra, evitando retrasos que puedan afectar el cumplimiento de las metas fisicas programadas.finalmente, se deja constancia que corresponde al contratista adoptar las acciones necesarias para garantizar la continuidad y ad...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 222 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 06/08/2026

...on parcial de la obra, de generacion de tiempos improductivos, de perdida de rendimiento de los recursos asignados, de alteracion de la secuencia constructiva, de interferencias entre actividades, de incumplimiento del cronograma de ejecucion y de afectacion del equilibrio economico del contrato.en ese contexto, se deja constancia que corresponde a la supervision emitir oportunamente la alerta de riesgo ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 214 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 01/08/2026

reiteracion de pronunciamiento sobre mayores metrados n. 01 y adicional de obra n. 02 demora de la entidad y afectacion del plazo contractual . asunto: reiteracion de pronunciamiento sobre mayores metrados n. 01 y adicional de obra n. 02 afectacion del plazo contractualse deja expresa y feha...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 211 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 30/07/2026

...amente las incidencias suscitadas.2. en horas de la manana, el personal obrero se traslado a las instalaciones de la municipalidad distrital de talavera con la finalidad de efectuar el reclamo por el incumplimiento en el pago de la valorizacion correspondiente. dicha situacion obedecio a una problematica generada por la demora en los pagos por parte de la entidad, circunstancia que afecta directamente la...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 210 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 30/07/2026

otras ocurrencias . en la fecha, se deja constancia que el personal obrero de la obra se constituyo en las instalaciones de la entidad con la finalidad de formular su reclamo por el incumplimiento en el pago de sus remuneraciones correspondientes al ultimo periodo laborado.al respecto, esta residencia de obra tomo conocimiento de que el contratista manifiesta que la falta de pago al per...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 211 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 30/07/2026

...ipalidad distrital de talavera con la finalidad de efectuar el reclamo por el incumplimiento en el pago de la valorizacion correspondiente. dicha situacion obedecio a una problematica generada por la demora en los pagos por parte de la entidad, circunstancia que afecta directamente la continuidad de la ejecucion de la obra y la permanencia del personal en los frentes de trabajo.3. en ese contexto, corre...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 195 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/07/2026

OTRAS OCURRENCIAS: Constatación de los Hechos: La Supervisión deja constancia de que también ha verificado in situ la existencia de las instalaciones eléctricas domiciliarias con gálibo reducido y la ocurrencia reportada.Sustento Técnico Previo: La gestión formal ante la Entidad o la concesionaria (Electro Sur Este S.A.A.) se impulsará a partir de que el Contratista presente a la Supervisión un informe técnico especí...

Fuente: cod-asientos202607.csv

- Asiento N.º 194 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 20/07/2026**

...ectadas por la existencia de instalaciones electricas domiciliarias ejecutadas por electro sur este s.a.a., las cuales presentan un galibo insuficiente, con alturas aproximadas entre 1.80 m y 2.00 m, incumpliendo las condiciones minimas requeridas para el transito seguro de maquinaria pesada destinada a la ejecucion de la obra.como consecuencia de esta deficiencia, durante el desplazamiento de los equipo...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 183 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 13/07/2026**

RESPUESTA A ASIENTO N° 182 Y DISPOSICIONES DE SUPERVISIÓN: En respuesta al Asiento N° 182 del Residente de Obra, la Supervisión precisa que la "normal ejecución" de la partida de afirmado está supeditada al estricto cumplimiento de las siguientes disposiciones:1. Seguridad y Seguros: Ante el reciente ingreso de personal nuevo y maquinaria pesada (rodillo, cisterna, motoniveladora) para las actividades de afirmado, se...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
