


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución de la obra: ¿mejoramiento del servicio de custodia y disposición de la sunat para bienes y mercancías en lima¿ ¿ CUI 2300859

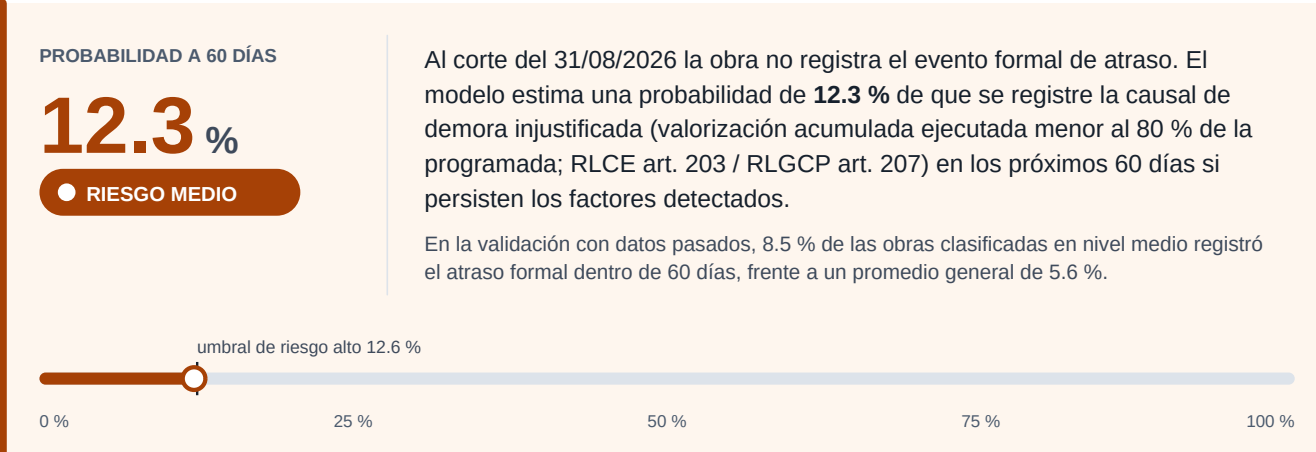


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 141,073,655.24	570 días	1,278 desde 02/09/2024	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CUSTODIA Y DISPOSICIÓN DE LA SUNAT PARA BIENES Y MERCANCIAS EN LIMA¿ ¿ CUI 2300859
Entidad contratante	INVERSION PUBLICA SUNAT
Contratista	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. SUCURSAL DEL PERU
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Código Único de Inversión (CUI)	2300859
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CUSTODIA Y DISPOSICIÓN DE LA SUNAT PARA BIENES Y MERCANCÍAS EN LIMA
Función	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Identificador del contrato (SEACE)	2275144
Monto del contrato	S/ 141,073,655.24
Monto aprobado de la inversión	S/ 87,606,361.00
Cuaderno de obra digital	1278 asientos entre 02/09/2024 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

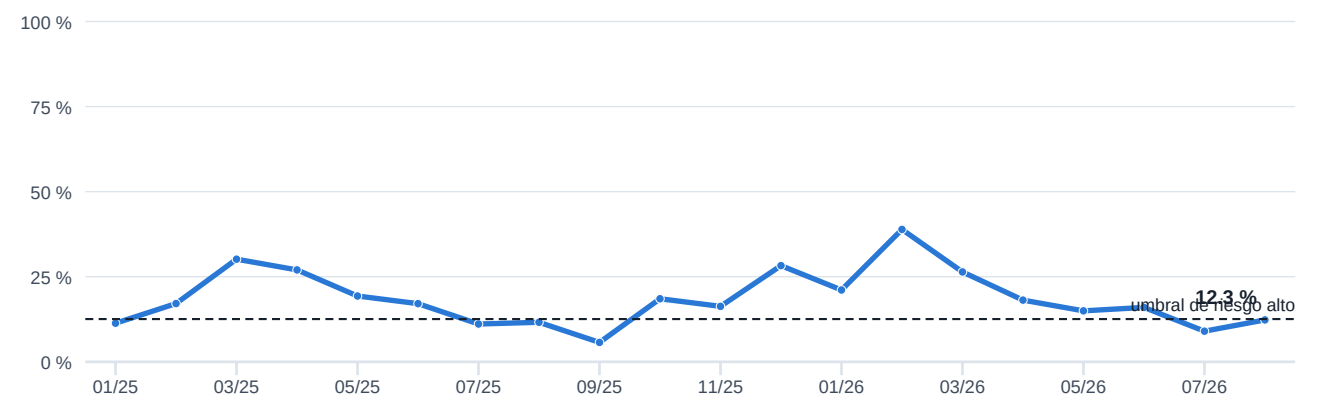

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (20 cortes, del 31/01/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.56 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.542
El 23 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.214
El 12 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.144
1 asiento de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.134
3 asientos de aplicación de penalidades desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.119
El plazo original venció hace 157 días	Datos del contrato		-0.117
Departamento: Lima	Características de la obra		+0.116
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.100

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	12.3 %	12.3 %	+0.0 pp
Absolver todas las consultas pendientes	12.3 %	12.8 %	+0.5 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 1277 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 28/08/2026

RESPUESTA A CONSULTA TECNICA POR DEFICIENCIA E INFORMACION INCOHERENTE EN LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA PARTIDA 03.02.14.06 EQUIPOS CONTRA INCENDIO DEL ETO, PARA EQUILIBRAR SU EJECUCION CONTRACTUAL: Respecto a la consulta formulada por la Residencia de Obra sobre la partida 03.02.14.06 "Equipos Contra Incendios" del Expediente Técnico de Obra (ETO):1. Sobre la aprobación técnica:Mediante Informe N° 466-MRA-DYCUSA-E...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1258 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 13/08/2026

...de los requisitos del eto.del mismo modo, el contratista debera presentar un cronograma de aceleracion/recuperacion de trabajos para la especialidad de comunicaciones, a fin de mitigar y revertir los retrasos acumulados.se precisa que, mientras no se regularice la documentacion requerida y se valide la idoneidad del nuevo integrador, no se autorizara la ejecucion de ningun trabajo en campo para la espec...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1258 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 13/08/2026

SE SOLICITA FORMALIZACION DE CAMBIO DE EMPRESA INTEGRADORA Y ENTREGA DE DOCUMENTACION TECNICA Y DE GESTION, PARA LA CONTNUIDAD DE LOS TRABAJOS EN LA ESPECIALIDAD DE COMUNICACIONES: Se deja constancia en el presente asiento lo siguiente:En la reunión de procura de fecha 25/05/2026, la Supervisión de obra fue informada de que la empresa Arditec (integrador saliente) no continuaría en el proyecto, presentándose en su lu...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1256 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 12/08/2026

viene de asiento 1255 - se pone en conocimiento incumplimiento reiterado de plazos por parte del supervisor de obra consulgal s.a. sucursal del peru (353 planos bim pendientes de revision). se solicita intervencion inmediata de la entidad y se formula res...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1255 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 12/08/2026

...to tecnico de la supervision trescientos cincuenta y tres (353) planos de construccion bim, a los que se agregan ciento setenta y tres (173) planos de la especialidad de comunicaciones, registrandose demoras acumuladas de hasta veintiun (21) dias calendario...continua en siguiente asiento...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1255 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 12/08/2026

se pone en conocimiento incumplimiento reiterado de plazos por parte del supervisor de obra consulgal s.a. sucursal del peru (353 planos bim pendientes de revision). se solicita intervencion inmediata de la entidad y se formula res...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1253 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 05/08/2026

...nos haga llegar la ficha tecnica del modulo de bloqueo o control y que este vaya acompañado de un informe donde se garantice el cumplimiento de los requerimientos dados por la entidad. indicar que la demora en la entrega de dicha informacion es responsabilidad del contratista, ya que habiendo pasado mas de 84 dias del primer compromiso asumido la informacion aun no a sido entregada para su revision.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1245 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 23/07/2026

...la fecha, excediendo su competencia.5. el tiempo transcurrido sin solucion es de responsabilidad exclusiva de la entidad, reservandose dycusa el derecho a reclamar por los impactos y costos que dicha demora genere.

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 1243 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 22/07/2026 <i>...plazos reglamentarios previstos en el art. 205 del r.lce. se exhorta a la residencia de obra a cumplir con la entrega del expediente técnico del adicional dentro del plazo legalmente establecido, bajo apercibimiento de las responsabilidades a que hubiere lugar.</i> Fuente: cod-asientos202607.csv
Asiento N.º 1226 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 04/07/2026 <i>VIENE DE ASIENTO 1225 - RESPUESTA A ASIENTO 1222 SOBRE REUBICACIÓN DE DUCTOS - INICIO DE CAUSAL DE AMPLIACIÓN DE PLAZO: ...Viene de asiento 1225... En consecuencia, todos los retrasos generados desde el 22.06.2026 —fecha límite para que la Entidad absolviera la consulta elevada el 16.06.2026—, así como los costos adicionales, Gastos Generales Variables y demás consecuencias económicas o técnicas derivadas de la no re...</i> Fuente: cod-asientos202607.csv
Asiento N.º 1227 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 04/07/2026 <i>...ontratista queda expresamente eximido de toda responsabilidad por los retrasos, costos adicionales y consecuencias económicas o técnicas derivadas de la no resolución oportuna del vicio del eto y del incumplimiento de la supervisión (art. 193 r.lce). dicha constancia servirá de sustento para las acciones legales que dycusa se reserva ante la jrd y la instancia arbitral correspondiente.</i> Fuente: cod-asientos202607.csv
Asiento N.º 1192 · Órdenes · SOEC_SPV · 09/06/2026 <i>SOBRE ORDEN DE DEMOLICION DE LOSA MAL EJECUTADA Y EJECUCION DE ACUERDO CON EL ETO Y ADICIONAL 01 APROBADO: Con Carta N° 0519-2026-SUNAT/8I3000 e Informe Técnico N° 00235-2026-SUNAT/8I3000 notificada con fecha 09/06/2026, luego de la revisión y análisis de los antecedentes sobre la orden de Demolición de la Losa de Pavimento de Concreto aledañas al bloque G9, se deja constancia que el contratista no acato las múltiple...</i> Fuente: cod-asientos202606.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
