

INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento de los servicios educativos de la i.e santa rosa de viterbo en el distrito de huaraz, provincia de huaraz, departamento de ancash

PROBABILIDAD A 60 DÍAS

14.7 %

▲ RIESGO ALTO

Al corte del 31/08/2026 la obra no registra el evento formal de atraso. El modelo estima una probabilidad de **14.7 %** de que se registre la causal de demora injustificada (valorización acumulada ejecutada menor al 80 % de la programada; RLCE art. 203 / RLGCP art. 207) en los próximos 60 días si persisten los factores detectados.

En la validación con datos pasados, 17.6 % de las obras clasificadas en nivel alto registró el atraso formal dentro de 60 días, frente a un promedio general de 5.6 % (3.2 veces el promedio).

umbral de riesgo alto 12.6 %

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 77,450,356.00	750 días	531 desde 06/04/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL
Contratista	HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	HUARAZ / HUARAZ / ANCASH
Código Único de Inversión (CUI)	2194968
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH
Función	EDUCACIÓN
Identificador del contrato (SEACE)	2378111
Monto del contrato	S/ 77,450,356.00
Monto aprobado de la inversión	S/ 35,717,976.00
Cuaderno de obra digital	531 asientos entre 06/04/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

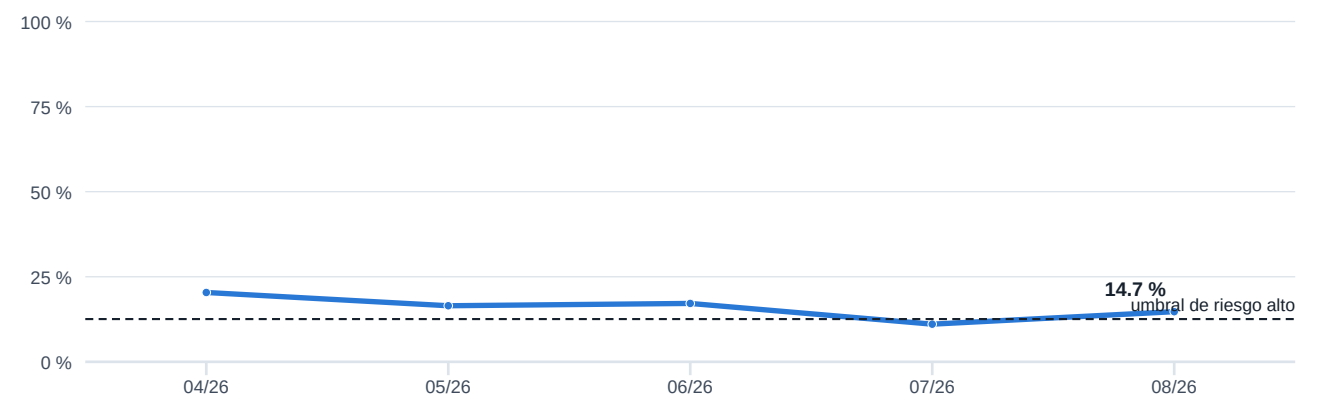

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (5 cortes, del 30/04/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.71 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.589
El 8 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.229
2 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.144
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.110
Hubo registros en el cuaderno 25 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.106
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.087
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.61 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.086
Gasto acumulado de la inversión (devengado): S/ 54,960,934	Ejecución del gasto (SI AF)		-0.082

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	14.7 %	14.5 %	-0.2 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	14.7 %	14.7 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 526 · Adicionales · SOEC_SPV · 31/08/2026

...mediante resolución gerencial regional n219-2026-gra/gri comunicada el 27/08/2026.asimismo, tambien se le indica que debe ampliar la garantia de fiel cumplimiento correspondiente a dicho adicional.la demora en el inicio de dicha ejecucion es responsabilidad del contratista.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 512 · Órdenes · SOEC_SPV · 27/08/2026

...a culminacion del estudio geotecnico dirimente, comparativo y complementario dispuesto mediante carta circular n00284-2026-gra/gri/sgslo, bajo expreso apercibimiento de que, vencido dicho plazo, toda demora adicional sera responsabilidad exclusiva del contratista, no sera reconocida como causal de ampliacion de plazo por romper el nexo de causalidad exigido por el literal a) del numeral 198.1 del reglam...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 512 · Órdenes · SOEC_SPV · 27/08/2026

CULMINACION DEL ESTUDIO GEOTECNICO: En atención a la CARTA N°00960-2026-GRA/GRI/SGSLO, mediante el presente asiento se reitera al Contratista lo indicado en el artículo tercero de la Resolución Gerencial Regional N°0210-2026-GRA/GRI, que indica lo siguiente: "DISPONER que la Supervisión de obra notifique al contratista ejecutor, mediante anotación expresa en el cuaderno de incidencias, un PLAZO MAXIMO Y PERENTORIO no...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 515 · Órdenes · SOEC_SPV · 27/08/2026

REITERACION AL CONTRATISTA PARA REALIZAR ESTUDIO GEOTECNICO: SE ADJUNTA DOCUMENTO DE RESPUESTA A LA CARTA N°00960-2026-GRA/GRI/SGSLO, MEDIANTE LA CUAL LA ENTIDAD NOS REQUIERE LA IMPLEMENTACION INMEDIATA DEL ARTICULO TERCERO DE LA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0210-2026-GRA/GRI.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 520 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 27/08/2026

cierre parcial de causal de ampliacion de plazo . se comunica a la supervision que, con fecha 16.05.2026, se anoto el aco n 177 del residente, en el cual se establece el inicio de causal de retraso no atribuible al contratista (art. 198 del reglamento), por deficiencias del expediente tecnico asociados a los accesos adyacentes de la av. villon, lo cual afecta la ejecucion de las partidas criti...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 511 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 26/08/2026

TRABAJOS REALIZADOS: SE INICIA LA JORNADA DE HOY 26/08/2026, CON LA CHARLA DE SEGURIDAD A CARGO DEL ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA. CON PRESENCIA DE SU PERSONAL Y DE LA SUPERVISION.CON LA VERIFICACION Y AUTORIZACION DE LA SUPERVISION SE REALIZAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS:+ ARMADO DE ACERO EN PLACAS Y VIGAS, 3ER NIVEL, MÓDULO X+ ENCOFRADO DE VIGAS VOLADIZO, 3ER NIVEL, MÓDULO X+ ENCOFRADO DE LOSA 2 AGUAS, 3ER NIVEL, MÓDULO...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 511 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 26/08/2026

...campamento provisional de obra en la plataforma 01.se le recuerda al contratista que la entidad le solicito realizar los ensayos geotecnicos dirimientes y hasta la fecha no se han realizado, cualquier atraso ya es su responsabilidad.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 494 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 21/08/2026

RESPUESTA A APROBACION DE LABORATORIO PARA ESTUDIO GEOTECNICO: SE DEJA CONSTANCIO QUE MEDIANTE CARTA N° 0177-2026-HIGH-GG DE RECEPCIONADA CON FECHA 21/08/2026, EL CONTRATISTA SOLICITA APROBACION DE LABORATORIO PARA ESTUDIO GEOTECNICO DIRIMENTE.AL CUAL ESTA SUPERVISION DEJA CONSTANCIA QUE LA RESPONSABILIDAD DE REALIZAR LOS ESTUDIOS DE SUELOS CORRESPONDE AL CONTRATISTA, EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR LA...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
