


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en las vías urbanas del barrio carniche y sector el rancho de la ciudad de cutervo distrito de cutervo de la provincia de cutervo del departamento de cajamarca

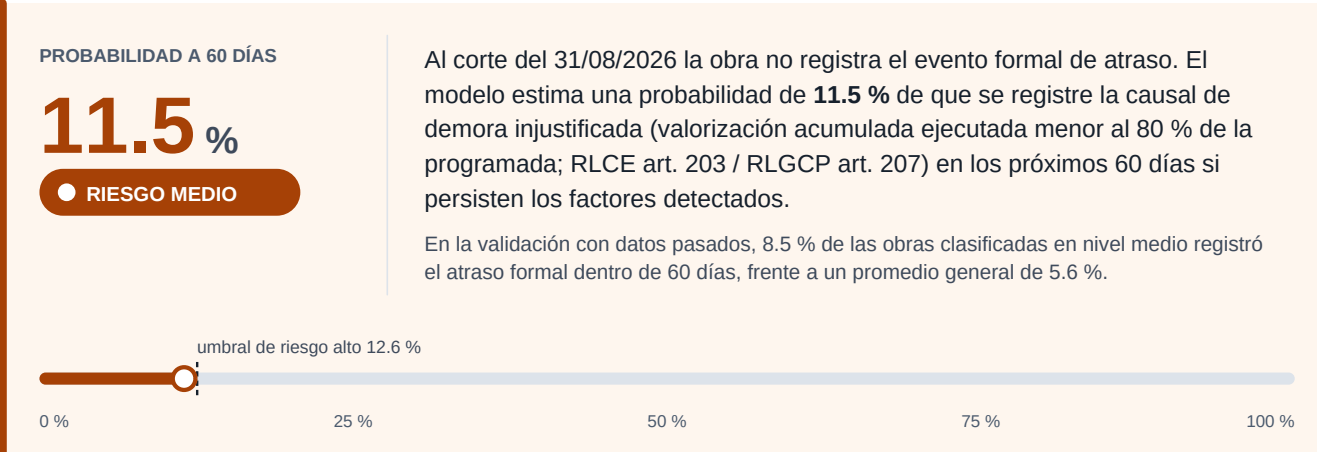


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 21,332,828.94	360 días	203 desde 15/10/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS URBANAS DEL BARRIO CARNICHE Y SECTOR EL RANCHO DE LA CIUDAD DE CUTERVO DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO
Contratista	CONSORCIO HAT.ICO
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CUTERVO / CUTERVO / CAJAMARCA
Código Único de Inversión (CUI)	2649989
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS URBANAS DEL BARRIO CARNICHE Y SECTOR EL RANCHO DE LA CIUDAD DE CUTERVO DISTRITO DE CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2350058
Monto del contrato	S/ 21,332,828.94
Monto aprobado de la inversión	S/ 11,731,783.80
Cuaderno de obra digital	203 asientos entre 15/10/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

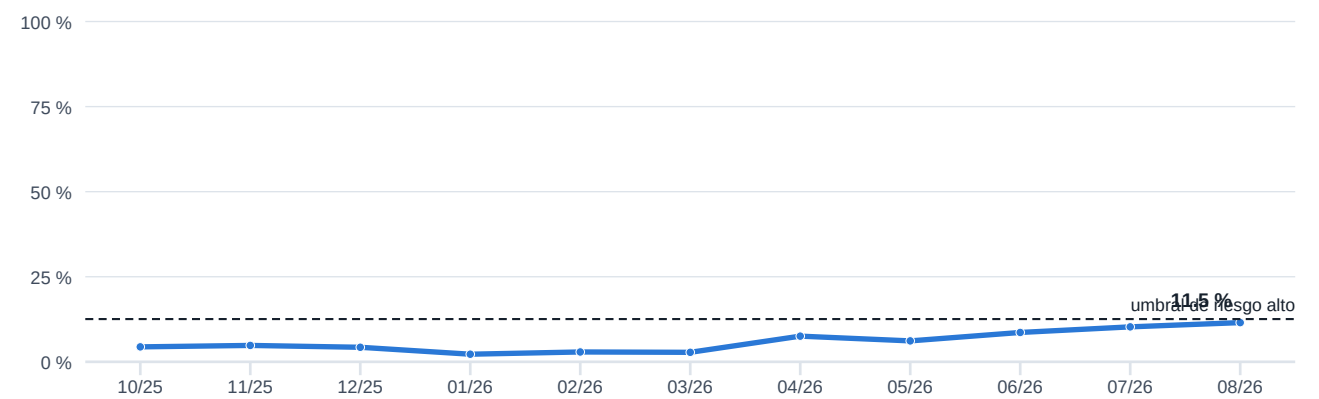

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (11 cortes, del 31/10/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.54 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.566
El 24 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.217
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.200
Faltan 40 días para el fin del plazo original	Datos del contrato		+0.139
2 asientos de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.139
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 1,861,356	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.085
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.085
Hubo registros en el cuaderno 20 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.078

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	11.5 %	11.2 %	-0.3 pp
Absolver todas las consultas pendientes	11.5 %	11.4 %	-0.2 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	11.5 %	11.6 %	+0.1 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 203 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/08/2026

ACTIVIDADES REALIZADAS EN OBRA: Obtención de densidades de campo. En el Jr. Bolívar Sub base granular veredas. Vereda izquierda 93.97 % < 95%, progresiva 0+010, como se observa no se llega a la compactación requerida según expediente técnico, por lo que se tendrá que seguir compactando. En la Av. San Juan sub base granular de la calzada, carril izquierdo, progresiva 00+180 Se ha obtenido el % de compactación de 91.54 % < ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 200 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 28/08/2026

...a puede solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion vigente al momento de la solicitud: a) por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, se solicita la ampliacion parcial de plazo contractual 01. se adjunta el informe de dicha solicitud. cabe indicar que la causal por la cu...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 198 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 27/08/2026

...basicos (cambio de redes de agua y desagüe con conexiones domiciliarias) en los sectores el rancho y magisterial, aspecto que afecta de manera sustancial la ruta critica del proyecto y esta generando retrasos en el avance del proyecto, perjudicando el plazo contractual. se deja constancia que se viene registrando este pedido desde el 04 de mayo 2026 con los asientos n 087, 102,121, 139, 150, 151, 154, 1...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 190 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 21/08/2026

...basicos (cambio de redes de agua y desagüe con conexiones domiciliarias) en los sectores el rancho y magisterial, aspecto que afecta de manera sustancial la ruta critica del proyecto y esta generando retrasos en el avance del proyecto, perjudicando el plazo contractual. se deja constancia que el contratista viene registrando este pedido desde el 04 de mayo 2026 con los asientos n 087, 102,121, 139, 150,...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 185 · Consultas · SOEC_RESI · 18/08/2026

CONSULTA DE OBRA - CANAL NATURAL EXISTENTE PARA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES: TENIENDO PRESENTE EL ASIENTO 181 DE RESIDENTE, CON RESPECTO A LA CONSULTA DE OBRA SOBRE EL CANAL NATURAL EXISTENTE PARA EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES. DEBIDO A QUE CONLLEVA UNA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL ARTICULO 190.2 (CUANDO LA ANOTACIÓN FORMULADA POR EL CONTRATISTA CONLLEVE A UNA MODIFICACIÓN DE...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 184 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 18/08/2026

...con las partidas culminadas de: conformacion y compactacion de base en veredas, encofrado de veredas, listas para su colocacion de concreto. dichas acciones por parte de semapa y la poblacion usuaria retrasara la ejecucion de la partida siguiente: concreto, perjudicando el avance y programacion de obra. asi mismo colocacion de tuberia y el relleno de afirmado o arena que ellos mismo realizan no garantiz...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 172 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 12/08/2026

AMPLIACION N°02 DE PLAZO CONTRACTUAL: MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO SE VUELVE A REITERAR SOBRE EL IMPEDIMENTO QUE PRESENTA LA CONTRATISTA PARA PODER EJECUTAR PARTIDAS CONTRACTUALES, DEBIDO A LA INCERTIDUMBRE SOBRE EL SANEAMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA Y DESAGÜE) EN LOS SECTORES EL RANCHO Y MAGISTERIAL, ASPECTO QUE AFECTA DE MANERA SUSTANCIAL LA RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO Y ESTA GENERANDO RETRASOS EN EL PLAZO CONTRA...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 155 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 21/07/2026

...entes solicitados por el contratista por intermedio del asiento n121, de fecha 11/06/2026, que es a su vez un reiterativo del asiento de obra n87 de fecha 04/05/2026, este ultimo denegado debido a la falta de personal tecnico para dar el soporte y cumplimiento como inspector de obra.es asi que luego de visita a campo y en busqueda de soluciones con fecha 28 de mayo del 2026 la junta de prevencion y resolucion de d...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 118 · Órdenes · SOEC_INSP · 05/06/2026

VERIFICACION DE LOS TRABAJOS VALORIZADOS: SE HA REALIZADO LA INSPECCION A CADA UNA DE LAS PARTIDAS VALORIZADAS ENCONTRANDOSE LO SIGUIENTE:-JUNTAS DE CONTRACCION EN VEREDAS CON ESPESORES NO UNIFORMES (TORCIDAS Y ESPESORES VARIABLES)- FISURAS EN EL CONCRETO EN LAS ESQUINAS DE LAS CAJAS DE AGUA Y DESAGUE.- PRESENCIA DE CANGEREJERAS EN VEREDAS- PÉSIMO BRUÑADO EN VEREDAS (DIFERENTES ESPESORES EN BRUÑADO DE VEREDAS Y BRUÑ...

Fuente: cod-asientos202606.csv

Asiento N.º 119 · Órdenes · SOEC_INSP · 05/06/2026

VERIFICACION DE LAS PARTIDAS VALORIZADAS: SE RECOMIENDA:- CAMBIAR INMEDIATAMENTE AL ESPECIALISTA EN CALIDAD YA QUE SE HA EVIDENCIADO QUE NO ESTA CUMPLIENDO CON SUS FUNCIONES Y LAS CUALES DEBEN SER DESCONTADO DEL PAGO EN LOS GASTOS GENERALES, ASI MISMO PRESENTAR UN INFORME DETALLADO DE LAS OBSERVACIONES (CANGEREJERAS EN PCIMENTOS Y VEREDAS LAS CUALES AFECTARIAN LA VIDA UTIL DE LAS ESTRUCTURAS, DESNIVELES ENTRE LA LO...

Fuente: cod-asientos202606.csv

INFOBRAS · -

Días para el fin programado original: 40

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
