


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución de la obra reparación de captación de agua, sistema de pretratamiento y línea de conducción en el(la) sistema de producción de agua potable de la Oficina Zonal de Lamas de EMAPA San Martín S.A., distrito de Lamas, provincia Lamas, departamento San Martín CUI N 2597065

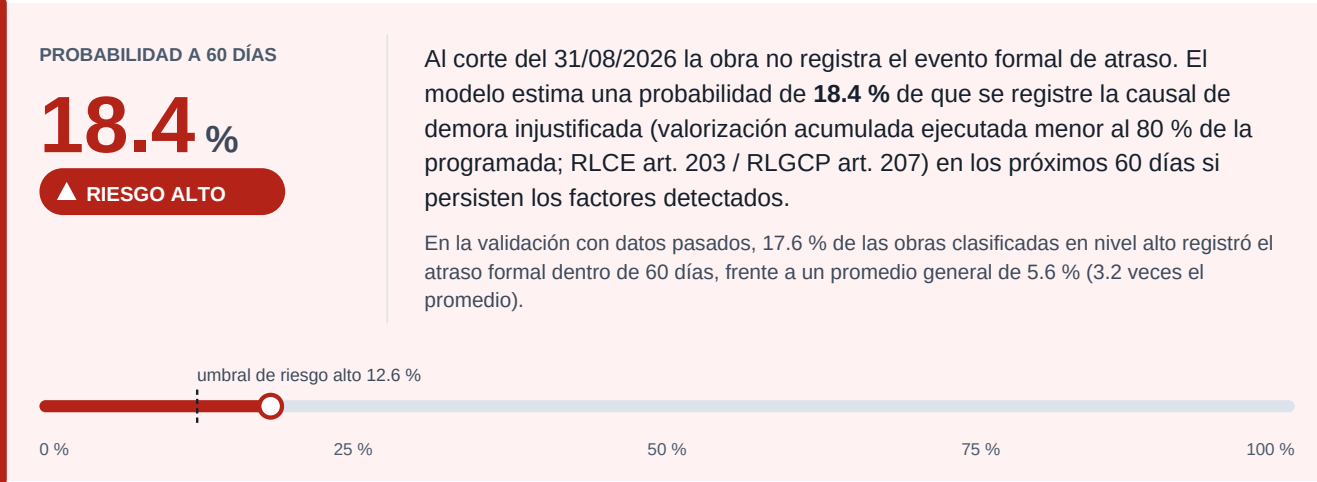


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	338 desde 06/04/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	Ejecución de la obra reparación de captación de agua, sistema de pretratamiento y línea de conducción en el(la) sistema de producción de agua potable de la Oficina Zonal de Lamas de EMAPA San Martín S.A., distrito de Lamas, provincia Lamas, departamento San Martín CUI N 2597065
Entidad contratante	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.
Contratista	CONSORCIO EJECUTOR SANFER
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	LAMAS / LAMAS / SAN MARTIN
Código Único de Inversión (CUI)	2597065
Inversión asociada	REPARACION DE CAPTACION DE AGUA , SISTEMA DE PRETRATAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA ZONAL DE LAMAS DE EMAPA SAN MARTÍN S.A., DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2368093
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 5,233,430.62
Cuaderno de obra digital	338 asientos entre 06/04/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

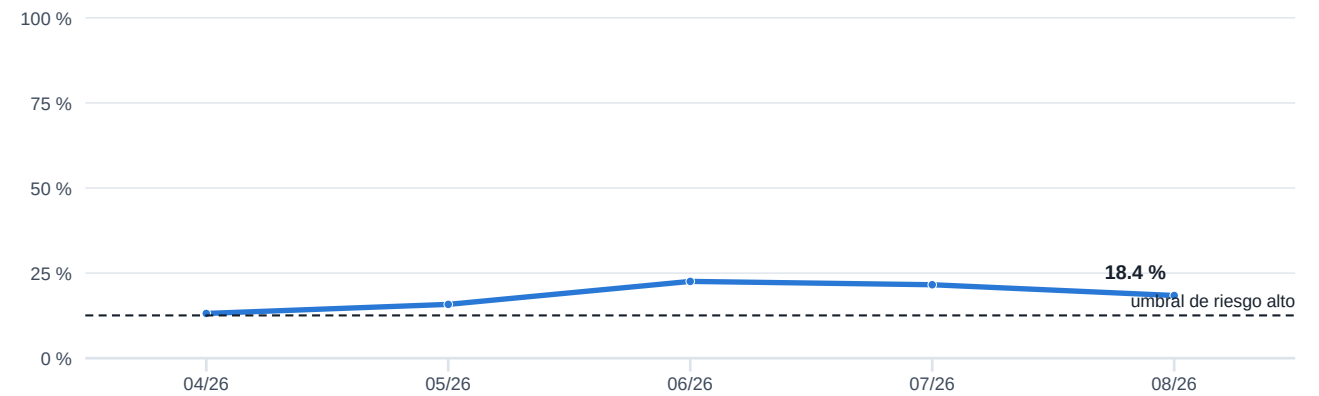

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (5 cortes, del 30/04/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.49 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.434
16 asientos de calendario de avance valorizado desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.178
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.163
1 asiento de aplicación de penalidades desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.132
14 asientos de calendario de avance valorizado en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.132
Departamento: San Martín	Características de la obra		+0.128
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.120
Hubo registros en el cuaderno 24 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.115

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin aplicación de penalidades en los últimos 90 días	18.4 %	16.7 %	-1.7 pp
Absolver todas las consultas pendientes	18.4 %	18.4 %	-0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	18.4 %	18.7 %	+0.2 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.° 299 · Calendario de avance de obra valorizado · SOEC_RESI · 24/08/2026

PRESENTACION DE CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS: Se deja constancia que con fecha 24/08/2026, mediante Carta N° 065-2026-CONSORCIO PAMASHTO/RC y Carta N° 066-2026-CONSORCIO PAMASHTO/RC, el Contratista ha remitido a la Supervisión de Obra los cronogramas actualizados correspondientes al Cronograma Contractual de Ejecución de Obra afectado por el Deductivo Vinculante de Obra N° 03 y al Cronograma del Adicional de Obra N° 04,...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 302 · Calendario de avance de obra valorizado · SOEC_SPV · 24/08/2026

REMISIÓN DE SUSTENTO TÉCNICO SOBRE LA CONTINUIDAD DE EJECUCIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA N.° 01: SE INDICA QUE MEDIANTE CARTA N°:115-2026-CONSORCIO ARQUEN DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2024 ESTA SUPERVISION DE OBRA PRESENTO A LA ENTIDAD EMAPA SAN MARTIN S.A. EL INFORME TECNICO SUSTENTO TÉCNICO SOBRE LA CONTINUIDAD DE EJECUCIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA N.° 01, PARA SU EVALUACION, CONOCIMIENTO Y PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA EN...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 279 · Calendario de avance de obra valorizado · SOEC_RESI · 18/08/2026

REMISIÓN DE SUSTENTO TÉCNICO SOBRE LA CONTINUIDAD DE EJECUCIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA N.° 01: Se deja constancia que, mediante Carta N.° 064-2026-CONSORCIO PAMASHTO/RC, de fecha 18 de agosto de 2026, se remitió a la Supervisión el sustento técnico referente a la continuidad de ejecución del Adicional de Obra N.° 01, considerando la culminación de su cronograma de ejecución. Al respecto, se sustenta que existen partidas...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 281 · Calendario de avance de obra valorizado · SOEC_SPV · 18/08/2026

REMISIÓN DE SUSTENTO TÉCNICO SOBRE LA CONTINUIDAD DE EJECUCIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA N.° 01: DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ASIENTO N° 279 POR EL RESIDENTE DE OBRA, SE INDICA QUE EFECTIVAMENTE MEDIANTE CARTA N° 064-2026-CONSORCIO PAMASHTO/RC, CON FECHA 18 DE AGOSTO DE 2026, LA EMPRESA CONTRATISTA REMITIÓ A ESTA SUPERVISIÓN DE OBRA EL SUSTENTO TÉCNICO REFERENTE A LA CONTINUIDAD DE EJECUCIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA N.° ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 270 · Calendario de avance de obra valorizado · SOEC_RESI · 14/08/2026

PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS: Se deja constancia que, el día de hoy 14/08/2026, mediante Carta N.° 062-2026-CONSORCIO PAMASHTO/RC y Carta N.° 063-2026-CONSORCIO PAMASHTO/RC, el Contratista ha remitido a la Supervisión de Obra los cronogramas actualizados correspondientes al Cronograma Contractual de Ejecución de Obra afectado por el Deductivo Vinculante de Obra N.° 02 y el Cronograma del Adicional de Obra...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.° 244 · Valorizaciones y metrados · SOEC_SPV · 07/08/2026

...tado teniendo un avance del mes de julio 2026 de 15.10% y un acumulado ejecutado de 23.27% respectivamente. así mismo se indica que la valorización acumulada al presente mes de julio 2026 se encuentra atrasado con -46.73% respecto a lo programado según cronograma de obra vigente

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
