


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

ejecución de la etapa - i del saldo de obra delas redes de agua y desagüe del proyecto de inversión mejoramiento y ampliación de las capacidad de la base de infantería de la marina - ancón

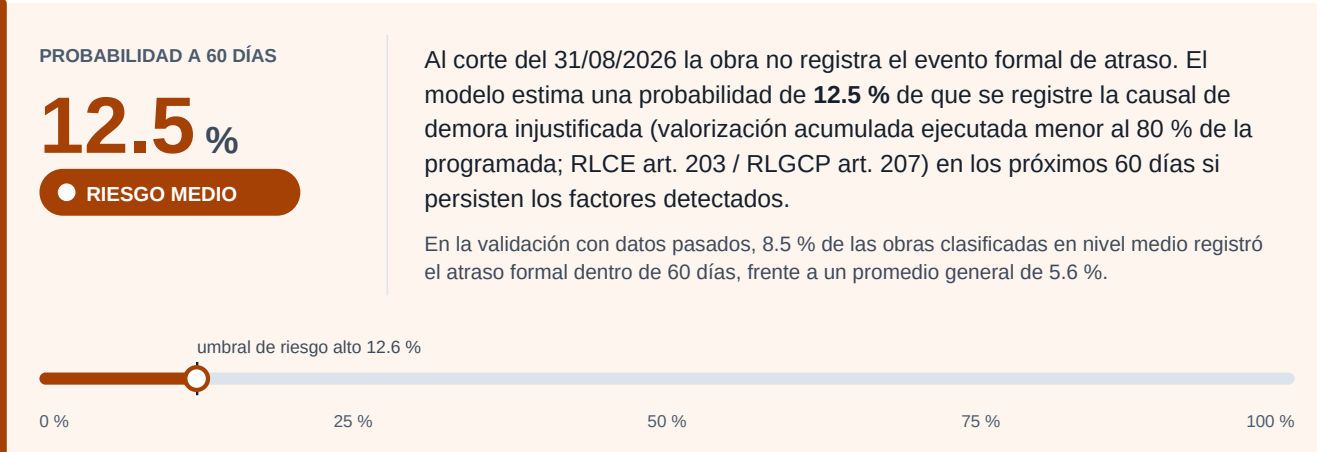


|                    |                |                         |                |
|--------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| MONTO DEL CONTRATO | PLAZO ORIGINAL | ASIENTOS DEL CUADERNO   | ÚLTIMO ASIENTO |
| No publicado       | No publicado   | 370<br>desde 19/06/2025 | 31/08/2026     |

01 Identificación de la obra y del contrato

|                                                 |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominación oficial                            | EJECUCIÓN DE LA ETAPA - I DEL SALDO DE OBRA DELAS REDES DE AGUA Y DESAGÜE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDAD DE LA BASE DE INFANTERÍA DE LA MARINA - ANCÓN |
| Entidad contratante                             | MARINA DE GUERRA DEL PERU                                                                                                                                                                    |
| Contratista                                     | CONSORCIO JASAN                                                                                                                                                                              |
| Ubicación (distrito / provincia / departamento) | ANCON / LIMA / LIMA                                                                                                                                                                          |
| Código Único de Inversión (CUI)                 | no enlazado                                                                                                                                                                                  |
| Inversión asociada                              | -                                                                                                                                                                                            |
| Función                                         | -                                                                                                                                                                                            |
| Identificador del contrato (SEACE)              | 2323388                                                                                                                                                                                      |
| Monto del contrato                              | -                                                                                                                                                                                            |
| Monto aprobado de la inversión                  | -                                                                                                                                                                                            |
| Cuaderno de obra digital                        | 370 asientos entre 19/06/2025 y 31/08/2026                                                                                                                                                   |

## 02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

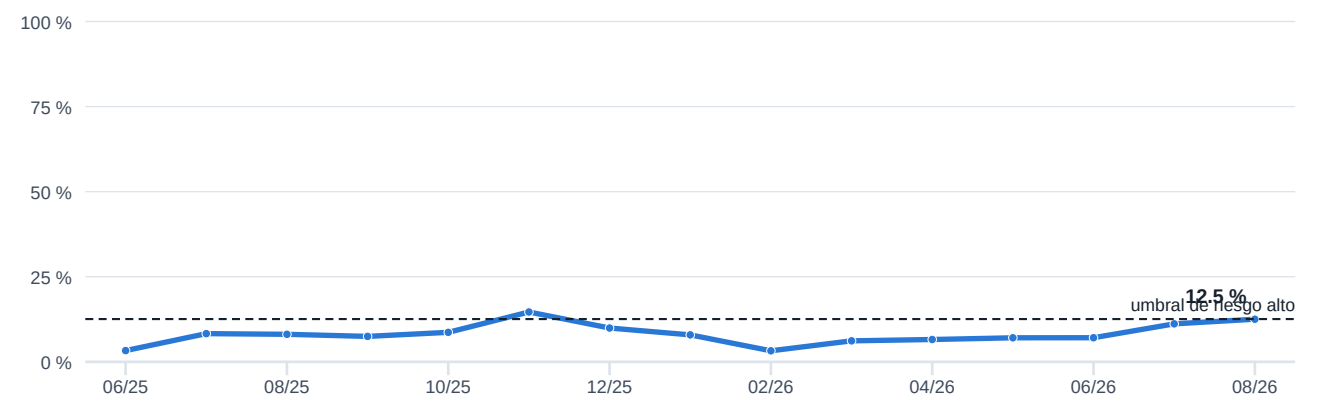

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (15 cortes, del 30/06/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

## 03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

| Dato de la obra                                                                                 | Grupo                          | Reduce   Eleva | Efecto |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------|
| Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.51 (escala de 0 a 1)      | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.485 |
| Departamento: Lima                                                                              | Características de la obra     | <div></div>    | +0.219 |
| El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora                 | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.152 |
| Extensión media de los asientos recientes: 484 caracteres                                       | Contenido de los asientos      | <div></div>    | +0.128 |
| Entidad contratante: otra entidad pública                                                       | Características de la obra     | <div></div>    | +0.124 |
| Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales | Contenido de los asientos      | <div></div>    | -0.087 |
| Hubo un asiento el mismo día del corte                                                          | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.084 |
| Hubo registros en el cuaderno 16 días del último mes                                            | Actividad del cuaderno de obra | <div></div>    | +0.060 |

## 04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

| Escenario                                               | Actual | Escenario | Cambio  |
|---------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días | 12.5 % | 12.1 %    | -0.4 pp |
| Absolver todas las consultas pendientes                 | 12.5 % | 13.0 %    | +0.5 pp |

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Asiento N.º 364 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 25/08/2026</b></p> <p><i>...dad. que por otro lado si ha sido evaluado en nuestra propuesta tecnica para el pozo profundo existente.se solicita la aprobacion de las carateristicas propuesta de la boma tipo lapicero, ya que esta demora esta originando que no se realice las pruebas finales con el tablero electrico y suministro del transformador de 315kva</i></p> <p>Fuente: cod-asientos202608.csv</p>                                                                         |
| <p><b>Asiento N.º 335 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 21/07/2026</b></p> <p>AVANCE DE OBRA: RESPECTO AL ASIENTO N° 334 DEL RESIDENTE DE OBRA "SE ESTA A LA PESPERA DE LA INSTALACION DEL TRANFORMADOR DE 315 KVA EN LA SUBESTACION PARA PROSEGUIR CON LAS RED DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA LA PLANTA DE OSMOSIS." SE INDICA QUE SE HA CORDINADO CON EL ÁREA USUARIA PAR SU IMPLEMENTACIÓN.</p> <p>Fuente: cod-asientos202607.csv</p>                                                                                                                  |
| <p><b>Asiento N.º 337 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 21/07/2026</b></p> <p>AVANCE DE OBRA: DE ACUERDO AL ASIENTO N°336 DEL RESIDENTE DE OBRA QUE INDICA "SE PROSIGUE CON EL REPLANTEO Y EXCAVACION DEL NUEVO TRAZO PARA EL CABLE DE 70 MM2 DESDE LA SUB ESTACION HACIA LA PLANTA DE OSMOSIS" SE RECOMIENDA SEGUIR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCION DE ESTA ACTIVIDAD</p> <p>Fuente: cod-asientos202607.csv</p>                                                                                                                          |
| <p><b>Asiento N.º 332 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 19/07/2026</b></p> <p><i>... de osmosi asi como la instalacion de tablero en la sub estacion electrica.se anota la presente para solicitar la aprobacion de la ampliacion de plazo que se encuentra en tramite por lo que cualquier atraso no es atribuible al contratista</i></p> <p>Fuente: cod-asientos202607.csv</p>                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Asiento N.º 333 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 19/07/2026</b></p> <p><i>...de osmosi asi como la instalacion de tablero en la sub estacion electrica. se anota la presente para solicitar la aprobacion de la ampliacion de plazo que se encuentra en tramite por lo que cualquier atraso no es atribuible al contratista"se ha realizado el informe n 016 -2026 lgpg- so y remitida con carta n 045 -2026- consorcio supervisor naval ancon del estado situacional de la obra</i></p> <p>Fuente: cod-asientos202607.csv</p>                     |
| <p><b>Asiento N.º 322 · Adicionales · SOEC_RESI · 10/07/2026</b></p> <p>NECESIDAD DE APROBAR PRESTACION ADICIONAL PARA AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DEL RESERVORIO 600 M3: EN FECHA 24.06.07 EN ASIENTO N° 302 SE HIZO LLEGAR LA CONSULTA PARA QUE SE RATIFIQUE SI EL SITEMA DE CONTROL ENTRE EL ERSERVORIO DE 600 M3 Y EL RP-1 ELEVADO ERA MANUAL. ADJUNTANDO INFORME N° 004-2026 -CONSORCIO JASAN/CMA/EE/OBRA, DEL ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO EN FECHA 10.07.2026 SE HA RECIBIDO LA CARTA N° ...</p> <p>Fuente: cod-asientos202607.csv</p> |

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

| Indicador (prueba temporal ciega) | Nacional | Arequipa |
|-----------------------------------|----------|----------|
| ROC-AUC                           | 0.774    | 0.719    |
| PR-AUC                            | 0.158    | 0.216    |
| Prevalencia del evento            | 0.050    | 0.091    |

Modelo atraso-H60-B\_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

**CÓMO USAR ESTE INFORME**

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
