


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento de los servicios de local social de usos multiples en el pueblo tradicional de quichinihuaya del distrito de yarabamba - provincia de arequipa - departamento de arequipa

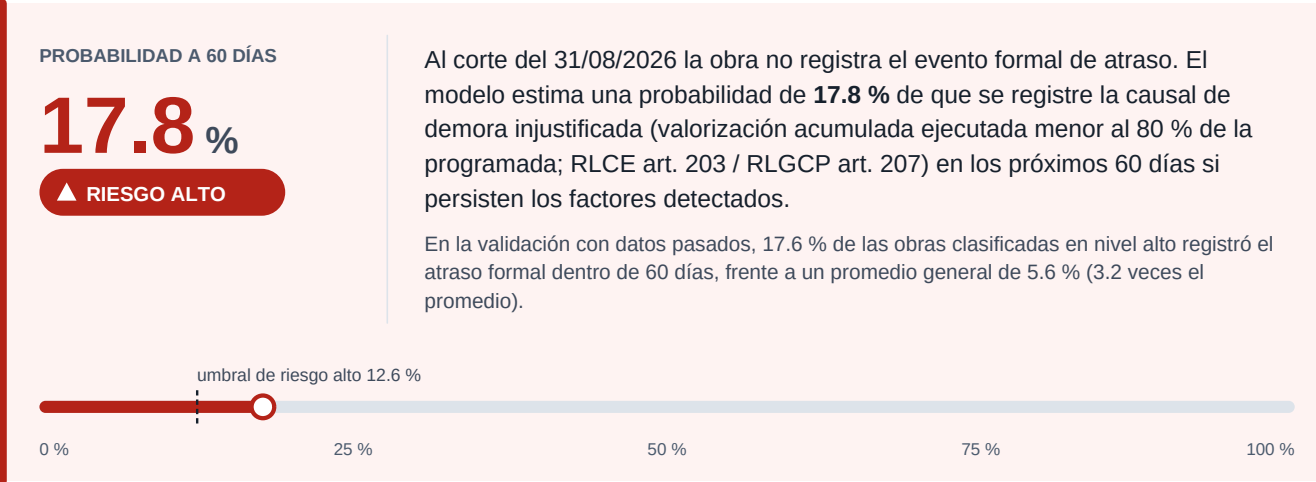


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	165 días	396 desde 05/06/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOCAL SOCIAL DE USOS MULTIPLES EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE QUICHINIHUAYA DEL DISTRITO DE YARABAMBA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
Contratista	CONSORCIO A Y F
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	YARABAMBA / AREQUIPA / AREQUIPA
Código Único de Inversión (CUI)	2546868
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOCAL SOCIAL DE USOS MULTIPLES EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE QUICHINIHUAYA DEL DISTRITO DE YARABAMBA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Función	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Identificador del contrato (SEACE)	2316806
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 2,007,373.55
Cuaderno de obra digital	396 asientos entre 05/06/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

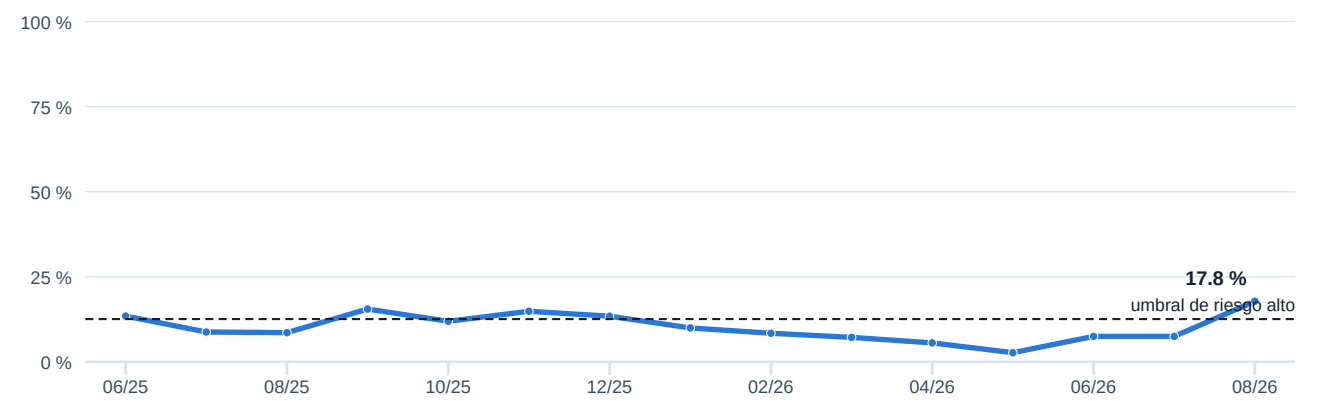

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (15 cortes, del 30/06/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.63 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.693
El 65 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.226
El 15 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.218
Departamento: Arequipa	Características de la obra		+0.149
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.81 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.126
El 3 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.113
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.105
El plazo original venció hace 287 días	Datos del contrato		-0.090

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	17.8 %	17.6 %	-0.2 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	17.8 %	17.8 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 386 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026 <i>OCURRENCIAS: Se comunica al contratista que deberá presentar los expediente adicionales ratificados por esta supervisión. Se solicita al contratista aperturar mas frentes de trabajo para la culminación en el más breve tiempo. Se comunica al contratista que deberá realizar las consultas correspondientes al medidor de energía eléctrica por supuestamente no estar acorde la potencia con lo que realmente se va a ejecutar, a...</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 386 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 24/08/2026 <i>...ondientes al medidor de energia electrica por supuestamente no estar acorde la potencia con lo que realmente se va a ejecutar, asi mismo debera realizar las consultas finales correspondientes para no atrasar mas el tiempo de entrega del proyecto.</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 375 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/08/2026 <i>OCURRENCIAS: Se comunica al contratista que aún queda pendiente la presentación de los expedientes adicionales ratificados por esta supervisión, por lo que la demora amerita penalidades. Se comunica a la contratista que deberá aperturar mas frentes de trabajo para poder culminar a la brevedad el proyecto.</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 375 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 17/08/2026 <i>ocurrencias . se comunica al contratista que aun queda pendiente la presentacion de los expedientes adicionales ratificados por esta supervision, por lo que la demora amerita penalidades. se comunica a la contratista que debera aperturar mas frentes de trabajo para poder culminar a la brevedad el proyecto.</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 373 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 13/08/2026 <i>OCURRENCIAS: Se comunica al contratista que deberá realizar los trabajos de orden y limpieza en obra. El contratista deberá presentar los expedientes de adicionales pendientes a la brevedad. Se comunica al contratista que los avances menores originan un riesgo de no culminacion de la obra, por lo que el contratista debrá abrir nuevos frentes de trabajo.</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 365 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 07/07/2026 <i>...y juntas de dilatacion en azotea. se solicita al contratista aumentar el ritmo de trabajo aumentando mas frentes, puesto que su avance es muy lento, aumentando el riesgo de no culminacion de la obra o demorar la entrega de la misma. el contratista debera hacer los trabajos de orden y limpieza en obra. a la fecha se vienen ejecutando los trabajos de colocacion de pisos de porcelanato de 60 x60 cm en servic...</i> Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
