


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

contratación para la ejecución de la obra: Ampliacion del servicio de agua potable urbano y ampliacion del servicio de alcantarillado en las manzanas m,ll,k,l,n,p,d,q,r,s,del aa.hh, cesar vallejo y ampliacion los ficus de la ciudad de talara distrito de pariñas de la provincia de talara, piura

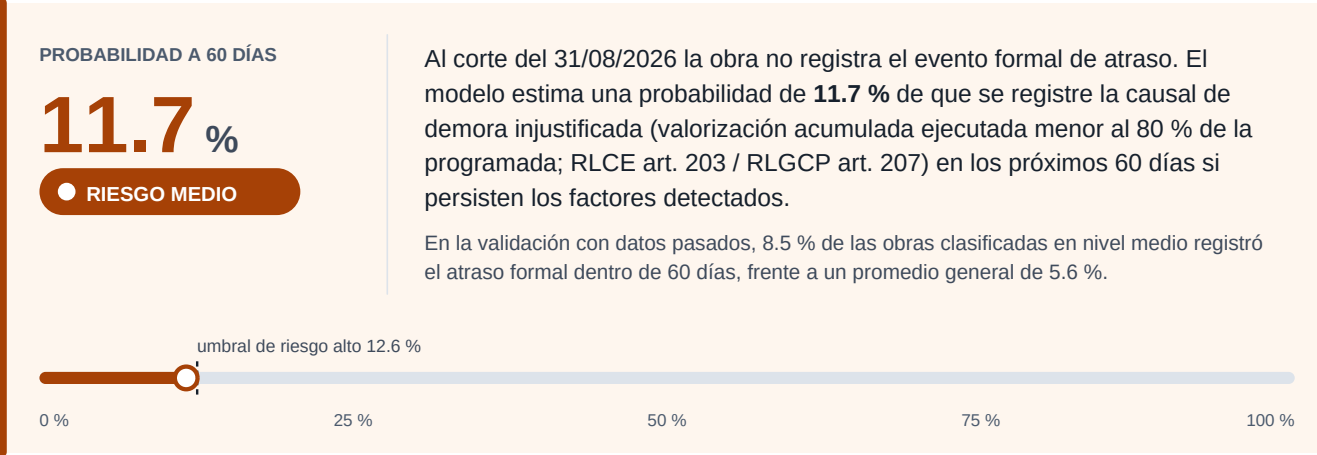


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	94 desde 13/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS MANZANAS M,LL,K,L,N,P,D,Q,R,S,DEL AA.HH, CESAR VALLEJO Y AMPLIACION LOS FICUS DE LA CIUDAD DE TALARA DISTRITO DE PARIÑAS DE LA PROVINCIA DE TALARA, PIURA
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA - PARIÑAS
Contratista	CORPORACION VALLE DEL NORTE S.R.L.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	PARIÑAS / TALARA / PIURA
Código Único de Inversión (CUI)	2651130
Inversión asociada	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS MANZANAS M,LL,K,L,N,P,D,Q,R,S,DEL AA.HH, CESAR VALLEJO Y AMPLIACION LOS FICUS DE LA CIUDAD DE TALARA DISTRITO DE PARIÑAS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2407430
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 1,691,460.16
Cuaderno de obra digital	94 asientos entre 13/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

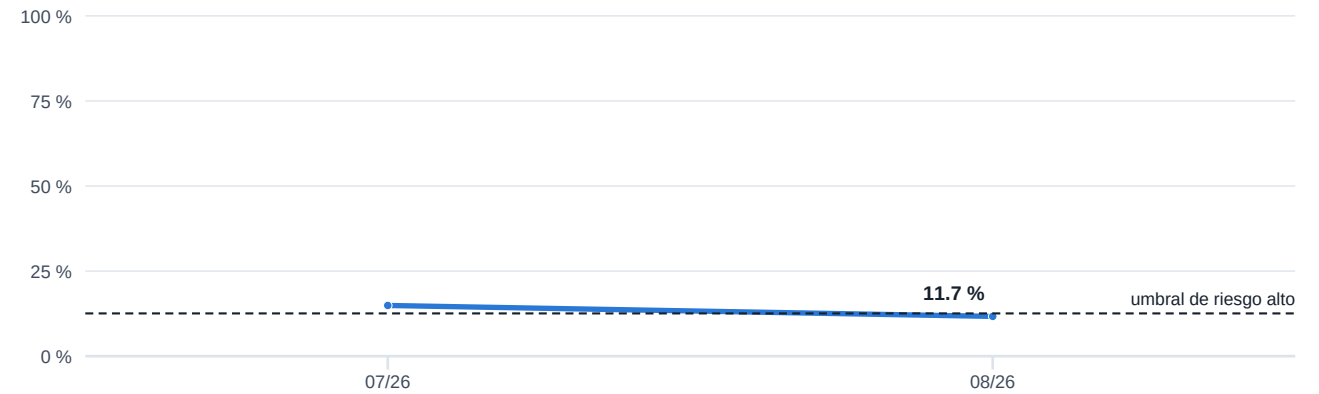

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.51 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.475
El 7 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.153
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.101
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.100
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.57 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.093
Extensión media de los asientos recientes: 1,131 caracteres	Contenido de los asientos		-0.072
Hubo registros en el cuaderno 21 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.069
Departamento: Piura	Características de la obra		-0.058

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	11.7 %	11.5 %	-0.2 pp
Absolver todas las consultas pendientes	11.7 %	11.7 %	+0.0 pp
Ejecución financiera al día (devengado en el último mes)	11.7 %	11.7 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 94 · Ejecución de mayores metrados · SOEC_RESI · 31/08/2026

...tud de los documentos de aprobacion referidos, se solicita a la supervision de obra su pronta autorizacion para la ejecucion de las mismas a fin de garantizar la operatividad de los sistemas y evitar retrasos en el proyecto.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 79 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 20/08/2026

...00 x 1.00m x 0.10m para estabilizar caja de agua y desagüe. se requiere el pronunciamiento inmediato de la entidad y supervision para la absolucion de la consulta planteada, a fin de mitigar mayores retrasos acumulados en el desarrollo de la ejecucion contractual.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 69 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 15/08/2026

...72m, d=200mm, hprom=2.12m). por consiguiente, se imposibilita iniciar las labores de movimiento de tierras programadas para el 05 y 07 de agosto de 2026. se hace especial énfasis en que la prolongada demora de respuesta de la entidad afecta directamente la ruta critica del proyecto, bloqueando la partida inicial y generando un impacto en cadena sobre la ejecucion de sus actividades sucesoras: 01.05.01.0...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 62 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 10/08/2026

RESPUESTA DE CONSULTA DE MAYORES METRADOS: En atención a lo señalado por el Contratista mediante el Asiento N.º 60, respecto a la ejecución de mayores metrados derivados de la implementación de los planos de replanteo aprobados mediante Resolución de Gerencia N.º 51-07-2026-GDT-MPT, de fecha 20 de julio de 2026, se ha tomado conocimiento de la documentación e información técnica presentada. Al respecto, esta Supervisi...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 46 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 30/07/2026

...ad de ingeniero supervisor de obra, se recomienda al contratista: movilizar de inmediato la maquinaria, equipo, personal y señalización de seguridad requeridos para la apertura de zanjas y buzones. el retraso es de entera responsabilidad del contratista, sujeto a las penalidades contractuales por mora según la normativa vigente.

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 46 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 30/07/2026

...vilizar de inmediato la maquinaria, equipo, personal y señalización de seguridad requeridos para la apertura de zanjas y buzones. el retraso es de entera responsabilidad del contratista, sujeto a las penalidades contractuales por mora según la normativa vigente.

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 24 · Calendario de avance de obra valorizado · SOEC_RESI · 20/07/2026

PRESENTACION DE CARTA N° 012-2026-CVN-EOP-SCV, QUE CONTIENE EL CAO, C. ADQ. DE MATERIALES, Y PROGRAMACION CPM: Dando cumplimiento a lo requerido por la supervisión, en el segundo párrafo de su Asiento N° 11, hemos presentado el día de hoy lunes 20 de julio de 2026, para su aprobación, la Carta No. 012-2026-CVN-EOP-SCV, que contiene el Calendario de Avance de Obra Valorizado, Calendario de Adquisición de Materiales e ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 34 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 20/07/2026

RESPUESTA A LA CONSULTA N° 24: Al respecto, la Supervisión procederá con la revisión y evaluación de la documentación presentada, verificando que los cronogramas propuestos guarden concordancia con el expediente técnico, las condiciones contractuales vigentes, los plazos establecidos para la ejecución de la obra y la secuencia lógica de actividades necesarias para el cumplimiento de las metas previstas. De encontrarse...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
