


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento del servicio de agua para riego en el canal loma larga de la localidad de loma larga alta del distrito de san miguel de el faique - provincia de huancabamba - departamento de piura. Con CUI n 2521022.

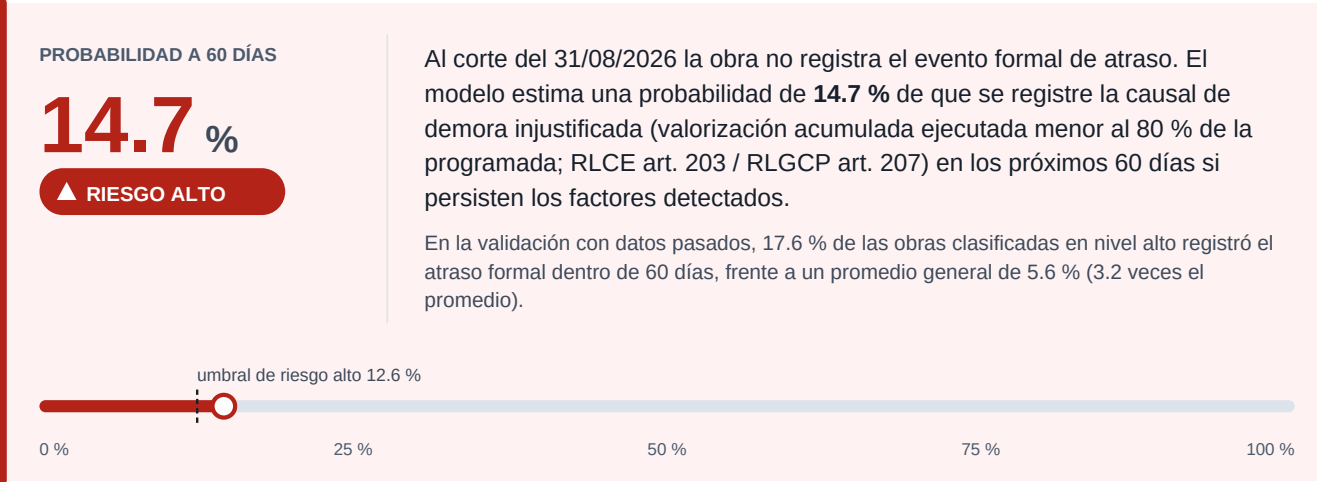


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	96 desde 26/06/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL LOMA LARGA DE LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA ALTA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA. CON CUI N 2521022.
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE
Contratista	CONSORCIO EL FAIQUE
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	SAN MIGUEL DE EL FAIQUE / HUANCABAMBA / PIURA
Código Único de Inversión (CUI)	2521022
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL LOMA LARGA DE LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA ALTA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA
Función	AGROPECUARIA
Identificador del contrato (SEACE)	2400414
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 3,635,981.76
Cuaderno de obra digital	96 asientos entre 26/06/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

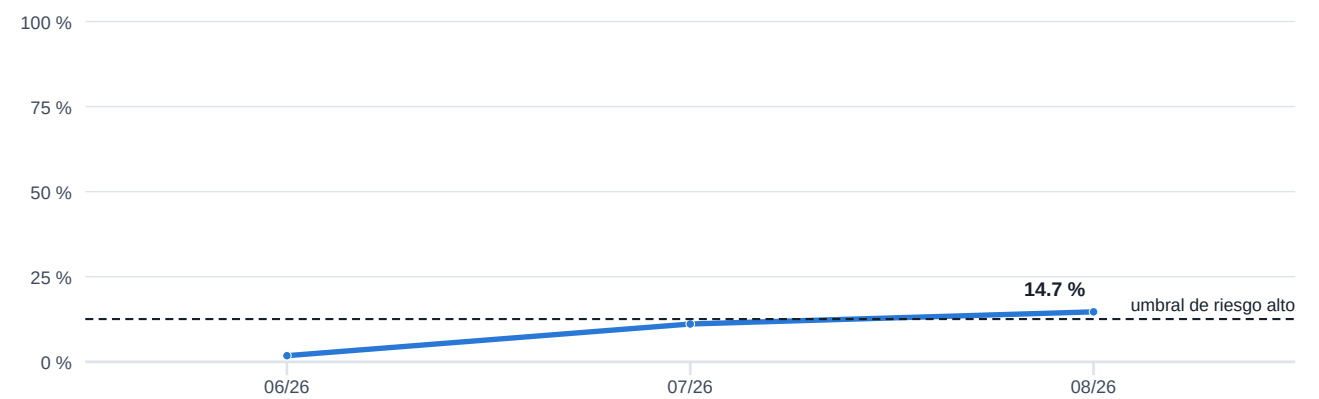

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (3 cortes, del 30/06/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.56 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.560
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.260
El 22 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.234
1 asiento de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.121
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.114
Departamento: Piura	Características de la obra		-0.100
Hubo registros en el cuaderno 21 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.076
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 2,109,380	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.067

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	14.7 %	14.7 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 87 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 25/08/2026

...trado de 60 m lineales de canal revestido.2. se advierte a la residencia, de acuerdo a la gestion de riesgos, existe el riesgo por construccion, teniendose una obra longitudinal, pero se evidencia un retraso no justificado en la ejecucion de la obra, es por ello en el frente de la alcantarilla hacia aguas arriba se ordena lo siguiente: implementar con personal idoneo, materiales de calidad, maquinaria y...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 86 · Participación del personal clave · SOEC_SPV · 24/08/2026

control de actividades realizadas y atrasos . 1. se verifíco la realizacion de la charla de seguridad dirigido al personal de la empresa contratista consorcio el faique y luego se continua realizando el control de las actividades en el desar...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 82 · Participación del personal clave · SOEC_SPV · 21/08/2026

control de actividades realizadas y atrasos . 1. se verifíco la realizacion de la charla de seguridad dirigido al personal de la empresa contratista ejecutora y luego se continua realizando el control de las actividades en el desarrollo de l...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 81 · Órdenes · SOEC_SPV · 20/08/2026

PRESENTACION DE DOCUMENTOS: SE DEJA CONSTANCIA LO SIGUIENTE:1. EN RESPUESTA AL ASIENTO N° 79 DEL RESIDENTE, SE ORDENA, DE QUE TODO INFORME TÉCNICO, ENSAYOS DE CALIDAD, REPORTES DE AVANCE, SOLICITUDES DE APROBACIÓN Y CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEBERÁN SER PRESENTADOS FORMALMENTE MEDIANTE UNA CARTA DIRIGIDA AL REPRESENTANTE COMÚN DE LA SUPERVISIÓN.2. ASIMISMO, ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 80 · Administración de riesgos · SOEC_SPV · 20/08/2026

control de actividades realizadas, tramites y atrasos por falta de materiales . 1. se verifíco la realizacion de la charla de seguridad dirigido al personal de la empresa contratista ejecutora y luego se continua realizando el control de las actividad...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 73 · Consultas · SOEC_RESI · 19/08/2026

...sion tramitar de forma urgente la respuesta de la entidad a fin de mitigar los sobrecostos por la paralizacion de la maquinaria y personal asignados para ejecutar las partidas de esta obra. al ser un incumplimiento de responsabilidad de la entidad, tambien justifica como causal de ampliacion de plazo.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 69 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 19/08/2026

...insidencias ya se hizo una constatacion policias por efecivos de la comisaria de canchaque, que han constatado los hechos, esto es un hecho que recae en toda su responsabilidad a la entidad, que esta incumpliendo en entregar el terreno de libre disponibilidad a la empresa ejecutora, para que pueda realizar los trabajos. otra obra que tiene problemas es las denominadas canoas, que son pases de quebradas q...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 58 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 10/08/2026

...caso de obras bajo el sistema de entrega de solo construccion, la entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segun corresponda, de acuerdo con este articulo la entidad esta incumpliendo al iniciar sin tener legalmente libre los terrenos para intervenir con los trabajos, esto esta afectando la ruta critica ya que esta obra tiene una signacion presupuestal significativa que hasta ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 51 · Administración de riesgos · SOEC_RESI · 06/08/2026**

...ya unica via de solucion sea solicitar ampliacion de plazo.de acuerdo con el reglamento de la ley general de contrataciones publicas, la falta de disponibilidad fisica legal del terreno constituye un incumplimiento de las obligaciones de la entidad (articulo 176 del reglamento). como la entidad garantizo la libre disponibilidad para iniciar la obra, la intromision o reclamo de un tercero propietario conf...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 25 · Participación del personal clave · SOEC_SPV · 14/07/2026**

RESPUESTA AL ASIENTO N° 24 DEL RESIDENTE: A LA FECHA NO SE TIENE LA APROBACION DE DOCUMENTOS PREVIOS A LA EJECUCION DE LA OBRA, ES POR ELLO SE INDICA LO SIGUIENTE:1. SE REITERA AL CONTRATISTA, ALCANZAR LOS AVANCES DEL INFORME TECNICO DETALLADO DEL TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LOS TRABAJOS PARA UNA CORRECTA EJECUCION DE OBRA.2. EN EL INFORME DE REPLANTEO SE DEBE ...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 26 · Participación del personal clave · SOEC_SPV · 14/07/2026**

RESPUESTA AL ASIENTO N° 24 DEL RESIDENTE: A LA FECHA NO SE TIENE LA APROBACION DE DOCUMENTOS PREVIOS A LA EJECUCION DE LA OBRA, ES POR ELLO SE INDICA LO SIGUIENTE:1. SE REITERA AL CONTRATISTA, ALCANZAR LOS AVANCES DEL INFORME TECNICO DETALLADO DEL TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LOS TRABAJOS PARA UNA CORRECTA EJECUCION DE OBRA.2. EN EL INFORME DE REPLANTEO SE DEBE ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
