


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

ejecución de la obra denominada: "mejoramiento y ampliacion del servicio de movilidad urbana en las vias locales de raymondi ii etapa del distrito de la victoria de la provincia de chiclayo del departamento de lambayeque" con CUI N° 2695673

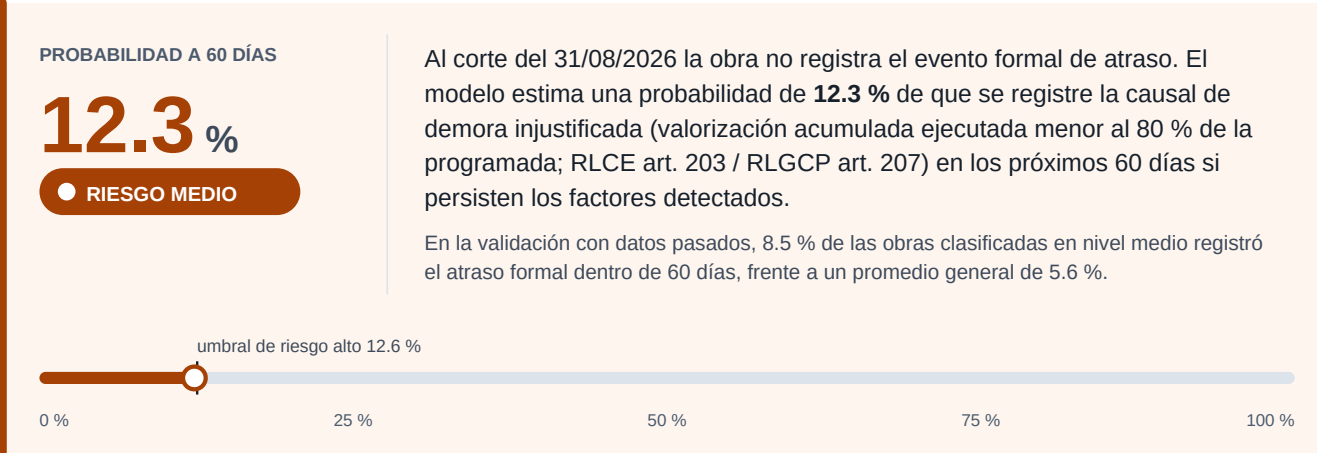


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 8,750,004.13	255 días	251 desde 24/12/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE RAYMONDI II ETAPA DEL DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CON CUI N° 2695673
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA - CHICLAYO
Contratista	CONSORCIO EJECUTOR NUDILLO
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	LA VICTORIA / CHICLAYO / LAMBAYEQUE
Código Único de Inversión (CUI)	2695673
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE RAYMONDI II ETAPA DEL DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Función	TRANSPORTE
Identificador del contrato (SEACE)	2364714
Monto del contrato	S/ 8,750,004.13
Monto aprobado de la inversión	S/ 9,952,584.88
Cuaderno de obra digital	251 asientos entre 24/12/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

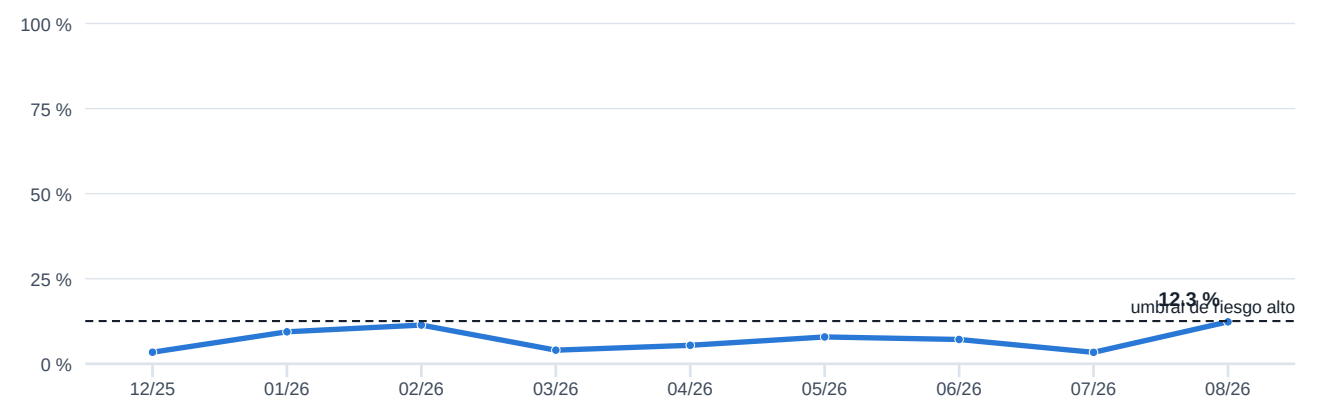

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (9 cortes, del 31/12/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.52 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.477
Departamento: Lambayeque	Características de la obra		+0.175
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.131
Hubo registros en el cuaderno 25 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.098
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 2,218,721	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.097
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.56 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.092
7 asientos de adicionales de obra en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.078
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.076

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	12.3 %	11.8 %	-0.5 pp
Absolver todas las consultas pendientes	12.3 %	12.3 %	-0.0 pp

05

Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 242 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 28/08/2026

ATENCIÓN AL ASIENTO N.º 235 – ACTIVIDADES REALIZADAS Y ORGANIZACIÓN DE FRENTE DE TRABAJO: EN ATENCIÓN AL ASIENTO N.º 235, SE TOMA CONOCIMIENTO DE LA CHARLA DE SEGURIDAD REALIZADA Y DE LAS ACTIVIDADES INFORMADAS: VACIADO DE SARDINEL EN LA CALLE ELOY URETA, ENCOFRADO DE VEREDAS EN LA CALLE PASCUAL SACO, LIMPIEZA Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE CAJAS, VACIADO DE VEREDAS EN LA CALLE JUSTO FIGUEROLA, Y PERFILADO DE SUBBASE DE PAV...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 212 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 24/08/2026

ACTIVIDADES REALIZADAS: 1. Se dio inicio a la jornada laboral con la charla de seguridad, dirigida por el especialista de seguridad, con el tema: Charla, uso de epps, en la cual se reforzaron las medidas preventivas, los riesgos asociados a las actividades programadas y el uso obligatorio de los equipos de protección (EPP), la identificación de peligros, incluyendo el chaleco de seguridad.2. Calle Justo Figuerola cua...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 180 · Participación del personal clave · SOEC_RESI · 12/08/2026

...personal acreditado especialista de calidad. nos alcanzo la entidad y nos comunica que mediante resolucion de gerencia municipal nro. 116-2026-mdlv/gm, de fecha 22 de mayo del 2026 se ha dispuesto el cambio de especialista de calidad, en este sentido sea reemplazado al ing. juan del carmen maco carlos, con registro cip nro. 133230, designandolo en su lugar al ing. jorge enrique llenque muro, con cip nro. 215047, quien ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 163 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 04/08/2026

ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realiza las siguientes Actividades1. Encofrado de veredas en calle Raúl Jiménez cu. 05 lado izquierdo.2. Hidratación de material de préstamo con Cisterna de agua.3. En la Calle Eloy Ureta cuadra 03 se realiza la limpieza de buzones.4. Conformación de veredas en la calle Justo Figuerola.5. Limpieza de superficie de capa base de pavimento.

Fuente: cod-asientos202608.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
