


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento y ampliacion del servicio de educacion primaria en i.e 24156 de centro poblado de san salvador de quije, distrito de san salvador de quije de la provincia de sucre del departamento de ayacucho", con CUI 2575438

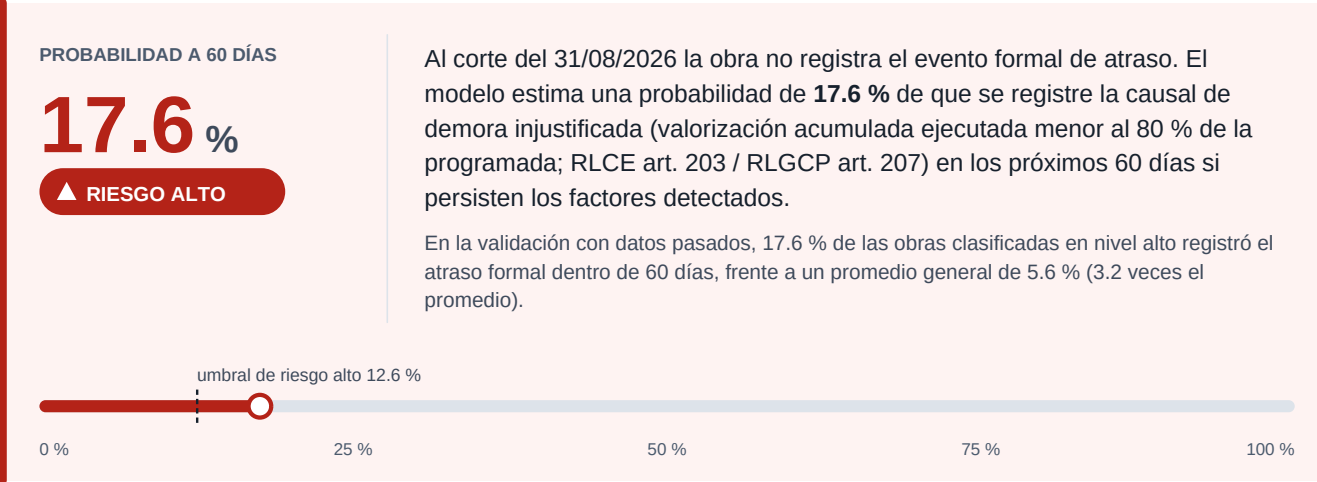


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	177 desde 06/04/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E 24156 DE CENTRO POBLADO DE SAN SALVADOR DE QUIJE, DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE DE LA PROVINCIA DE SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CON CUI 2575438
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR DE QUIJE
Contratista	CONSORCIO EDUCATIVO AUCARA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	SAN SALVADOR DE QUIJE / SUCRE / AYACUCHO
Código Único de Inversión (CUI)	2575438
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 24156 DE CENTRO POBLADO SAN SALVADOR DE QUIJE DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE DE LA PROVINCIA DE SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Función	EDUCACIÓN
Identificador del contrato (SEACE)	2377638
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 3,892,415.34
Cuaderno de obra digital	177 asientos entre 06/04/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

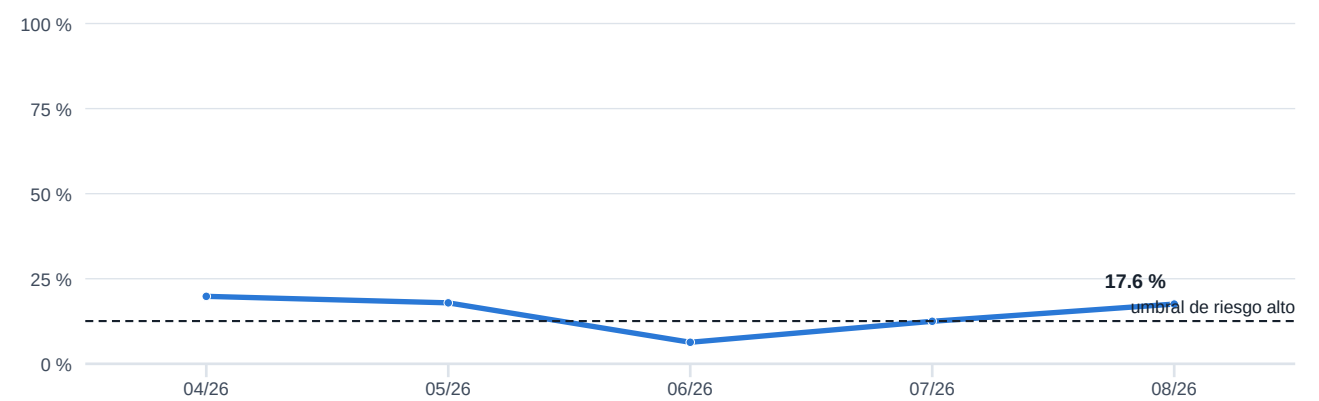

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (5 cortes, del 30/04/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.299
El 9 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.156
1 asiento de aplicación de penalidades desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.150
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.140
Hubo registros en el cuaderno 23 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.119
El 1 % de los asientos de los últimos 60 días menciona la regla del 80 % o un calendario acelerado	Contenido de los asientos		+0.099
1 asiento de órdenes en los últimos 90 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.097
Departamento: Ayacucho	Características de la obra		+0.077

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	17.6 %	17.3 %	-0.2 pp
Absolver todas las consultas pendientes	17.6 %	17.6 %	+0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	17.6 %	17.6 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 152 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

ocurrencias del día . al residente: se recomienda incrementar cuadrillas de trabajo puesto que se evidencia un retraso considerable en el cronograma de ejecución de obra, a la fecha se tiene en obra 26 trabajadores entre operarios, oficiales y peones. cabe recalcar que el presente mes e debe llegar a una valorizacio...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 151 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 10/08/2026

...evado y se verifica el izado de las mismas previo vaciado de solado e instalacion de mallas de zapatas. se recomienda al residente de obra incrementar cuadrillas de trabajo puesto que se evidencia un retraso considerable en el cronograma de ejecución de obra.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 131 · Órdenes · SOEC_SPV · 22/07/2026

...cia optima $f_c=210$ kg/cm², por consiguiente, esta supervision responsabilizara al residente en caso haga omiso la presente recomendacion. ademas, se cursara documento para una posible penalizacion por incumplimiento del proceso constructivo y no se valorizara la partida concreto en losa aligerada ademas de solicitarse informes tecnicos especializados para garantizar la resistencia de dicho concreto tales ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 130 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 22/07/2026

...ciones de plazos parciales tienen fecha de caducidad en ese sentido pasado el plazo y la ocurrencia de las actividades esta supervision no admite dicha causal para una posible ampliacion de plazo por retraso justificado. puesto que las partidas mencionadas ya fueron ejecutadas y no se describio dicho inconveniente en su respectivo momento.con documento carta n09-2026-san salvador de quije/eoj-so. de fec...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 128 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 22/07/2026

al supervisor de obra . dejamos constancia, y al amparo del art. 198 del rice inciso a) atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. que en obra se tiene dificultad en distintos aspectos que estan afectando la normal ejecucion de las partidas contractuales del proyecto...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 117 · Participación del personal clave · SOEC_SPV · 14/07/2026

...l cabo de 48 horas realice el descargo sobre la ausencia de dicho especialista en obra. caso contrario se iniciara procedimiento para penalizacion de acuerdo al numeral 17 del cuadro de aplicacion de penalidades del contrato de ejecución de obra.2.- se verifica en obra que el personal obrero no cuenta o la implementacion de epp esta deteriorado, infringiendo las normas de seguridad en obra en ese sentido s...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 118 · Respuestas a consultas · SOEC_SPV · 14/07/2026

RESPUESTA A CONSULTA: AL RESIDENTE DE OBRA. En respuesta al asiento n°114 del residente de obra de fecha 14-07-2026, respecto a las deficiencias del expediente técnico donde amerita diseñar un muro de sostenimiento y/o contención ubicada entre las progresivas los vértices P7-P8-P9-P1 del cerco perimétrico. Esta supervisión en cumplimiento del Artículo 190. Inciso 2) Cuando la anotación formulada por el contratista co...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 117 · Participación del personal clave · SOEC_SPV · 14/07/2026

AL RESIDENTE: AL RESIDENTE: se notifica al contratista por intermedio del residente de obra lo siguiente:1.- se verifica en obra la ausencia del personal clave, Especialista en geotecnia el día de hoy, en ese sentido mediante el presente asiento se solicita que al cabo de 48 horas realice el descargo sobre la ausencia de dicho especialista en obra. Caso contrario se iniciará procedimiento para penalización de acuerdo...

Fuente: cod-asientos202607.csv

- Asiento N.º 112 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/07/2026**

...ando previamente las correas de madera, se exige al contratista que las maderas a utilizarse como correas tienen que ser madera tornillo caso contrario no se valorizara esta actividad y sera sujeto a penalidades por incumplimiento de calidad de material. con respecto a lo indicado por el residente de obra en el asiento n 111, efectivamente el dia indicado no hubo suministro de agua en el lugar de emplazami...

Fuente: cod-asientos202607.csv
- Asiento N.º 109 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 09/07/2026**

...pervision autoriza la ejecucion de esta partido con la salvedad que las maderas a utilizarse como correas tienen que ser madera tornillo caso contrario no se valorizara esta actividad y sera sujeto a penalidades por incumplimiento de calidad de material

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
