


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecución saldo de obra primer paquete del proyecto reparación de red de alcantarillado, en las localidades de chichlayo, José Leonardo Ortiz y la Victoria, distrito de Chichlayo, provincia de Chichlayo, departamento de Lambayeque con CUI 2592152

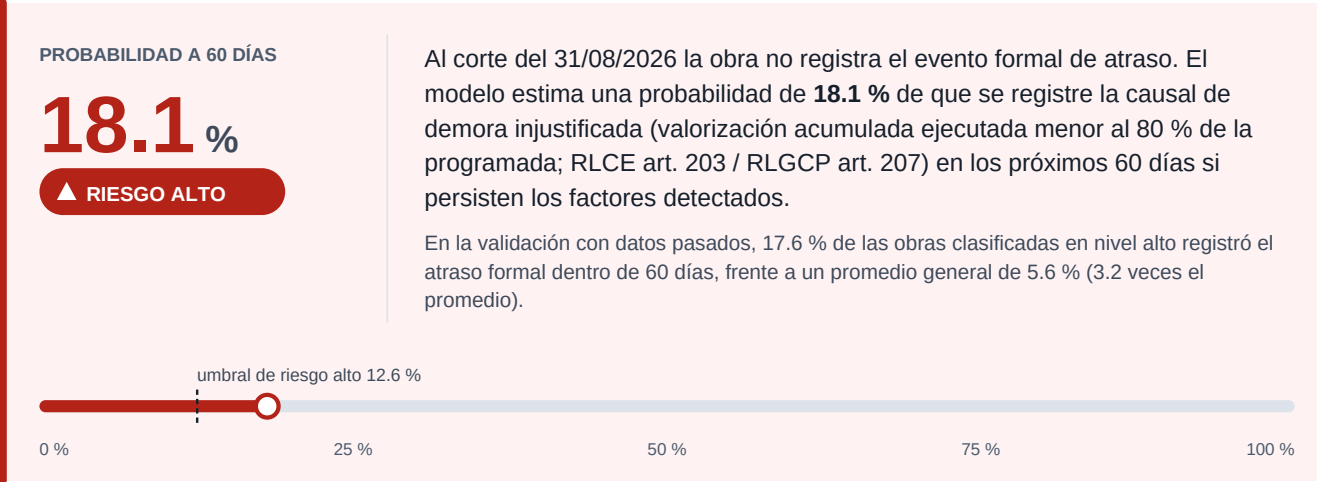


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	138 desde 28/05/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCIÓN SALDO DE OBRA PRIMER PAQUETE DEL PROYECTO REPARACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LAS LOCALIDADES DE CHICLAYO, JOSÉ LEONARDO ORTIZ Y LA VICTORIA, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CON CUI 2592152
Entidad contratante	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.
Contratista	CONSORCIO YAMANGO
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	JOSE LEONARDO ORTIZ / CHICLAYO / LAMBAYEQUE
Código Único de Inversión (CUI)	2592152
Inversión asociada	REPARACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL(LA) LOCALIDADES DE CHICLAYO, JOSÉ L. ORTIZ Y LA VICTORIA DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2395821
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 40,294,833.63
Cuaderno de obra digital	138 asientos entre 28/05/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

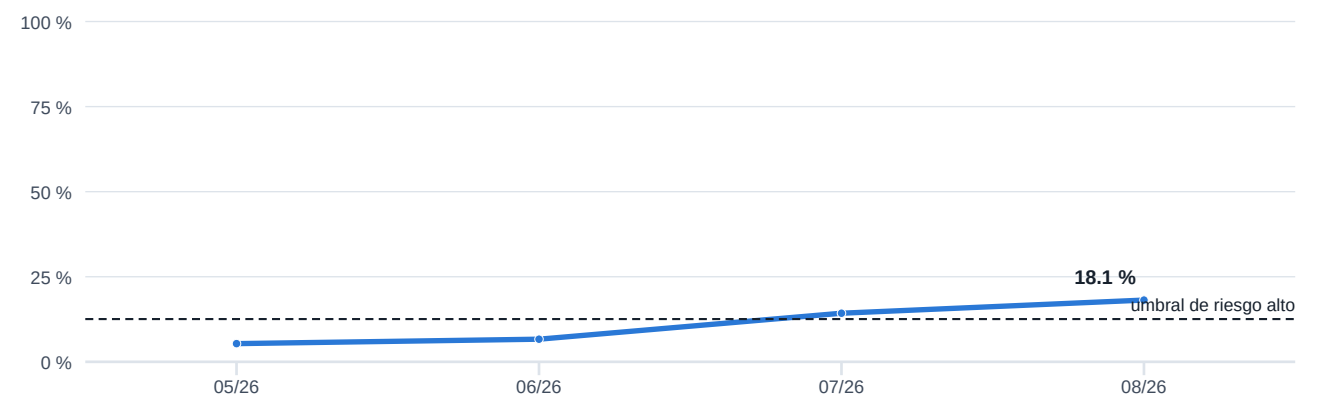

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (4 cortes, del 31/05/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.61 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.556
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.213
Departamento: Lambayeque	Características de la obra		+0.205
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.200
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.73 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.126
Entidad contratante: otra entidad pública	Características de la obra		+0.097
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.095
Hubo registros en el cuaderno 19 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.079

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	18.1 %	17.4 %	-0.8 pp
Absolver todas las consultas pendientes	18.1 %	18.3 %	+0.1 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 136 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/08/2026

del supervisor . de las actividades realizadas el día sabado 29 del presente, se inspecciono el dme ubicado en el distrito de san jose, observando que su representada viene incumpliendo en trasladar el material sobrante producto de las excavaciones al deposito autorizado, tengase presente que no se valorizara la partida de eliminacion de material en el presente mes igualmente e...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 137 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/08/2026

del supervisor . para dejar constancia que dentro de las actividades que realiza el contratista, en cuanto a los trabajos correspondientes a rellenos, se viene incumpliendo de acuerdo a las especificaciones tecnicas, conforme se puede apreciar en las tomas fotograficas que se adjuntan. respecto a los pases peatonales, tampoco se vienen cumpliendo, colocandose en ve...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 122 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 26/08/2026

...responsabilidad cumplir con los dispositivos de seguridad peatonal y las senalizaciones conforme a lo establecido en el contrato y las especificaciones tecnicas del proyecto, para preaviso de aplicar penalidad, solicitud que debe cumplirse en un plazo de 24 horas.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 103 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 12/08/2026

del supervisor . esta supervision continua ejerciendo sus funciones en la ejecucion de la presente obra, estando a la espera de que la entidad contratante epsel sa se pronuncie respecto a la resolucion del contrato de consultoria de obra supervision del saldo de obra paquete 1, renovacion de colectores san judas tadeo y el chofer, resolucion presentada el día 31 de julio por los hechos ocurridos los días 20 y 2...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 85 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 01/08/2026

DEL SUPERVISOR - PARTE I: Para dejar constancia que hasta el día de ayer 31 del mes de julio, no se alcanzado a esta supervisión, el levantamiento de observaciones de los protocolos observados por el especialista en calidad. Para atender y dar respuesta al asiento n°084 del residente de obra, registrado el día 31 de julio 2026, a horas 21:52, según sus coordenadas fuera del área que involucra la ejecución de la obra, ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 47 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 13/07/2026

DEL SUPERVISOR: Se verifica los trabajos de renovación de colector y subcolector en el sector San Judas Tadeo, y de colector en El Chofer, además de las redes y conexiones domiciliarias en la calle Lima y calle Ucayali en el sector El Chofer, a ritmo lento. Habiendo propuesto el contratista el área para el Depósito de Material Excedente (DME), esta supervisión, en compañía del residente de obra, procedió a la verifica...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 44 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 10/07/2026

...cama de apoyo de ripio corriente de e=30cm encofrado y vaciado de manera monolitica concreto fc=280kg/cm2. en el tramo bze26 bz135, dejo constancia que aun los trabajos se realizan de manera lenta por falta de personal tratandose de una renovacion de red y conexiones domiciliarias de alcantarillado, la contratista debe ejecutar dichos trabajos teniendo en cuenta que la necesidad del usuario debe sera atendido de in...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 41 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 09/07/2026

... es necesario incrementar el numero de personal, ya que se constato que solo habia 03 trabajadores. igualmente, en la calle lima, se constato retrasos en la renovacion de conexiones domiciliarias por falta de personal, los reclamos que surjan de los beneficiarios durante la ejecucion de los trabajos sera responsabilidad del contratista. se supervisaron la continuacion de los trabajos de renovacion de redes colecto...

Fuente: cod-asientos202607.csv

Asiento N.º 41 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 09/07/2026

DEL SUPERVISOR PARTE I: En atención al Asiento N° 40 del residente, las excavaciones de zanja para el tendido de los colectores tienen que cumplir con el ancho de fondo que especifica el proyecto (planos) debiendo entibar mediante el cajón metálico de 6mx4m para instalar una tubería, de tal forma que al continuar con la excavación no se genere un sobre ancho de zanja. Con un buen proceso constructivo se puede evitar ...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
