


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Ejecucion del plan de contingencia y obra principal del proyecto mejoramiento y ampliacion de los servicios de salud del hospital de apoyo celendin distrito de celendin provincia de celendin departamento de cajamarca con CUI n 2534855

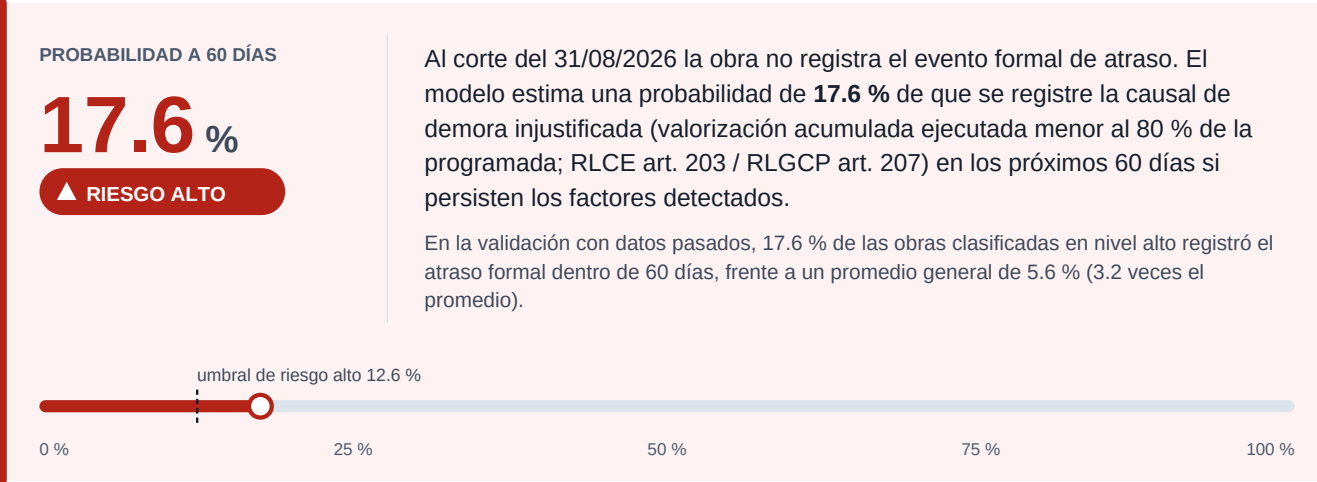


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	1,455 desde 03/02/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	EJECUCION DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y OBRA PRINCIPAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO CELENDIN DISTRITO DE CELENDIN PROVINCIA DE CELENDIN DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI N 2534855
Entidad contratante	UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
Contratista	CONSORCIO EDIFICADOR CAJAMARCA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	CELENDIN / CELENDIN / CAJAMARCA
Código Único de Inversión (CUI)	2534855
Inversión asociada	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO CELENDIN DEL DISTRITO DE CELENDIN - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Función	SALUD
Identificador del contrato (SEACE)	2304030
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 136,556,980.90
Cuaderno de obra digital	1455 asientos entre 03/02/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

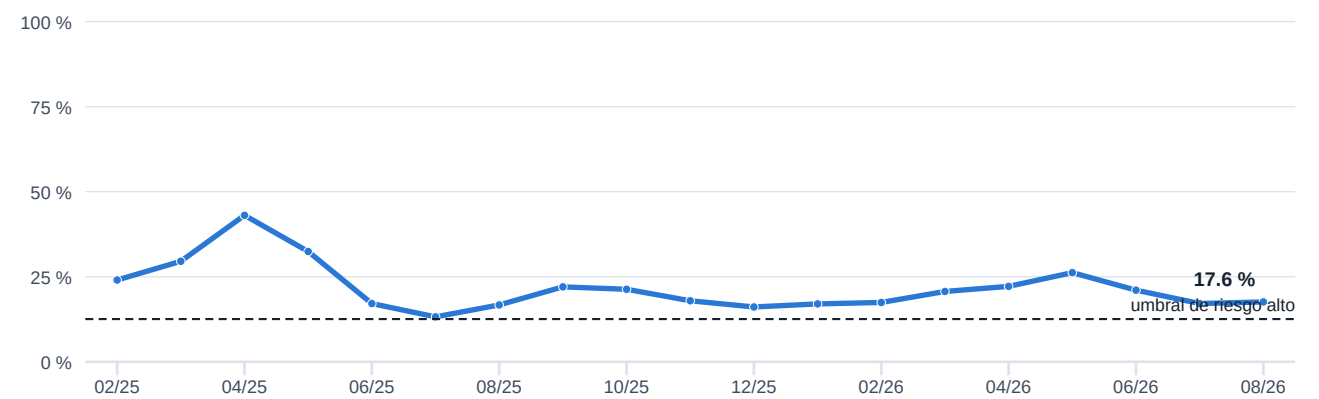

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (19 cortes, del 28/02/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.69 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.693
El 38 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.236
El 9 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.193
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.116
Hubo registros en el cuaderno 21 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.096
3 asientos de aplicación de penalidades desde el inicio del cuaderno	Actividad del cuaderno de obra		+0.093
Gasto acumulado de la inversión (devengado): S/ 82,164,200	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.086
Monto aprobado de la inversión: S/ 136,556,981	Características de la obra		-0.072

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	17.6 %	17.4 %	-0.2 pp
Absolver todas las consultas pendientes	17.6 %	18.3 %	+0.7 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 1455 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/08/2026

paralización de obra por atrasos en pagos de remuneraciones de personal de obra . mediante la presente anotacion se deja constancia que el día de hoy a primera hora se ha tomado conocimiento de paralización del personal obrero en ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1451 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 26/08/2026

... a las fichas tecnicas presentadas por el contratista, precisando con exactitud cuales son las mismas y solicitando que se proceda al levantamiento de observaciones a la brevedad, para evitar mayores atrasos en la ejecucion de la obra.ing. mario bustillos tejadajefe de supervision

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1450 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 26/08/2026

... a las fichas tecnicas presentadas por el contratista, precisando con exactitud cuales son las mismas y solicitando que se proceda al levantamiento de observaciones a la brevedad, para evitar mayores atrasos en la ejecucion de la obra.ing. mario bustillos tejadajefe de supervision

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1448 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 22/08/2026

...por lo expuesto anteriormente, en el presente asiento se anota el reiterativo de la imposibilidad de ejecucion de la partida critica 13.04.03.01.01 uta hp1-01, como causal de ampliacion de plazo, por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, tal como estipula el articulo 193.9 y 197 del reglamento de la ley de contrataciones del estado. asimismo, dentro del contrato de obra n...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1415 · Consultas · SOEC_SPV · 13/08/2026

ABSOLUCION DE CONSULTA 78 - PREINSTALACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE ESTERILIZACION: Mediante la presente anotación, se deja constancia que el día de ayer se ha remitido al contratista la carta 431 2026ATINSAC JS en la que se remite la absolución de consulta 78, referente a la preinstalación de los equipos biomédicos del ambiente de inmunohematología.En el documento se adjunta los informes específicos de nuestros espe...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1400 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 11/08/2026

...nciones advirtiend que los pagos pendientes corresponden no a una cantidad de 90, 100, 200 obreros sino a cantidades significativamente menores.asimismo se recuerda a contratista que los atrasos por incumplimiento de pagos a personal de obra son considerados como atrasos injustificados por lo que solicitamos evitar otra suspension de actividades por estas causas.ing. mario cesar bustillos tejadajefe de ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1406 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 11/08/2026

...ite y demas definiciones contractuales no puede constituir, por si solo, un instrumento valido para acreditar la recuperacion de atrasos ni para establecer responsabilidad contractual por su eventual incumplimiento.ello debido a que una programacion unicamente puede ser utilizada como instrumento de control cuando las condiciones necesarias para la ejecucion de las actividades que la integran se encuentr...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 1401 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 11/08/2026

RESPUESTA AL ASIENTO N° 1383 RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES – PARTE 1: En atención al Asiento N° 1383, de fecha 04/08/2026, mediante el cual la Supervisión señala que el avance acumulado de la obra presenta un atraso y solicita al Contratista la presentación, dentro de las próximas 72 horas, de un Plan de Trabajo que comprenda las actividades que se pretenden realizar durante el mes de ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
