


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Procedimiento no competitivo

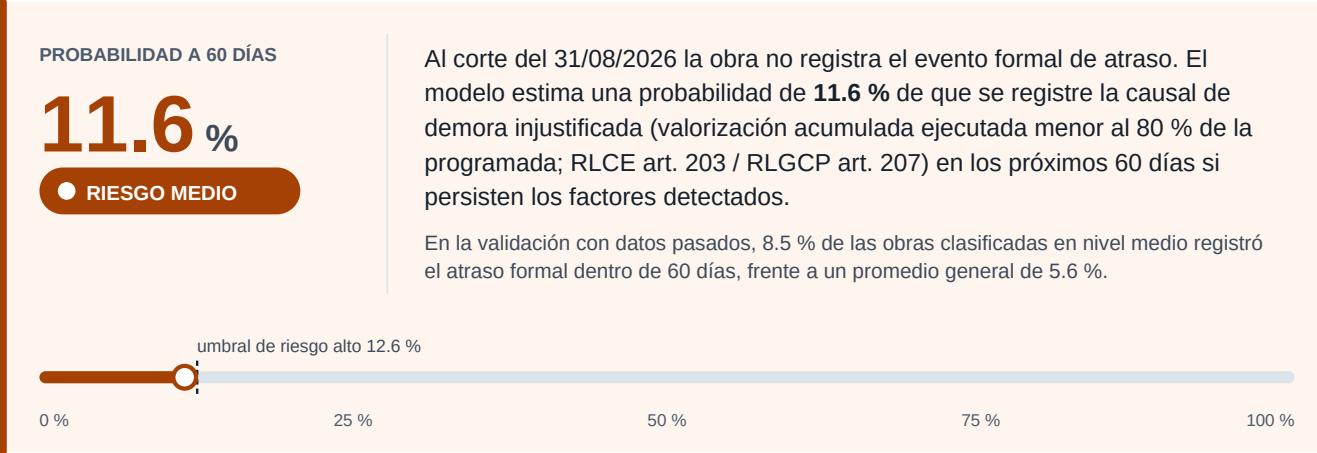


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	59 desde 20/07/2026	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	PROCEDIMIENTO NO COMPETITIVO
Entidad contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA
Contratista	CONSORCIO VIAL AYRARANCA
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	PAUSA / PAUCAR DEL SARA SARA / AYACUCHO
Código Único de Inversión (CUI)	no enlazado
Inversión asociada	-
Función	-
Identificador del contrato (SEACE)	2372282
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	-
Cuaderno de obra digital	59 asientos entre 20/07/2026 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

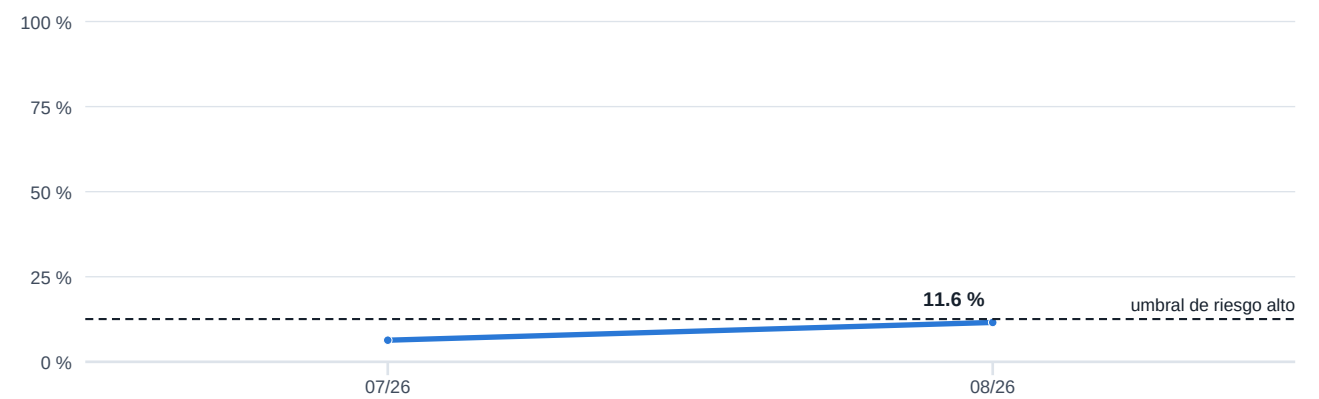

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (2 cortes, del 31/07/2026 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
El 58 % de los asientos de los últimos 90 días fue registrado por la supervisión o inspección	Actividad del cuaderno de obra		+0.230
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.46 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.118
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.114
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona la regla del 80 % o un calendario acelerado	Contenido de los asientos		+0.101
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.54 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.085
Hubo registros en el cuaderno 22 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.080
Ningún asiento de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		-0.080
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.062

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	11.6 %	11.4 %	-0.1 pp
Absolver todas las consultas pendientes	11.6 %	11.6 %	+0.0 pp
Sin suspensiones del plazo en los últimos 90 días	11.6 %	11.6 %	+0.0 pp

05

Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 45 · Ampliaciones de plazo · SOEC_RESI · 19/08/2026 <i>...ente todas las partidas estan consideradas dentro del deductivo vinculante de obra no 01, bajo estas consideraciones el avance porcentual del presente mes obra bajara considerablemente por debajo del 80 % tal como indica el rlce.</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 38 · Suspensión del plazo de ejecución · SOEC_RESI · 13/08/2026 <i>...echa que pueda considerarse en ejecucion proxima, por lo que en obra se viene realizando trabajos menores que no implican avance alguno a la fecha lo que implica que finalmente no se logre superar al 80 % tal como indica el rlce.</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 34 · Suspensión del plazo de ejecución · SOEC_RESI · 10/08/2026 <i>...ntes, 13.01.02 disp por empresa operadora de residuos solidos.esta situacion por razones obvias impide el normal avance de obra y genera riesgo de caer en retraso injustificado de obra por debajo del 80 % tal como indica el rlce.</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 21 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 01/08/2026 <i>TRABAJOS SUPERVISADOS: En la fecha, esta Supervisión realizó el seguimiento de las condiciones presentes en obra. Se reitera al contratista la presentación de los resultados de la contraprueba de mecánica de suelos, conjuntamente con el informe y sustento técnico correspondientes, para su evaluación y trámite respectivo.</i> Fuente: cod-asientos202608.csv
Asiento N.º 20 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 31/07/2026 <i>TRABAJOS SUPERVISADOS: Esta Supervisión efectuó el seguimiento y verificación en campo de las actividades informadas por la Residencia, correspondientes a obras provisionales, trabajos preliminares, eliminación de material excedente y señalización temporal, recomendándose mantener las condiciones de seguridad, orden y control durante su ejecución.Asimismo, se recuerda al contratista que se encuentra pendiente la pres...</i> Fuente: cod-asientos202607.csv
Asiento N.º 4 · Calendario de avance de obra valorizado · SOEC_RESI · 21/07/2026 <i>DOCUMENTOS CONTRACTUALES ADAPTADOS A FECHA DE INICIO: ACCIONES EN OBRA:Mediante Carta No 008-2026/CVA, de fecha 20/07/26 se hace entrega de la documentación contractual adaptada a la fecha de inicio en cumplimiento de los Términos de Referencia y Bases de la licitación, para su revisión y aprobación, a saber: - Cronograma de ejecución de obra- Cronograma de Avance de Obra Valorizado (CAOV)</i> Fuente: cod-asientos202607.csv

06

Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
