


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

Mejoramiento del servicio de drenaje pluvial en el cercado urbano de la ciudad de piura comprendido entre las avenidas: Loreto, Málaga, bolognesi y la ribera del río piura, para la mitigación de efectos negativos de lluvias, distrito de piura de la provincia de piura del departamento de piura, CUI n.º 2606861

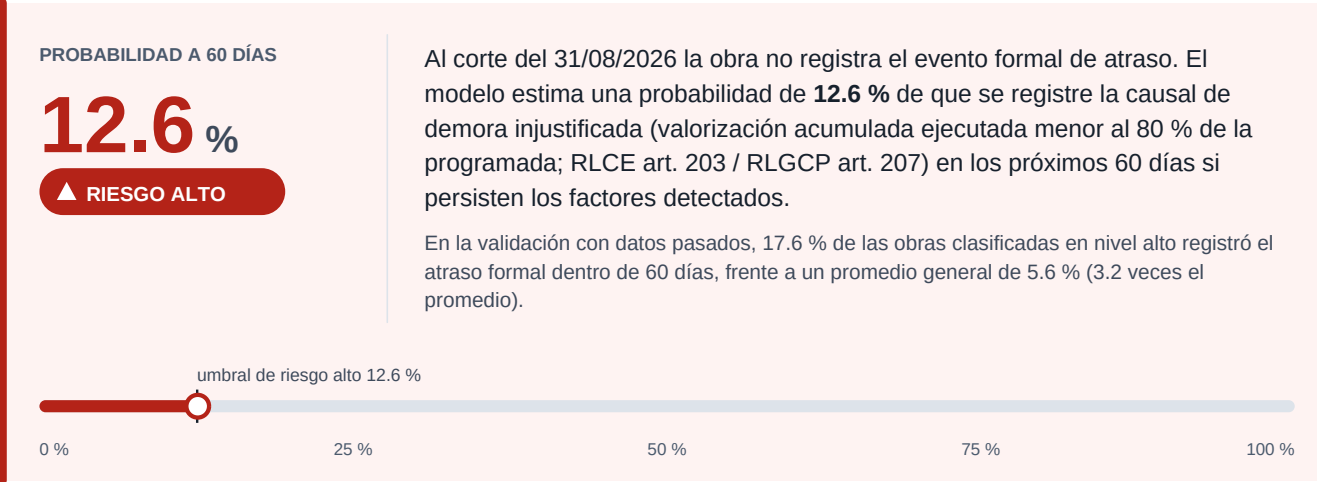


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
S/ 68,226,284.77	210 días	642 desde 02/10/2025	30/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CERCADO URBANO DE LA CIUDAD DE PIURA COMPRENDIDO ENTRE LAS AVENIDAS: LORETO, MÁLAGA, BOLOGNESI Y LA RIBERA DEL RÍO PIURA, PARA LA MITIGACIÓN DE EFECTOS NEGATIVOS DE LLUVIAS, DISTRITO DE PIURA DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI N.º 2606861
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL
Contratista	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	PIURA / PIURA / PIURA
Código Único de Inversión (CUI)	2606861
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CERCADO URBANO DE LA CIUDAD DE PIURA COMPRENDIDO ENTRE LAS AVENIDAS: LORETO, MALAGA, BOLOGNESI Y LA RIBERA DEL RIO PIURA, PARA LA MITIGACION DE EFECTOS NEGATIVOS DE LLUVIAS, DISTRITO DE PIURA DE LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
Función	SANEAMIENTO
Identificador del contrato (SEACE)	2346891
Monto del contrato	S/ 68,226,284.77
Monto aprobado de la inversión	S/ 31,268,778.17
Cuaderno de obra digital	642 asientos entre 02/10/2025 y 30/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

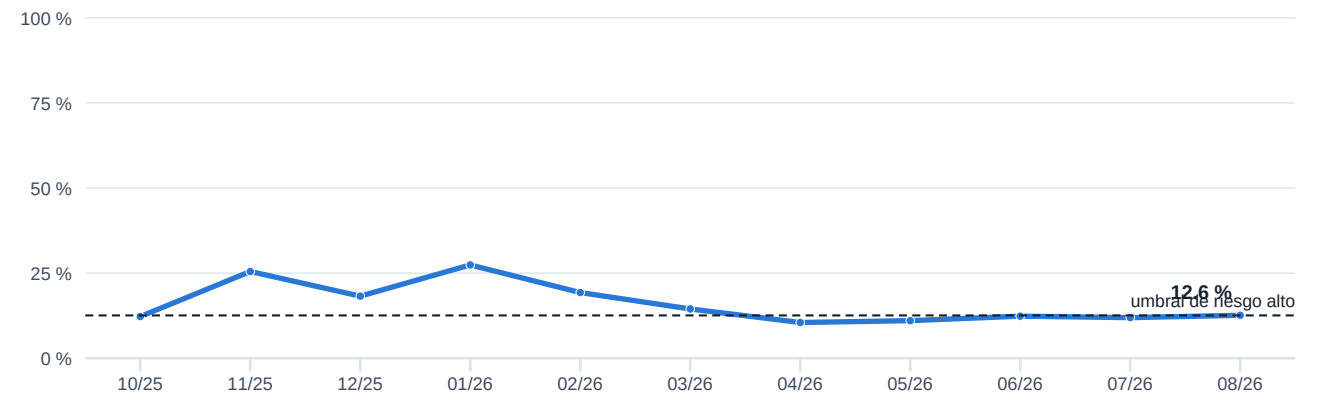

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (11 cortes, del 31/10/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.65 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.630
El 2 % de los asientos de los últimos 60 días menciona falta o cambio de personal	Contenido de los asientos		+0.220
El 11 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.209
El 5 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.130
Hubo registros en el cuaderno 24 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.120
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 3,048,492	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.106
El último asiento se registró hace 1 día	Actividad del cuaderno de obra		+0.102
Índice de alerta por el contenido de los asientos recientes: 0.56 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.101

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	12.6 %	12.6 %	-0.0 pp
Sin nuevas ampliaciones de plazo en los últimos 90 días	12.6 %	12.6 %	+0.0 pp
Registro activo del cuaderno (asiento reciente)	12.6 %	12.6 %	+0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 623 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 20/08/2026

...visor las avenidas /cevc con asunto devolucion de carta n 457-2026-cd jubers/piura-item 1.?el dia 19 de agosto-2026 se recibio la carta n 402-2026 / consorcio supervisor las avenidas /cevc con asunto incumplimiento de medidas de manejo ambietal-calle don bosco.

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 624 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 20/08/2026

.../cevc., al gore piura: pronunciamiento tecnico, sobre material acopiado en la av. don bosco y delimitacion del patio de maquinas.carta 402-2026/consorcio supervisor las avenidas/cevc, al contratista: incumplimiento de medidas de manejo ambiental. - calle don bosco.carta 404-2026/consorcio supervisor las avenidas/cevc, al contratista: devolucion carta 449 -2026- cd jubers/piura. - item 1.carta 457-2026-cd...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 618 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 18/08/2026

...iamente concedidas. el nuevo plazo de ejecucion de obra vence el 21 setiembre 2026.carta 392-2026/consorcio supervisor las avenidas/cevc., al gore piura: segundo informe de supuesto de aplicacion de penalidad, por reiterad omision de registro de riesgos en el cuaderno de obra digital y detalles de tramos de incumplimiento.carta 394-2026/consorcio supervisor las avenidas/cevc., al gore piura: alcanzo infor...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 597 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 06/08/2026

...l gore piura: pronunciamiento sobre informe tecnico de ampliacion de plazo 11- por restriccion en frente de trabajo en la partida 06.02.02 construccion de buzón de telecomunicaciones, derivada por la demora en la absolucion de la consulta 13.-resolucion direccion general de construccion 107-2026/gobierno regional piura -gri-dgc: aprobar los planos modificados correspondientes:1.00 redes sin interferenci...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 593 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 04/08/2026

...contratista a supervision: alcanzo informe solicitud de ampliacion de plazo 11, restriccion de frente de trabajo en la partida 06.02.02, construccion de buzones de telecomunicaciones derivadas por la demora en la absolucion de la consulta 13 (29 julio 2026: 5pm) -resolucion direccion general regional de construccion 104-2026 /gobierno regional de piura -cri-dgc: aprueba planos nuevos:1.00.-planta genera...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 591 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 03/08/2026

...upervisor las avenidas/cevc: de supervision al contratista: alcanzo copia informativa de pronunciamiento sobre ampliacion de plazo 10.- por la restriccion de los frentes de trabajo, originados por la demora en la aprobacion del plan de desvio vehicular iii y iv.- carta 427-2026 cd jubers/ piura-item 1 de contratista a supervision: remito evaluacion tecnica del poste mt, ubicado en la interseccion de las...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 591 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 03/08/2026

... tecnica del poste mt, ubicado en la interseccion de las calles ica con tacna en atencion al asiento del cuaderno de obra. - carta 435-2026 cd jubers/ piura-item 1 de contratista a supervision: sobre cambio de personal clave en materia de seguridad y salud.- carta 1512-2026 /grp-440310, del gore piura a la supervision: devolucion de planos de interferencias electrica en el jiron apurimac c 2, c7, jr. moquegua c4, c...

Fuente: cod-asientos202608.csv

- Asiento N.º 589 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 01/08/2026**

... tecnica del poste mt, ubicado en la interseccion de las calles ica con tacna en atencion al asiento del cuaderno de obra. - carta 435-2026 cd jubers/ piura-item 1 de contratista a supervision: sobre cambio de personal clave en materia de seguridad y salud. - carta 1512-2026 /grp-440310, del gore piura a la supervision: devolucion de planos de interferencias electrica en el jiron apurimac c 2, c7, jr. moquegua c4, c...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 588 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 01/08/2026**

...ccion calle arequipa con jr. callao.- carta 367-2026consorcio supervisor las avenidas/cevc: de supervision al contratista: llamado de atencion severo, por faltas graves en seguridad, orden y limpieza incumplimiento de funciones del especialista de seguridad. - carta 428-2026 cd jubers/ piura-item 1 de contratista a supervision: remito plan de contingencia por lluvias y atencion de emergencias.- carta 429...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 589 · Otras ocurrencias · SOEC_SPV · 01/08/2026**

...io supervisor las avenidas/cevc: de supervision al gore piura, alcanzo pronunciamiento sobre informe de solicitud de ampliacion de plazo 10, por la restriccion de frentes de trabajo originados por la demora en la aprobacion del plan de desvio vehicular iii y iv.- carta 427-2026 cd jubers/ piura-item 1 de contratista a supervision: remito evaluacion tecnica del poste mt, ubicado en la interseccion de las...

Fuente: cod-asientos202608.csv
- Asiento N.º 573 · Otras ocurrencias · SOEC_RESI · 21/07/2026**

OCURRENCIAS Y ACTIVIDADES EN OBRA: ? Se le comunica al supervisor de obra sobre el buzón de registro N° 05 ubicado en la calle Arequipa con la intersección con la calle Huánuco de acuerdo al plano CAJAS DE REGISTRO 01 AL 05 ELEVACIÓN PLANTA Y DETALLES (E-15), esta estructura tiene una dimensión de 1.90 x 1.90 m de sección libre interior , pero sin embargo la cámara recibe la llegada de las tuberías de la red principa...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.º 30225, D.S. N.º 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.º 32069, D.S. N.º 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
