


INFORME TÉCNICO DE ALERTA TEMPRANA

Riesgo de atraso formal en la ejecución de la obra

contratación para la ejecución de la obra mejoramiento y ampliacion del servicio de habitabilidad institucional en la municipalidad distrital de vicco de la provincia de pasco, departamento de pasco, con CUI 2634461

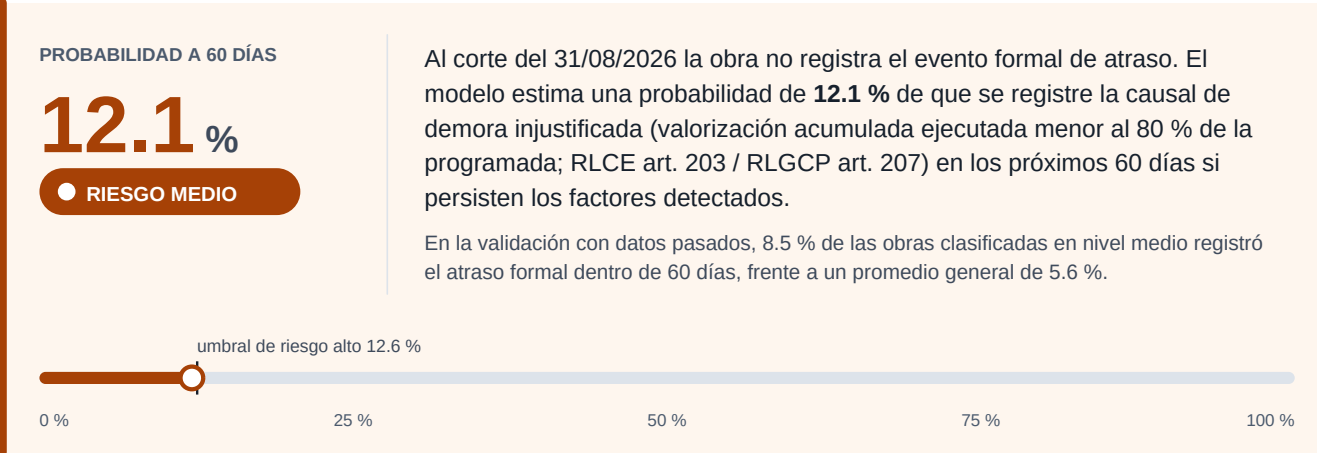


MONTO DEL CONTRATO	PLAZO ORIGINAL	ASIENTOS DEL CUADERNO	ÚLTIMO ASIENTO
No publicado	No publicado	381 desde 11/09/2025	31/08/2026

01 Identificación de la obra y del contrato

Denominación oficial	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO DE LA PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO, con CUI 2634461
Entidad contratante	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL
Contratista	CONSORCIO SIDERAL
Ubicación (distrito / provincia / departamento)	VICCO / PASCO / PASCO
Código Único de Inversión (CUI)	2634461
Inversión asociada	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO DISTRITO DE VICCO DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
Función	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Identificador del contrato (SEACE)	2341602
Monto del contrato	-
Monto aprobado de la inversión	S/ 4,936,938.81
Cuaderno de obra digital	381 asientos entre 11/09/2025 y 31/08/2026

02 Evolución del riesgo estimado a 60 días

Probabilidad estimada de atraso formal a 60 días

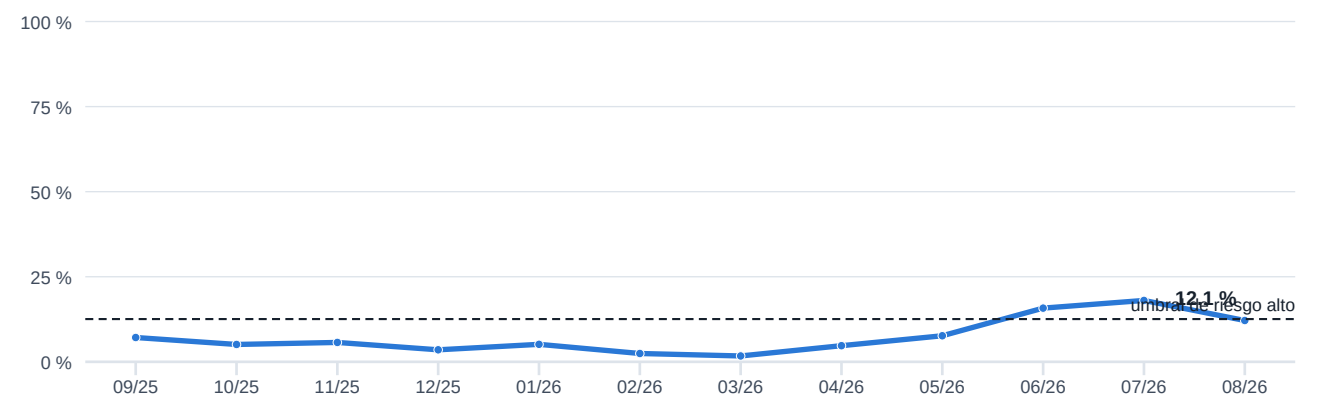

Estimaciones mensuales calculadas solo con la información disponible en cada fecha de corte (12 cortes, del 30/09/2025 al 31/08/2026), con reentrenamiento trimestral del modelo.

03 Factores que explican la estimación

Contribución de cada dato a la probabilidad (valores TreeSHAP en log-odds). Las barras hacia la derecha elevan el riesgo y las barras hacia la izquierda lo reducen, respecto del promedio de las obras.

Dato de la obra	Grupo	Reduce Eleva	Efecto
Índice de alerta por las palabras usadas en los asientos recientes: 0.55 (escala de 0 a 1)	Contenido de los asientos		+0.538
El 6 % de los asientos de los últimos 60 días menciona penalidades, incumplimientos o cartas notariales	Contenido de los asientos		+0.213
El 7 % de los asientos de los últimos 60 días menciona atraso, retraso o demora	Contenido de los asientos		+0.210
Hubo registros en el cuaderno 26 días del último mes	Actividad del cuaderno de obra		+0.125
Departamento: Pasco	Características de la obra		-0.120
Hubo un asiento el mismo día del corte	Actividad del cuaderno de obra		+0.113
Gasto devengado en los últimos 3 meses: S/ 2,286,573	Ejecución del gasto (SIAF)		-0.096
65 asientos registrados en los últimos 30 días	Actividad del cuaderno de obra		+0.057

04 Qué cambiaría la estimación (sensibilidad del modelo)

Recálculo de la probabilidad modificando una señal a la vez. Indica cuánto depende la estimación de cada señal; no es una estimación causal del efecto de una intervención real.

Escenario	Actual	Escenario	Cambio
Absolver todas las consultas pendientes	12.1 %	12.1 %	-0.0 pp

05 Evidencia documental

Asientos del cuaderno de obra digital y otros registros oficiales asociados a los factores que elevan el riesgo, del más reciente al más antiguo (hasta 12).

Asiento N.º 381 · Valorizaciones y metrados · SOEC_SPV · 31/08/2026

...s (3) días hábiles contados a partir de la fecha del presente documento. la entrega debera efectuarse en la oficina de la supervision, ubicada en el area colindante al predio de la obra. la omision o retraso en la presentacion dentro del plazo establecido sera de exclusiva responsabilidad del contratista, procediendo la supervision conforme a lo dispuesto por la normativa vigente. una vez recibida la doc...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 377 · Valorizaciones y metrados · SOEC_SPV · 31/08/2026

...) dias calendario de espera. se le recuerda de manera especifica que cualquier paralización, abandono o reduccion arbitraria del ritmo de obra previa al vencimiento del plazo normativo configurara un incumplimiento contractual, sujeto a la aplicacion de las penalidades estipuladas. 4. esta supervision procedera de forma inmediata a emitir el informe especial de alerta contractual dirigido a la gerencia re...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 376 · Valorizaciones y metrados · SOEC_SPV · 31/08/2026

...l residente de obra, ing. dennis edward tamayo janampa, mediante el cual formula un requerimiento formal de pago integral por concepto de valorizaciones mensuales contractuales y de adicionales, bajo apercibimiento de acogerse a la suspension del plazo de ejecucion contractual, esta supervision, en estricto cumplimiento de sus funciones de velar por la legalidad, el equilibrio economico-contractual y la ...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 374 · Valorizaciones y metrados · SOEC_RESI · 30/08/2026

requerimiento formal de pago integral por valorizaciones contractuales y de adicional impagas bajo apercibimiento de suspension de plazo contractual y deslinde de responsabilidad funcional. parte ii . vienen:...asimismo, se deja expresa constancia de que la responsabilidad administrativa, civil y penal...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 373 · Valorizaciones y metrados · SOEC_RESI · 30/08/2026

requerimiento formal de pago integral por valorizaciones contractuales y de adicional impagas bajo apercibimiento de suspension de plazo contractual y deslinde de responsabilidad funcional. parte i . en calidad de residente de obra, se deja constancia expedicionaria y detallada de que la entidad contra...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 349 · Valorizaciones y metrados · SOEC_SPV · 16/08/2026

CONSTATACIÓN FÍSICA DE LA OBRA: En respuesta al Asiento N° 347 registrado por el contratista, esta Supervisión VERIFICA y DEJACONSTANCIA de la conformidad técnica respecto a la medición física y la conciliación de los metrados efectivamente ejecutados en campo, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 15 de agosto de 2026, asociados a los siguientes documentos: 1. Se verifica la ejecución de las partida...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 349 · Valorizaciones y metrados · SOEC_SPV · 16/08/2026

...) dias calendarios contados a partir de la fecha del presente documento. la entrega debera efectuarse en la oficina de la supervision, ubicada en el area colindante al predio de la obra. la omision o retraso en la presentacion dentro del plazo establecido sera de exclusiva responsabilidad del contratista, procediendo la supervision conforme a lo dispuesto por la normativa vigente. una vez recibida la doc...

Fuente: cod-asientos202608.csv

Asiento N.º 314 · Valorizaciones y metrados · SOEC_SPV · 31/07/2026

CONSTATACIÓN FÍSICA DE LA OBRA: En respuesta al Asiento N° 313 registrado por el contratista, esta Supervisión VERIFICA y DEJA CONSTANCIA de la conformidad técnica respecto a la medición física y la conciliación de los metrados efectivamente ejecutados en campo, correspondientes al periodo comprendido entre el 16 y el 31 de julio de 2026, asociados a los siguientes documentos: 1. Se verifica la ejecución de las partid...

Fuente: cod-asientos202607.csv

06 Marco normativo, validez del modelo y lectura del informe

Evento que se anticipa: primer asiento del cuaderno de obra digital de tipo «Valorización acumulada ejecutada menor al 80 % del monto acumulado programado» o «Calendario acelerado de obra» (Reglamento de la Ley N.° 30225, D.S. N.° 344-2018-EF, art. 203; Reglamento de la Ley N.° 32069, D.S. N.° 009-2025-EF, art. 207).

Indicador (prueba temporal ciega)	Nacional	Arequipa
ROC-AUC	0.774	0.719
PR-AUC	0.158	0.216
Prevalencia del evento	0.050	0.091

Modelo atraso-H60-B_full-2026-08-31, entrenado con información hasta el 30/06/2026. Una PR-AUC mayor que la prevalencia indica que el modelo ordena las obras mejor que el azar.

CÓMO USAR ESTE INFORME

La probabilidad es una estimación para priorizar la supervisión, no una certeza ni una determinación de responsabilidades. Contraste siempre los factores y la evidencia con el expediente de la obra y con la información del supervisor o inspector antes de adoptar decisiones.
